

ALLEGATO "A"

Comune di MILANO
Provincia di MI

DIAGRAMMA DI GANTT

cronoprogramma dei lavori
(Allegato XV e art. 100 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.)
(D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)

OGGETTO: ADEGUAMENTO 3° E 7° PIANO INPS FABB. VIA MAURIZIO GONZAGA

COMMITTENTE: INPS Lombardia

CANTIERE: VIA MAURIZIO GONZAGA 4 6 , MILANO (MI)

MILANO, 13/09/2011

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA

(stesso Ari Francesco)

per presa visione

IL COMMITTENTE

(Direttore regionale Quattrone Giuliano)

stesso Ari Francesco
\$EMPTY_CSP_05\$
\$EMPTY_CSP_06\$ \$EMPTY_CSP_07\$ (\$EMPTY_CSP_08\$)
Tel.: \$EMPTY_CSP_09\$ - Fax: \$EMPTY_CSP_10\$
E-Mail: \$EMPTY_CSP_11\$

CerTus by Guido Cianciulli - Copyright ACCA software S.p.A.


TABELLA ANALITICA GANTT

Tabella Analitica Gantt


FASI DI LAVORO	Z	I	gg L	gg C	data Iniziale	data Finale
Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi	1	E	2	2	01/03/2012	02/03/2012
	1	E	5	5	04/06/2012	08/06/2012
Allestimento di servizi sanitari del cantiere	1	E	1	1	04/06/2012	04/06/2012
Montaggio e smontaggio del ponteggio metallico fisso	1	E	5	5	05/03/2012	09/03/2012
	1	E	5	5	28/05/2012	01/06/2012
Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere	1	E	2	2	01/03/2012	02/03/2012
	1	E	2	2	04/06/2012	05/06/2012
Realizzazione di impianto elettrico del cantiere	1	E	2	2	01/03/2012	02/03/2012
	1	E	2	2	04/06/2012	05/06/2012
Smobilizzo del cantiere	1	E	5	5	04/06/2012	08/06/2012
Demolizione di pareti divisorie	1	E	5	5	05/03/2012	09/03/2012
	1	E	5	5	11/06/2012	15/06/2012
Rimozione di controsoffittature, intonaci e rivestimenti interni	1	E	5	5	12/03/2012	16/03/2012
	1	E	5	5	11/06/2012	15/06/2012
Rimozione di impianti	1	E	5	5	05/03/2012	09/03/2012
	1	E	10	12	11/06/2012	22/06/2012
Rimozione di massetto	1	E	10	12	12/03/2012	23/03/2012
	1	E	10	12	18/06/2012	29/06/2012
	1	E	10	12	12/03/2012	23/03/2012
Rimozione di pavimenti interni	1	E	10	12	12/03/2012	23/03/2012
	1	E	5	5	25/06/2012	29/06/2012
Posa macchina di condizionamento	1	E	5	5	16/04/2012	20/04/2012
Realizzazione delle canalizzazioni per aria condizionata	1	E	10	12	26/03/2012	06/04/2012
	1	E	5	5	25/06/2012	29/06/2012
Realizzazione di impianto elettrico interno	1	E	19	26	26/03/2012	20/04/2012
	1	E	5	5	02/07/2012	06/07/2012
Realizzazione di impianto idrico-sanitario e del gas	1	E	10	12	26/03/2012	06/04/2012
	1	E	5	5	02/07/2012	06/07/2012
Formazione di massetto per pavimenti interni	1	E	13	17	02/05/2012	18/05/2012
	1	E	5	5	09/07/2012	13/07/2012
Formazione intonaci interni (tradizionali)	1	E	9	11	10/04/2012	20/04/2012
	1	E	10	12	02/07/2012	13/07/2012
Posa di pavimenti per interni	1	E	15	19	21/05/2012	08/06/2012
	1	E	10	12	16/07/2012	27/07/2012
Realizzazione di contropareti e controsoffitti	1	E	23	31	02/05/2012	01/06/2012
	1	E	10	12	23/07/2012	03/08/2012
Realizzazione di divisori interni	1	E	19	29	02/04/2012	30/04/2012
	1	E	10	12	16/07/2012	27/07/2012
Tinteggiatura di superfici interne	1	E	8	10	02/05/2012	11/05/2012
	1	E	10	12	14/05/2012	25/05/2012
	1	E	5	5	04/06/2012	08/06/2012


	1	E	10	12	30/07/2012	10/08/2012
<p>LEGENDA:</p> <p>Z = ZONA</p> <p>Elenco delle Zone attribuite alle Fasi del Programma Lavori:</p> <p>1) = ZONA UNICA</p> <p>I = IMPRESA</p> <p>Elenco delle Imprese presenti nel Programma Lavori:</p> <p>E <Nessuna impresa definita></p> <p>gg C = DURATA, espressa in giorni naturali e consecutivi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro</p> <p>gg L = DURATA, espressa in giorni lavorativi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro</p>						

Nome attività	Durata	Settimana 1					Settimana 2				
		-2	-1	1	2	3	4	5	6	7	
Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per g	7 g		Z1								
Allestimento di servizi sanitari del cantiere	1 g										
Montaggio e smontaggio del ponteggio metallico fisso	10 g						Z1				
Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere	4 g		Z1								
Realizzazione di impianto elettrico del cantiere	4 g		Z1								
Smobilizzo del cantiere	5 g										
Demolizione di pareti divisorie	10 g						Z1				
Rimozione di controsoffittature, intonaci e rivestimenti interni	10 g										
Rimozione di impianti	15 g						Z1				
Rimozione di massetto	20 g										
Rimozione di pavimenti interni	15 g										
Posa macchina di condizionamento	5 g										
Realizzazione delle canalizzazioni per aria condizionata	15 g										
Realizzazione di impianto elettrico interno	24 g										
Realizzazione di impianto idrico-sanitario e del gas	15 g										
Formazione di massetto per pavimenti interni	18 g										
Formazione intonaci interni (tradizionali)	19 g										
Posa di pavimenti per interni	25 g										
Realizzazione di contropareti e controsoffitti	33 g										
Realizzazione di divisori interni	29 g										
Tinteggiatura di superfici interne	33 g										
LEGENDA Zona:											
Z1 = ZONA UNICA											

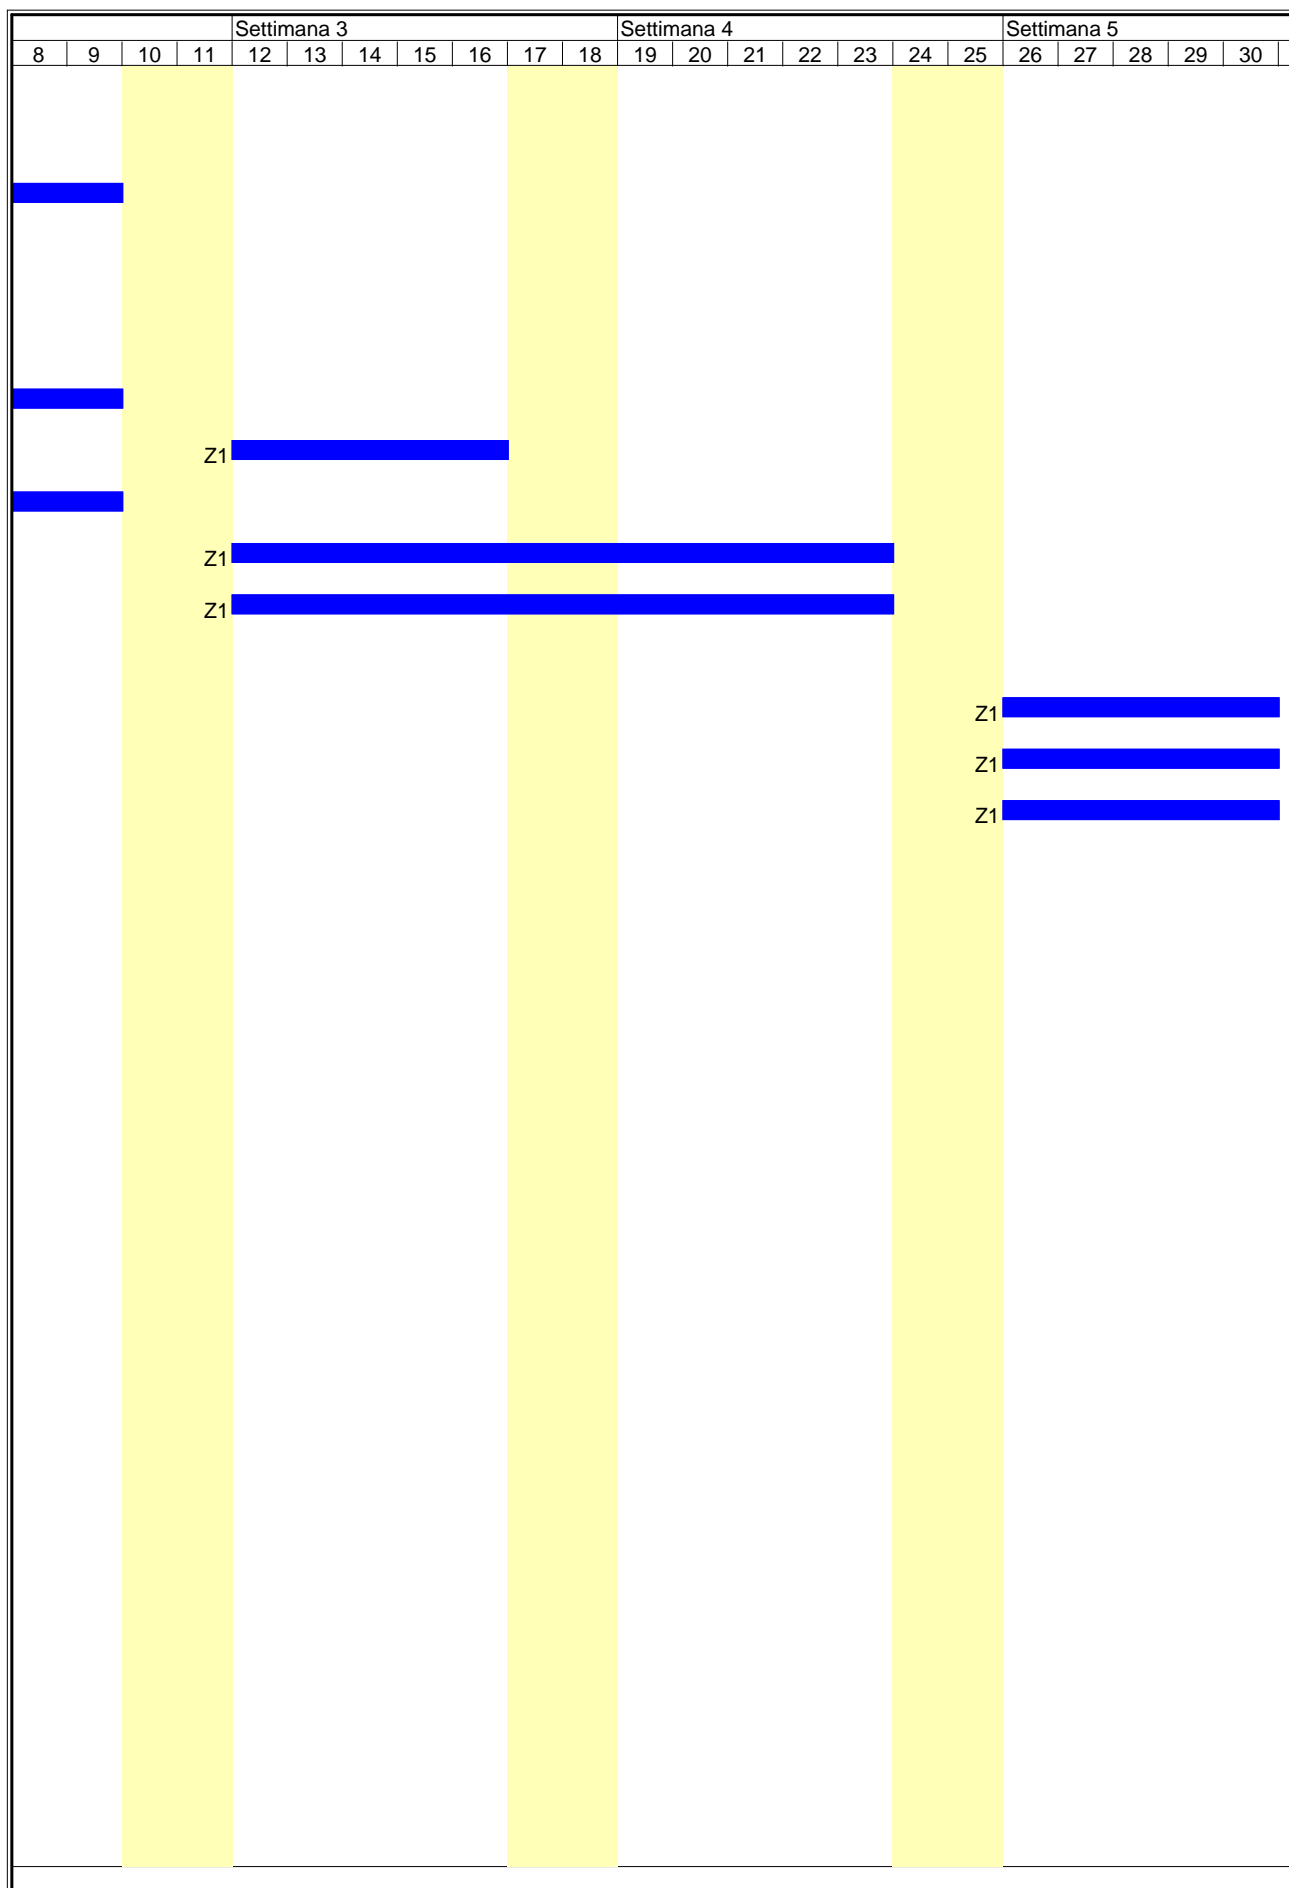

		Settimana 6							Settimana 7							Settimana 8						
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53

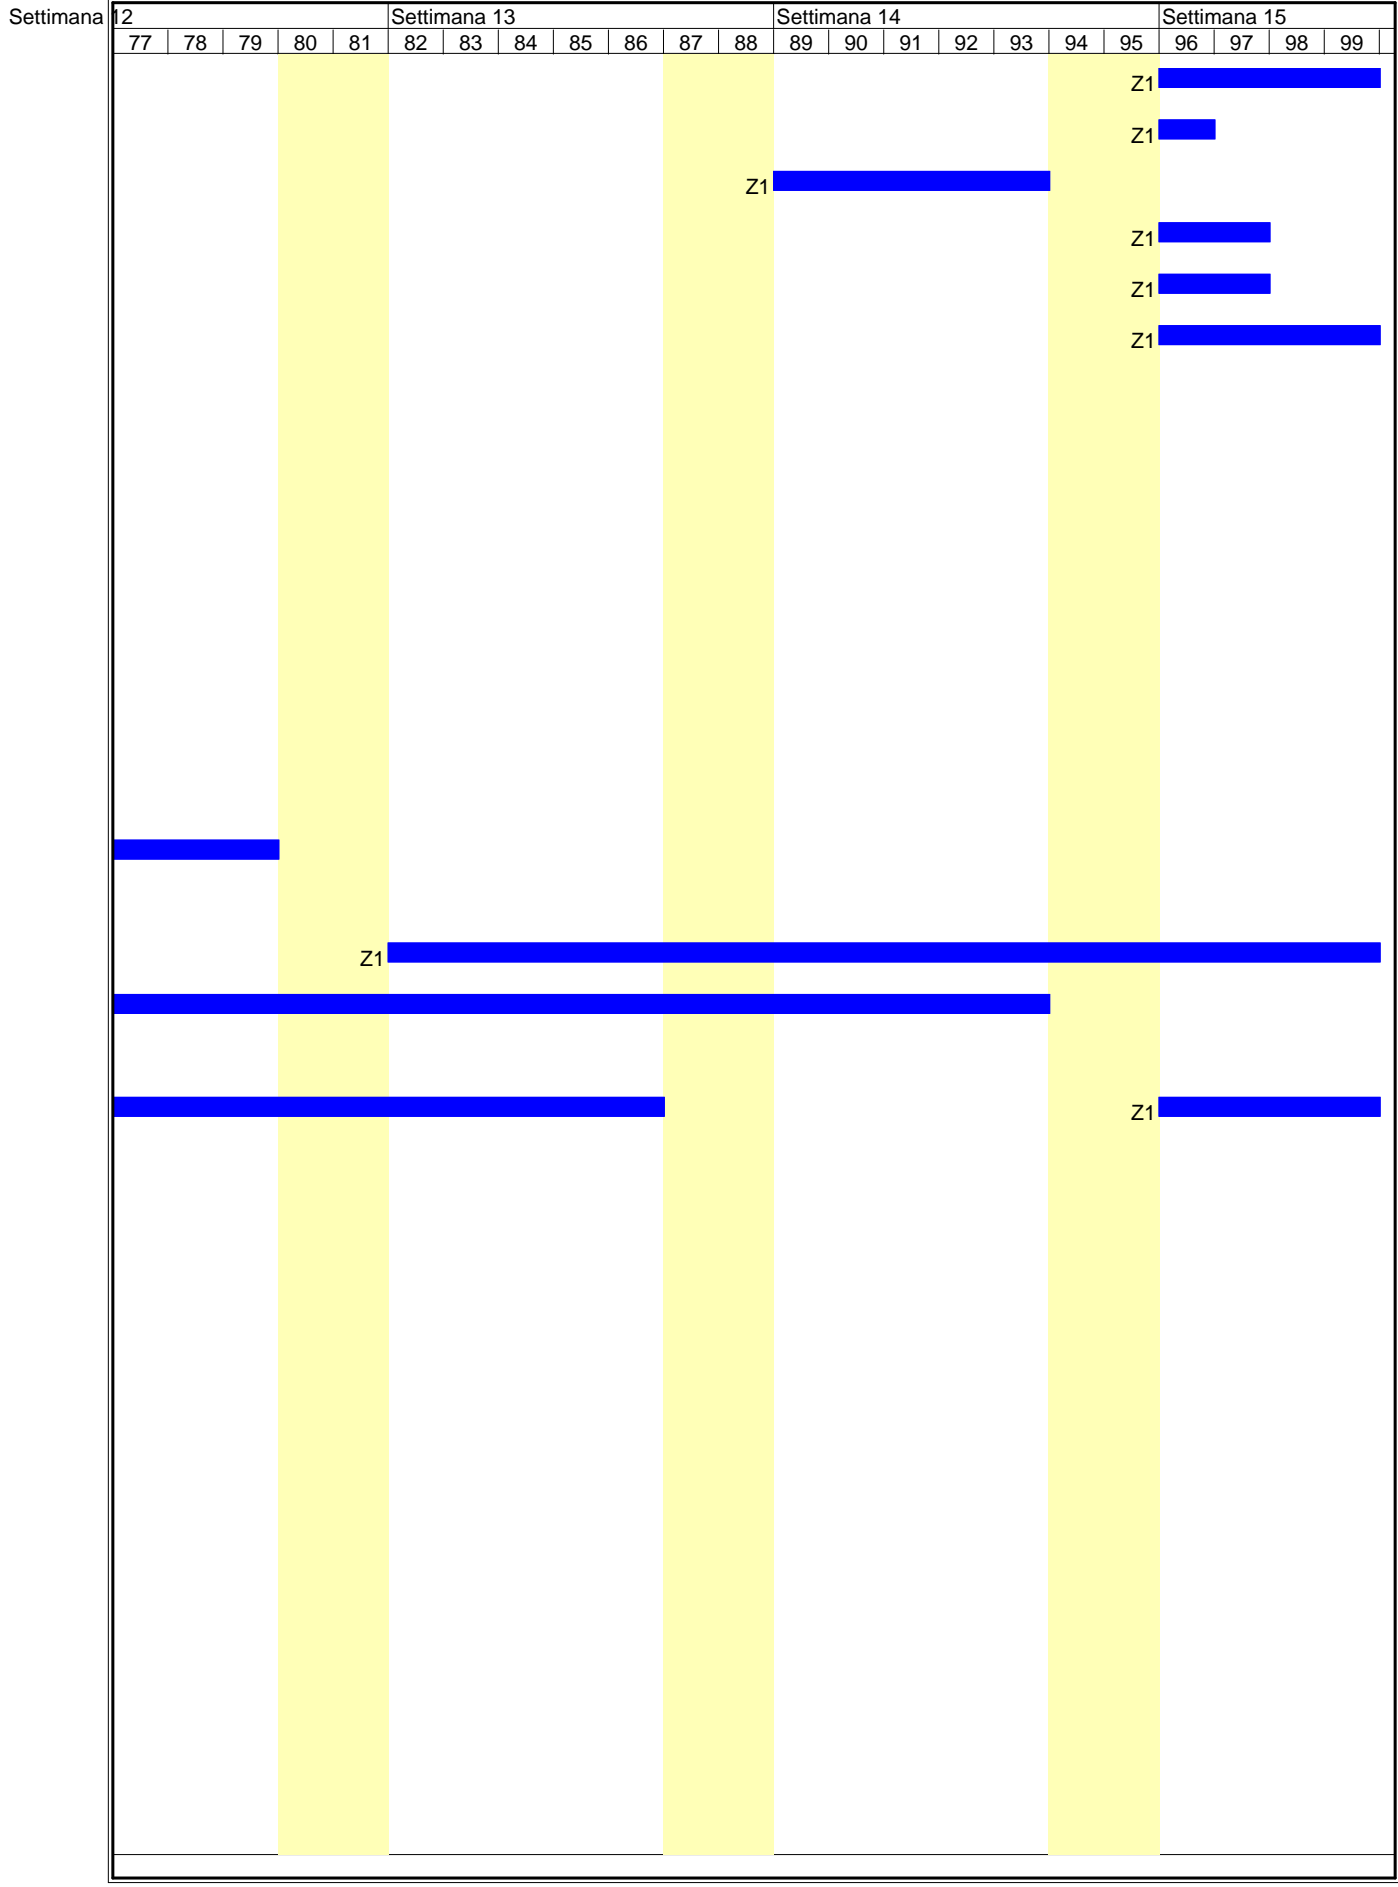

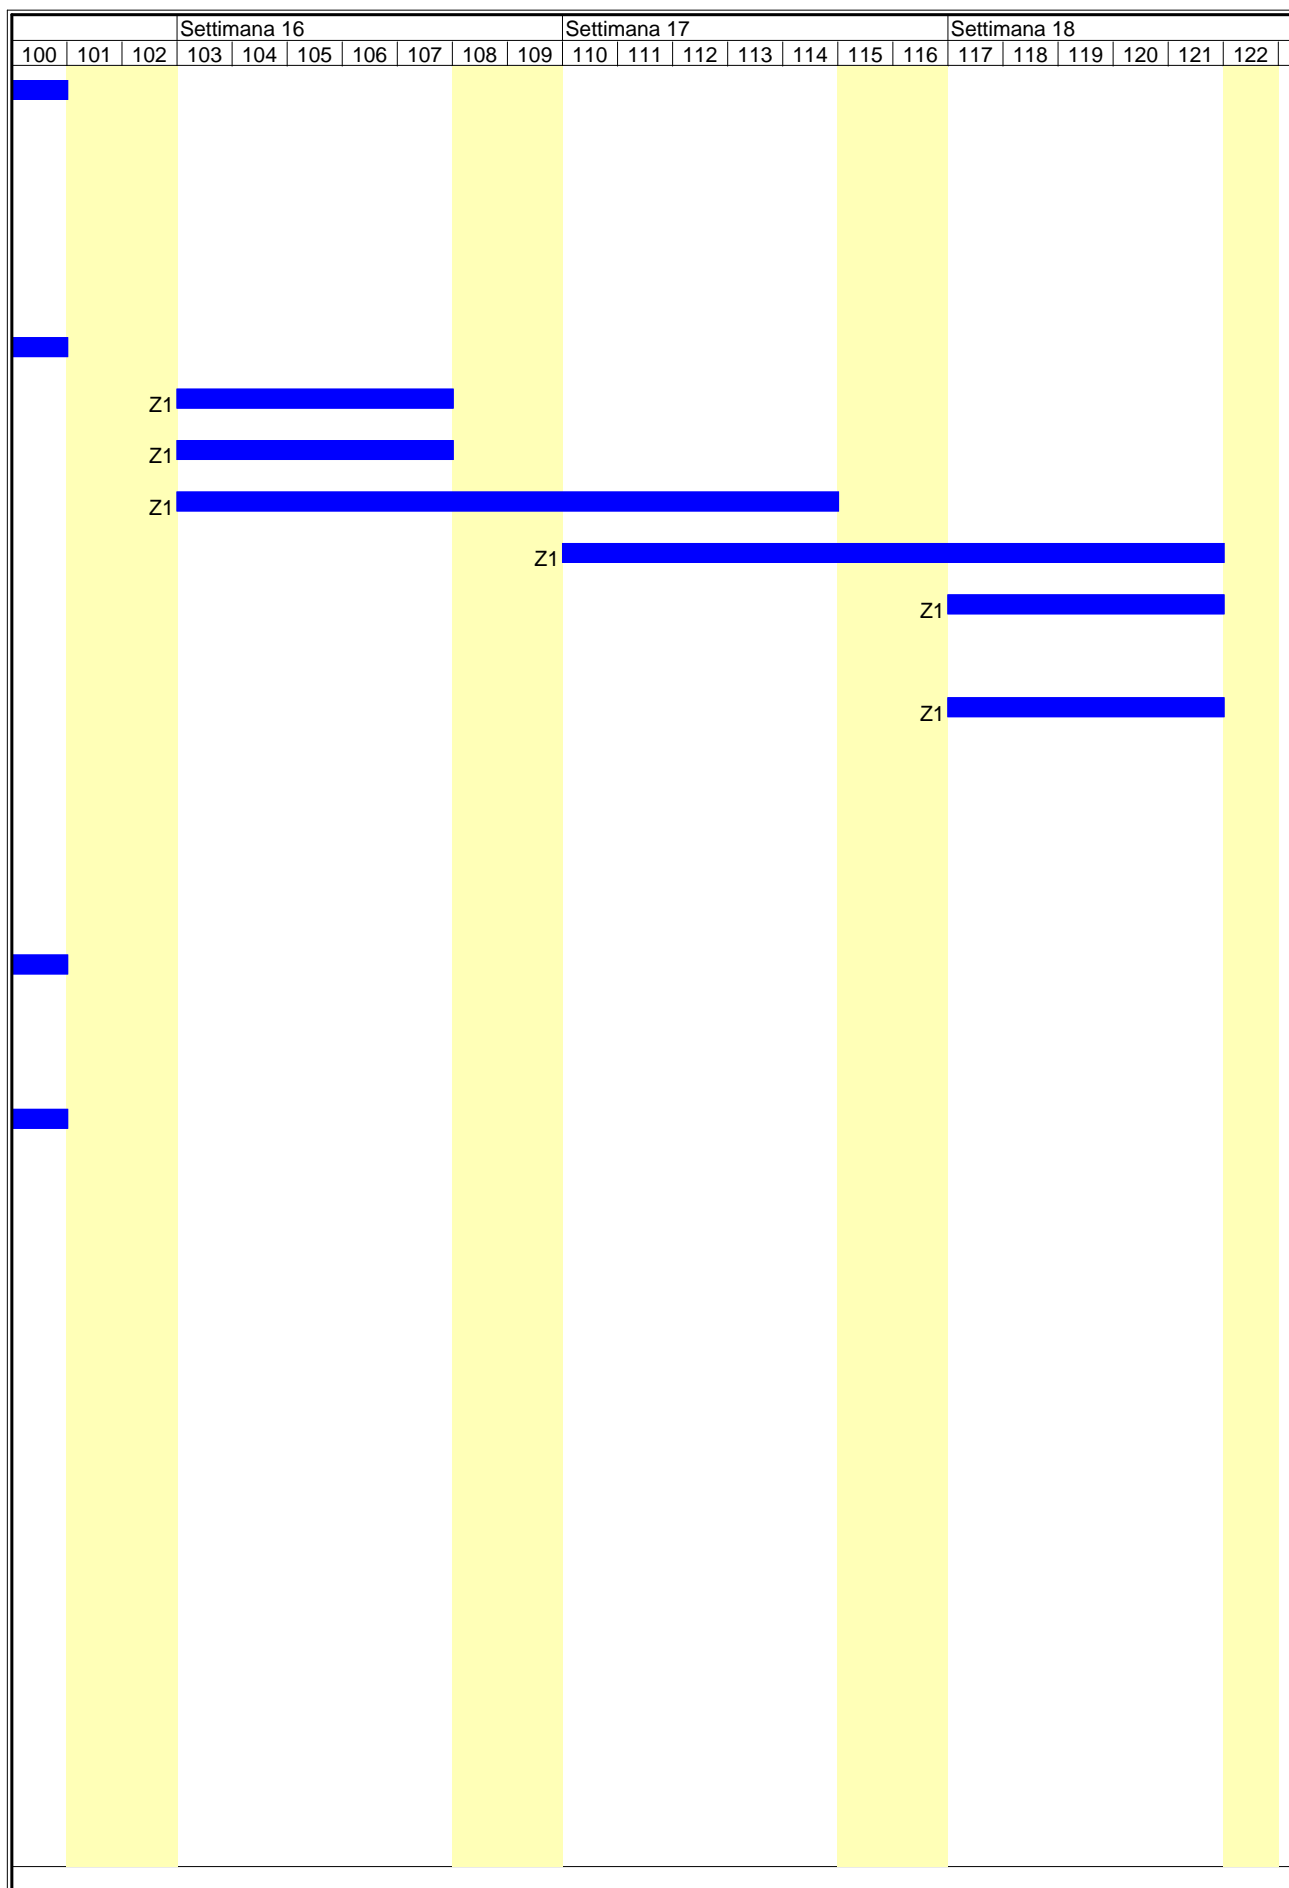

Settimana 19							Settimana 20							Settimana 21					Settir																									
123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145																						
Z1							Z1							Z1					Z1																									
																									Z1							Z1							Z1					
																									Z1							Z1							Z1					
																									Z1							Z1							Z1					
Z1							Z1							Z1					Z1																									
Z1							Z1							Z1					Z1																									

Settimana 22					Settimana 23					Settimana 24					Settimana 25							
146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168
[Blue bar]				[Blue bar]										[Blue bar]								
[Blue bar]				[Blue bar]										[Blue bar]								
[Blue bar]				[Blue bar]										[Blue bar]								
					Z1	[Blue bar]																
