




Data di pubblicazione: 10/10/2018

Nome allegato: *cronoprogramma_GANTT.pdf*

CIG: 7627966CAA;

Nome procedura: *procedura negoziata ai sensi del combinato disposto dell'art. 36, comma 2, lettera c) e comma 6 del D.Lgs. vo n. 50/2016, tramite procedura telematica di approvvigionamento del mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA), finalizzata ai lavori di realizzazione del nuovo impianto di condizionamento centralizzato ad espansione diretta presso gli stabili di viale Fantuzzi e via Diziani, adibiti a Sede della Direzione Provinciale Inps di Belluno.*

N. ord.	Cod.	Attività	Inizio	Fine	Durata gg.
1	A	Consegna dei lavori	0,00	0,00	0
2	B	Preparazione cantiere con formazione di recinzione area lavori Cortile Viale Fantuzzi	0,00	4,00	4
6	F	Posizionamento delle unità motocondensanti esterne sul cortile interno di Viale Fantuzzi	15,00	23,00	8
8	H	Parziale smontaggio di controsoffitto nei corridoi dei piani interessati	2,00	17,00	15
9	I	Montaggio terminali interni	10,00	40,00	30
10	L	Esecuzione delle linee frigorifere in rame con utilizzo di saldobrasatrice in atmosfera di azoto	15,00	60,00	45
11	M	Esecuzione della linea di scarico condensa in PVC	50,00	60,00	10
12	N	Prove di tenuta	60,00	63,00	3
13	O	Realizzazione di impianto elettrico di potenza, di controllo e di comando	45,00	75,00	30
14	P	Esecuzione del vuoto, carica di gas R-410A, prova di tenuta e di funzionamento	80,00	84,00	4
15	Q	Chiusura fori e rimontaggio del controsoffitto	64,00	69,00	5
2	B	Preparazione cantiere con formazione di recinzione area lavori Cortile Via Diziani	10,00	14,00	4
6	F	Posizionamento delle unità motocondensanti esterne sul cortile interno di Via Diziani	15,00	23,00	8
9	I	Montaggio terminali interni	23,00	53,00	30
10	L	Esecuzione delle linee frigorifere in rame con utilizzo di saldobrasatrice in atmosfera di azoto	45,00	80,00	35
11	M	Esecuzione della linea di scarico condensa in PVC	60,00	70,00	10
12	N	Prove di tenuta	70,00	73,00	3
13	O	Realizzazione di impianto elettrico di potenza, di controllo e di comando	60,00	85,00	25
14	P	Esecuzione del vuoto, carica di gas R-410A, prova di tenuta e di funzionamento	84,00	87,00	3
16	R	Formazione del personale	87,00	89,00	2
17	S	Collaudo e messa in marcia dell'impianto.	89,00	90,00	1
18	T	Pulitura a ultimazione lavori dell'area di cantiere e smobilizzo.	87,00	90,00	3
19	U	Fine lavori	89,00	90,00	1

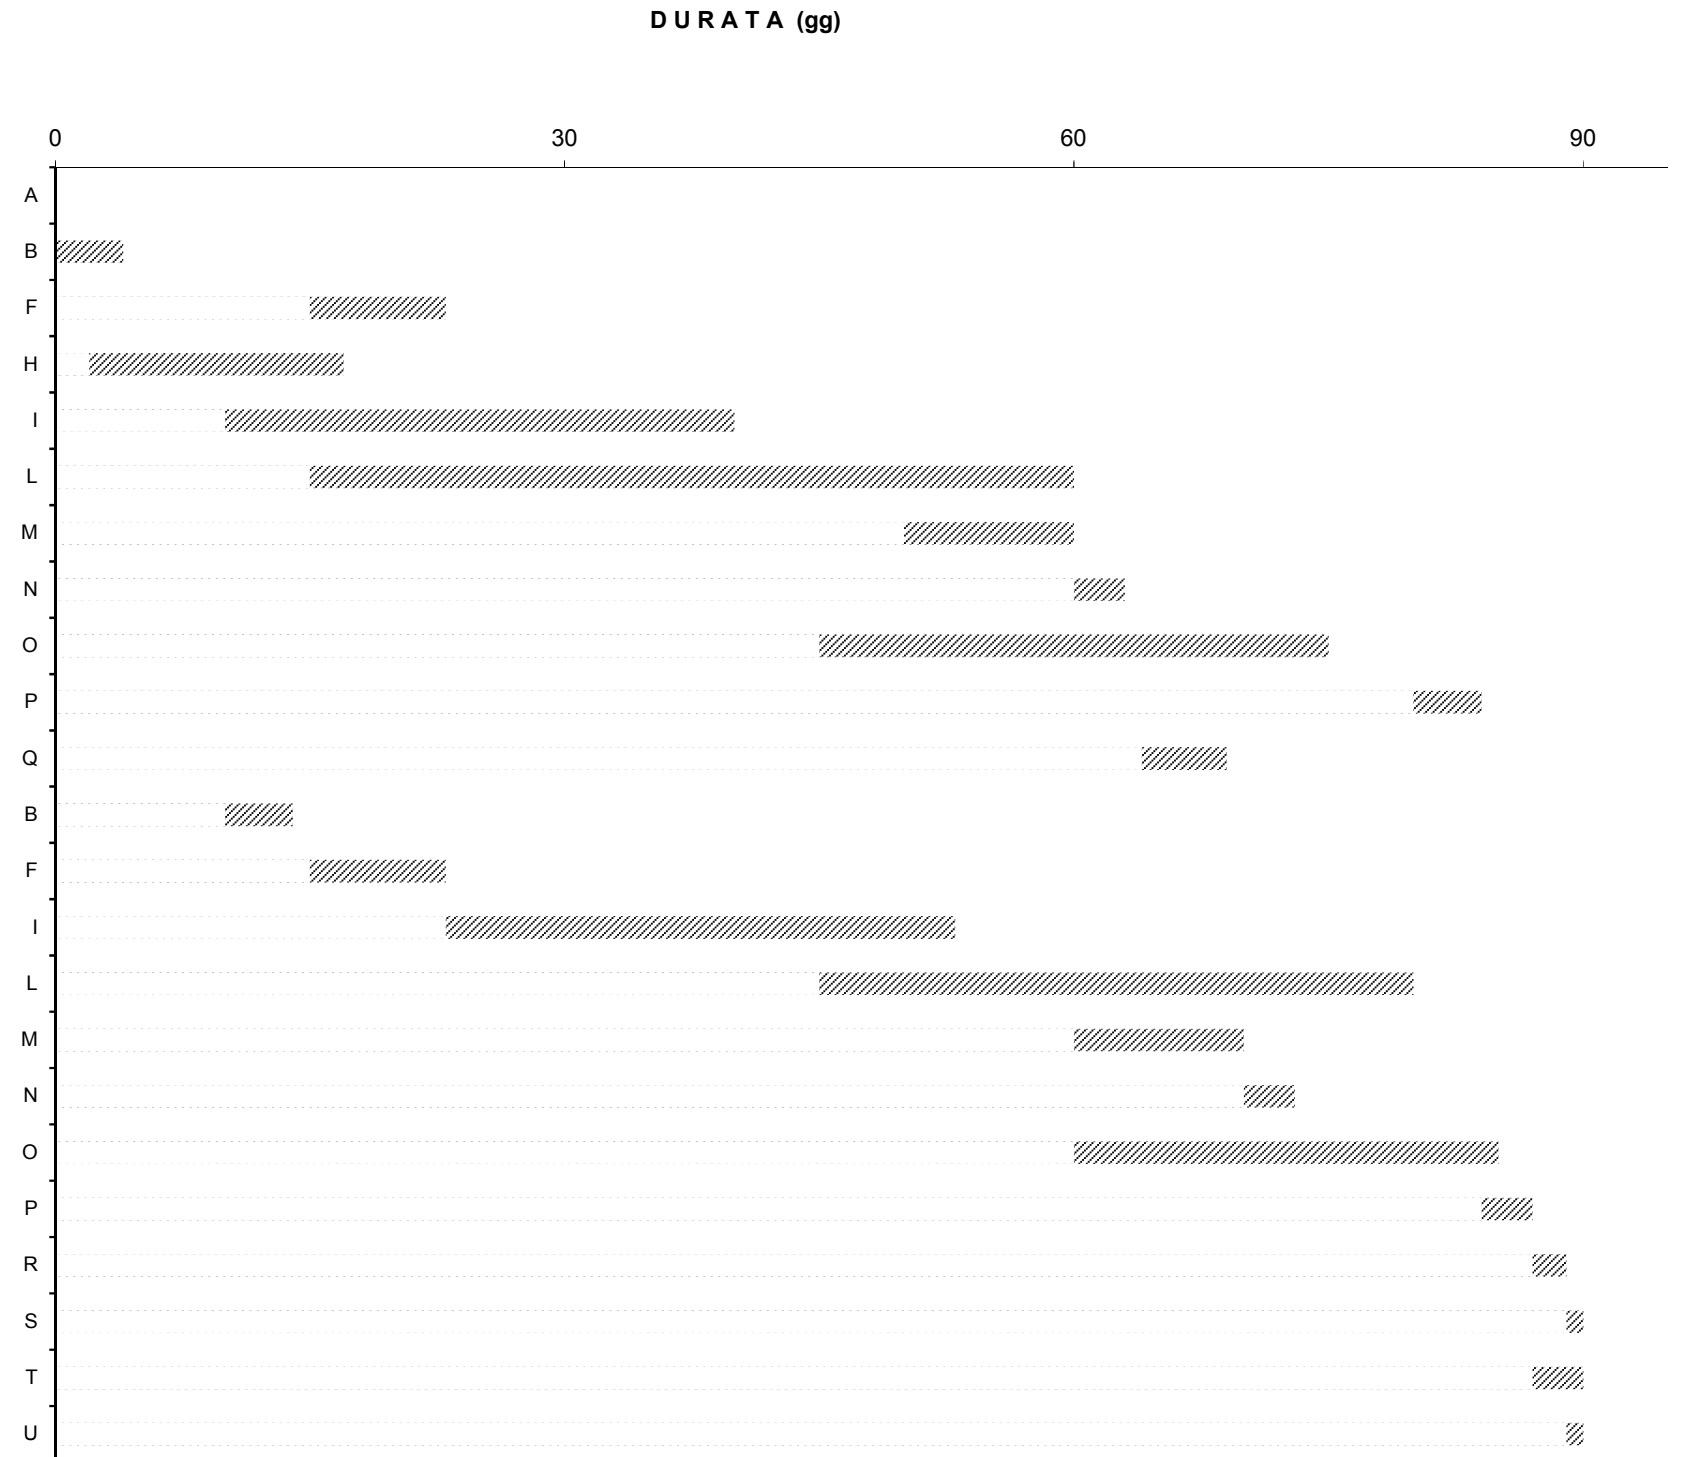

TC
90
gg.
Inizio dei lavori
0
gg
Fine lavori
90
gg

naturali consecutivi
