



**Data di pubblicazione:** 16/11/2018

**Nome allegato:** L)\_ALL-CRONOPROGRAMMA\_OP EDILI MS COP\_DP AN\_6-2018).pdf

**CIG:** 7681523150 (1);

**Nome procedura:** *Lavori di manutenzione straordinaria delle strutture in c.a., pavimentazione, impermeabilizzazione, coibentazione e messa in sicurezza delle protezioni perimetrali del solaio di copertura, in previsione della prossima installazione di pannelli fotovoltaici, presso la Sede Provinciale INPS di ANCONA, Via Ruggeri n.3.*

**INPS**

Istituto Nazionale Previdenza Sociale

Direzione Regionale Marche  
Coordinamento Tecnico Regionale**Comune di: Ancona****Provincia di: Ancona****Committente:** Direzione Regionale Inps delle Marche**C.U.P.:** F35I18000320005**C.I.G.:** **7681523150****Lavori:** Opere Edili di manutenzione straordinaria della coibentazione, impermeabilizzazione e pavimentazione della copertura piana dell'immobile da reddito INPS, sito in Ancona, via Ruggeri n. 3**ALLEGATO - L)*****CRONOPROGRAMMA***


Ancona, 7 novembre 2018

**Il Progettista**Geom. Vincenzo Pizzo  
**Firmato in originale****Il Responsabile del Procedimento**Ing. Roberto Recanatini  
**Firmato in originale**

Attività	Durata	Data inizio	Data fine
1 - APPRONTAMENTO E DELIMITAZIONE AREA DI CANTIERE	6,00	4 MAR 19 00:00:00	10 MAR 19 00:00:00
2 - POSA IN OPERA LINEE VITA	8,00	10 MAR 19 00:00:00	18 MAR 19 00:00:00
3 - MONTAGGIO PARAPETTI PROVVISORI	14,00	18/03/19	01/04
4 - MONTAGGIO GRU DI CANTIERE	3,00	1 APR 19 00:00:00	4 APR 19 00:00:00
5 - RIMOZIONE GRATE	4,00	4 APR 19 00:00:00	8 APR 19 00:00:00
6 - RIMOZIONE DEGLI STRATI POSTI SULLA TERRAZZA (BRECCIA, COIBENTAZIONE, ECC.) E TRASPORTO ALLA DISCARIC...	56,00	8 APR 19 00:00:00	3 GIU 19 00:00:00
7 - DEMOLIZIONE MURETTI DI RECINZIONE VANI TECNICI	14,00	3 GIU 19 00:00:00	17 GIU 19 00:00:00
8 - RIPRISTINO E VERIFICA REGOLARITA' ESISTENTE GUAINA IMPERMEABILE	14,00	17 GIU 19 00:00:00	1 LUG 19 00:00:00
9 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI ISOLAMENTO TERMICO	28,00	1 LUG 19 00:00:00	29 LUG 19 00:00:00
10 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI MASSETTO CEMENTIZIO PRECONFEZIONATO PER FORMAZIONE DELLE PENDENZE	21,00	29 LUG 19 00:00:00	19 AGO 19 00:00:00
11 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI BOCCHETTONI DI SCARICI PER RACCORDO DISCENDENTI	14,00	19/08/19	02/09
12 - IMPERMEABILIZZAZIONE TERRAZZI	70,00	2 SET 19 00:00:00	11 NOV 19 00:00:00
13 - IMPERMEABILIZZAZIONE E PROTEZIONE GIUNTI TECNICI	6,00	11 NOV 19 00:00:00	17 NOV 19 00:00:00
14 - CHIUSURA E SGOMBERO CANTIERE , SMONTAGGIO PARAPETTI PROVVISORI E SMONTAGGIO E RIMOZIONE GRU	12,00	17/11/19	29/11
Data Inizio Lavori			
Data Fine Lavori			
Durata Lavori			
Totale Preventivo			
Totale Preventivo Progressivo			
Percentuale Preventivo			
Percentuale Preventivo Progressivo			






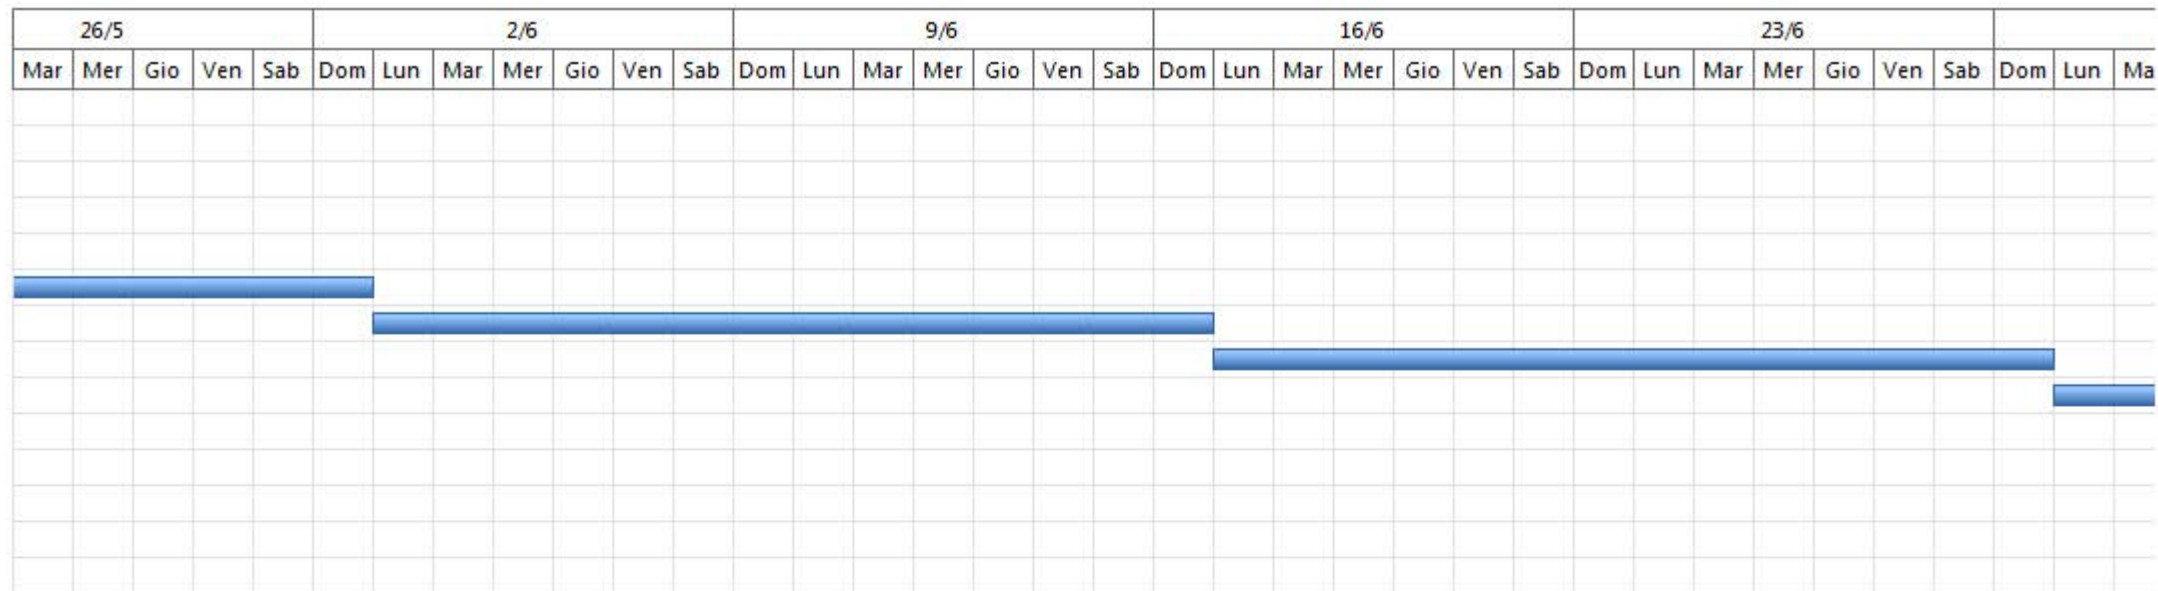

5.554	1.344	1.344	4.552	4.552
83.544	84.888	86.232	90.783	95.335
1	0	0	1	1
22	22	22	24	25

7/7						14/7						21/7						28/7						4/8											
Lun	Mar	Mer	Gio	Ven	Sab	Dom	Lun	Mar	Mer	Gio	Ven	Sab	Dom	Lun	Mar	Mer	Gio	Ven	Sab	Dom	Lun	Mar	Mer	Gio	Ven	Sab	Dom	Lun	Mar	Mer	Gio	Ven	Sab	Dom	Lun

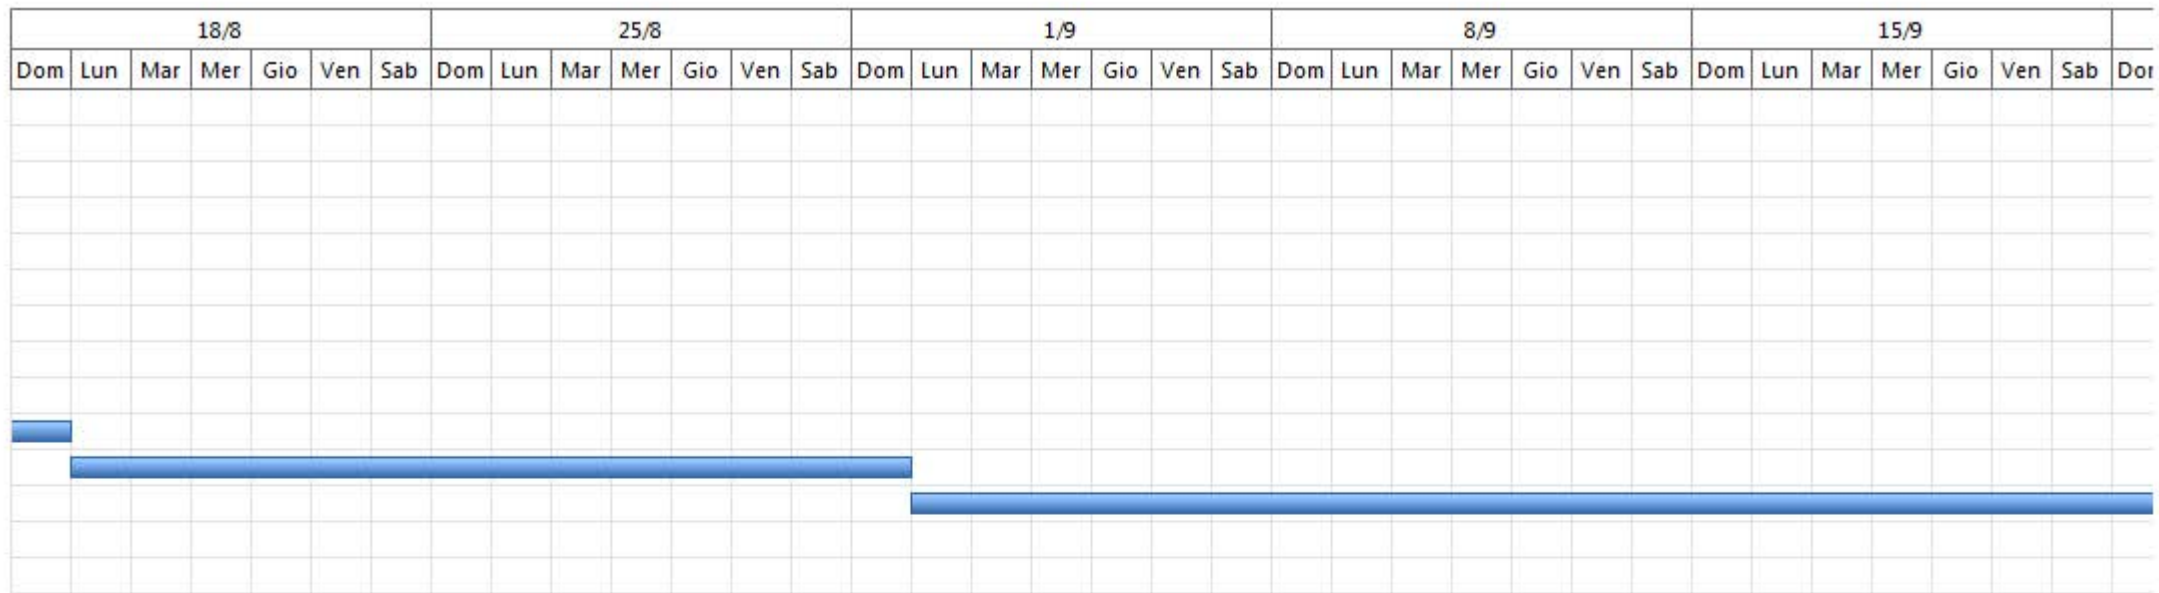

9.079		2.227		2.227		17.263		17.263		17.263
1.595		203.822		206.049		223.312		240.575		257.832
5		1		1		4		4		6
52		53		53		58		62		68





		10/11							17/11							24/11									
Ven	Sab	Dom	Lun	Mar	Mer	Gio	Ven	Sab	Dom	Lun	Mar	Mer	Gio	Ven	Sab	Dom	Lun	Mar	Mer	Gio	Ven	Sab	Dom	Lun	Mar
																						4/3/2019			
																						29/11/2019			
																						270,0			
17.263									4.782							1.132							647		
378.679									383.460							384.593							385.240		
4									1							0							0		
98									100							100							100		
