



Data di pubblicazione: 12/12/2018

Nome allegato: ALL.A DIAGRAMMA DI GANTT -
CRONOPROGRAMMA LAVORI-signed.pdf

CIG: 7720632314 (UNICO);

Nome procedura: Affidamento dei lavori di "Razionalizzazione
logistica degli spazi per rilascio fittanze, adeguamento al d.lgs
81/08: ristrutturazione del p. 3°, completamento p. 5° e
rifacimento servizi igienici p. 6° presso lo stabile di via Laurana, 59
- Palermo.

ALLEGATO "A"

Comune di Palermo
Provincia di PA

DIAGRAMMA DI GANTT

Cronoprogramma dei lavori
(D.Lgs 9 aprile 2008 n. 81, Art. 100 e Allegato XV)

- OGGETTO:** INPS - SEDE REGIONALE SICILIA - Immobile di via Laurana n.59Razionalizzazione logistica degli spazi per rilascio affittanze, adeguamento al D.Lgs. 81/2008: ristrutturazione del 3° piano, completamento piano 5° e rifacimento servizi igienici piano 6°.
- COMMITTENTE:** ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE - DIREZIONE REGIONALE SICILIA
- CANTIERE:** via Laurana n. 59, Palermo (PA)

Palermo, li 04/10/2018

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA
(geometra guttuso antonino)

IL COMMITTENTE
(Direttore Regionale Sicilia Saltalamacchia Sergio)

\$Empty_CSP_03.50x02.60\$
geometra guttuso antonino
via maggiore toselli n.5
90143 Palermo (PA)
091285410 - \$Empty_CSP_10\$
antonino.guttuso@inps.it

TABELLA ANALITICA GANTT

Tabella Analitica Gantt

FASI DI LAVORO	Z	I	gg L	gg C	data Iniziale	data Finale
Allestimento di cantiere temporaneo	1	E	6	8	01/03/2019	08/03/2019
Lavorazioni fase n.1 - P.3° lato via Toselli						
Rimozione di serramenti interni	1	E	5	5	11/03/2019	15/03/2019
Rimozione di controsoffittature, intonaci e rivestimenti interni	1	E	3	3	13/03/2019	15/03/2019
Rimozione di pavimenti interni	1	E	5	5	18/03/2019	22/03/2019
Demolizione di pareti divisorie	1	E	5	5	25/03/2019	29/03/2019
Realizzazione di divisori interni in muratura	1	E	5	5	01/04/2019	05/04/2019
Formazione intonaci interni (tradizionali)	1	E	6	8	05/04/2019	12/04/2019
Posa di pavimenti per interni	1	E	29	44	15/04/2019	28/05/2019
Realizzazione di contropareti e controsoffitti	1	E	20	29	26/04/2019	24/05/2019
Posa di serramenti interni	1	E	10	16	23/04/2019	08/05/2019
Realizzazione di impianto elettrico interno e trasmissione dati/voip	1	E	30	45	15/04/2019	29/05/2019
Tinteggiatura di superfici interne	1	E	32	47	15/04/2019	31/05/2019
Lavorazioni fase n.2 - P.3° lato via Galliano						
smontaggio/montaggio piattaforma elevatrice	1	E	5	5	03/06/2019	07/06/2019
spostamento e sgombero locali	1	E	20	26	03/06/2019	28/06/2019
Rimozione di serramenti interni	1	E	5	5	01/07/2019	05/07/2019
Rimozione di controsoffittature, intonaci e rivestimenti interni	1	E	3	5	05/07/2019	09/07/2019
Rimozione di pavimenti interni	1	E	5	5	08/07/2019	12/07/2019
Demolizione di pareti divisorie	1	E	5	5	15/07/2019	19/07/2019
Realizzazione di divisori interni in muratura	1	E	5	5	22/07/2019	26/07/2019
Formazione intonaci interni (tradizionali)	1	E	6	8	26/07/2019	02/08/2019
Posa di pavimenti per interni	1	E	34	47	05/08/2019	20/09/2019
Realizzazione di contropareti e controsoffitti	1	E	18	24	19/08/2019	11/09/2019
Posa di serramenti interni	1	E	10	12	19/08/2019	30/08/2019
Realizzazione di impianto elettrico interno e trasmissione dati/voip	1	E	39	54	05/08/2019	27/09/2019
Tinteggiatura di superfici interne	1	E	39	54	05/08/2019	27/09/2019
Lavorazioni fase n.3 - P.5° lato via Galliano						
spostamento e sgombero locali	1	E	23	31	01/10/2019	31/10/2019
Rimozione di serramenti interni	1	E	5	5	04/11/2019	08/11/2019
Rimozione di controsoffittature, intonaci e rivestimenti interni	1	E	3	3	06/11/2019	08/11/2019
Rimozione di pavimenti interni	1	E	5	5	11/11/2019	15/11/2019
Demolizione di pareti divisorie	1	E	5	5	18/11/2019	22/11/2019
Realizzazione di divisori interni in muratura	1	E	5	5	25/11/2019	29/11/2019
Formazione intonaci interni (tradizionali)	1	E	6	8	29/11/2019	06/12/2019
Posa di pavimenti per interni	1	E	34	52	09/12/2019	29/01/2020
Realizzazione di contropareti e controsoffitti	1	E	16	26	23/12/2019	17/01/2020
Posa di serramenti interni	1	E	11	19	23/12/2019	10/01/2020
Realizzazione di impianto elettrico interno e trasmissione dati/voip	1	E	34	52	09/12/2019	29/01/2020
Tinteggiatura di superfici interne	1	E	36	54	09/12/2019	31/01/2020

Tabella Analitica Gantt

Lavorazioni fase n.4 - P.5° lato via Toselli						
smontaggio/montaggio piattaforma elevatrice	1	E	5	5	03/02/2020	07/02/2020
spostamento e sgombero locali	1	E	20	26	03/02/2020	28/02/2020
Rimozione di serramenti interni	1	E	5	5	02/03/2020	06/03/2020
Rimozione di controsoffittature, intonaci e rivestimenti interni	1	E	3	3	04/03/2020	06/03/2020
Rimozione di pavimenti interni	1	E	5	5	09/03/2020	13/03/2020
Demolizione di pareti divisorie	1	E	5	5	16/03/2020	20/03/2020
Realizzazione di divisori interni in muratura	1	E	6	8	20/03/2020	27/03/2020
Formazione intonaci interni (tradizionali)	1	E	7	9	30/03/2020	07/04/2020
Posa di pavimenti per interni	1	E	31	45	08/04/2020	22/05/2020
Realizzazione di contropareti e controsoffitti	1	E	19	26	27/04/2020	22/05/2020
Posa di serramenti interni	1	E	12	17	22/04/2020	08/05/2020
Realizzazione di impianto elettrico interno e trasmissione dati/voip	1	E	36	52	08/04/2020	29/05/2020
Tinteggiatura di superfici interne	1	E	38	54	06/04/2020	29/05/2020
Lavorazioni fase n.5 - P.6° e P.2°						
smontaggio piattaforma elevatrice	1	E	4	5	01/06/2020	05/06/2020
spostamento e sgombero locali	1	E	9	12	01/06/2020	12/06/2020
Rimozione di serramenti interni	1	E	2	2	15/06/2020	16/06/2020
Rimozione di controsoffittature, intonaci e rivestimenti interni	1	E	3	3	17/06/2020	19/06/2020
Rimozione di pavimenti interni	1	E	5	5	22/06/2020	26/06/2020
Demolizione di pareti divisorie	1	E	2	2	25/06/2020	26/06/2020
Realizzazione di divisori interni in muratura	1	E	3	3	29/06/2020	01/07/2020
Formazione intonaci interni (tradizionali)	1	E	7	9	02/07/2020	10/07/2020
Posa di pavimenti e rivestimenti per interni	1	E	6	8	07/07/2020	14/07/2020
Realizzazione di contropareti e controsoffitti	1	E	5	5	13/07/2020	17/07/2020
Posa di serramenti interni	1	E	2	2	20/07/2020	21/07/2020
Realizzazione di impianto elettrico interno e trasmissione dati/voip	1	E	5	5	13/07/2020	17/07/2020
Tinteggiatura di superfici interne	1	E	5	7	23/07/2020	29/07/2020
Realizzazione di impianto idrico-sanitario e Termico	1	E	15	19	22/06/2020	10/07/2020
Smobilizzo del cantiere	1	E	2	2	30/07/2020	31/07/2020

LEGENDA:

Z = ZONA

Elenco delle Zone attribuite alle Fasi del Programma Lavori:

1) = ZONA UNICA

I = IMPRESA


Elenco delle Imprese presenti nel Programma Lavori:


E <Nessuna impresa definita>

gg C = DURATA, espressa in giorni naturali e consecutivi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro


gg L = DURATA, espressa in giorni lavorativi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro


Nome attività	ora	Mese 1																														Mese 2											
		-2	-1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35					
Posa di serramenti interni	12 g																																										
Realizzazione di impianto elettrico int	6 g																																										
Tinteggiatura di superfici interne	38 g																																										
Lavorazioni fase n.5 - P.6° e P.2°	42 g																																										
smontaggio piattaforma elevatrice	4 g																																										
spostamento e sgombero locali	9 g																																										
Rimozione di serramenti interni	2 g																																										
Rimozione di controsoffittature, intona	3 g																																										
Rimozione di pavimenti interni	5 g																																										
Demolizione di pareti divisorie	2 g																																										
Realizzazione di divisori interni in mur	3 g																																										
Formazione intonaci interni (tradiziona	7 g																																										
Posa di pavimenti e rivestimenti per in	6 g																																										
Realizzazione di contropareti e contro	5 g																																										
Posa di serramenti interni	2 g																																										
Realizzazione di impianto elettrico inte	5 g																																										
Tinteggiatura di superfici interne	5 g																																										
Realizzazione di impianto idrico-sanita	5 g																																										
Smobilizzo del cantiere	2 g																																										
LEGENDA Zona:																																											
Z1 = ZONA UNICA																																											

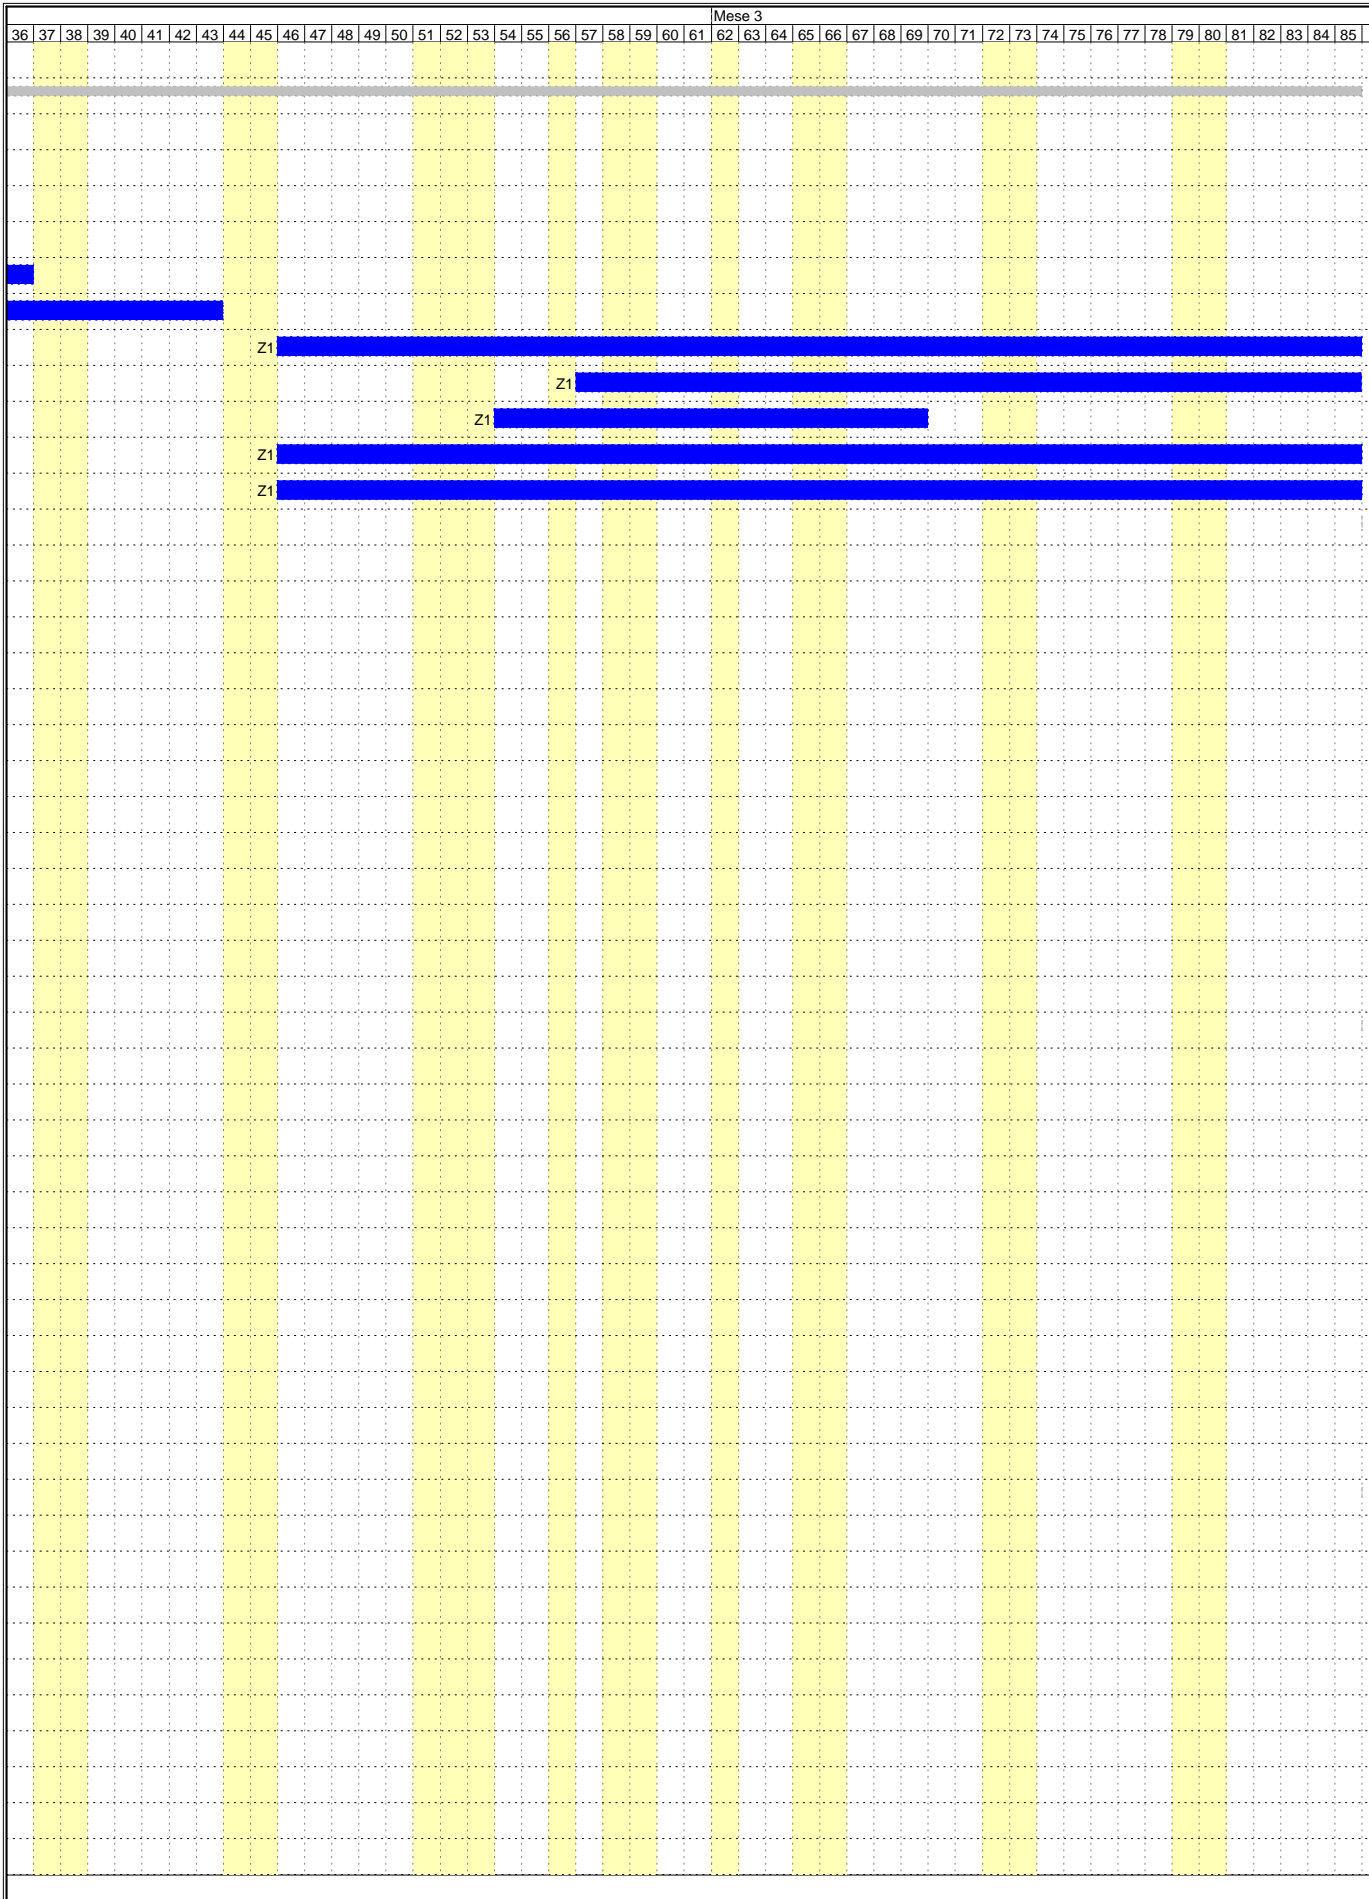

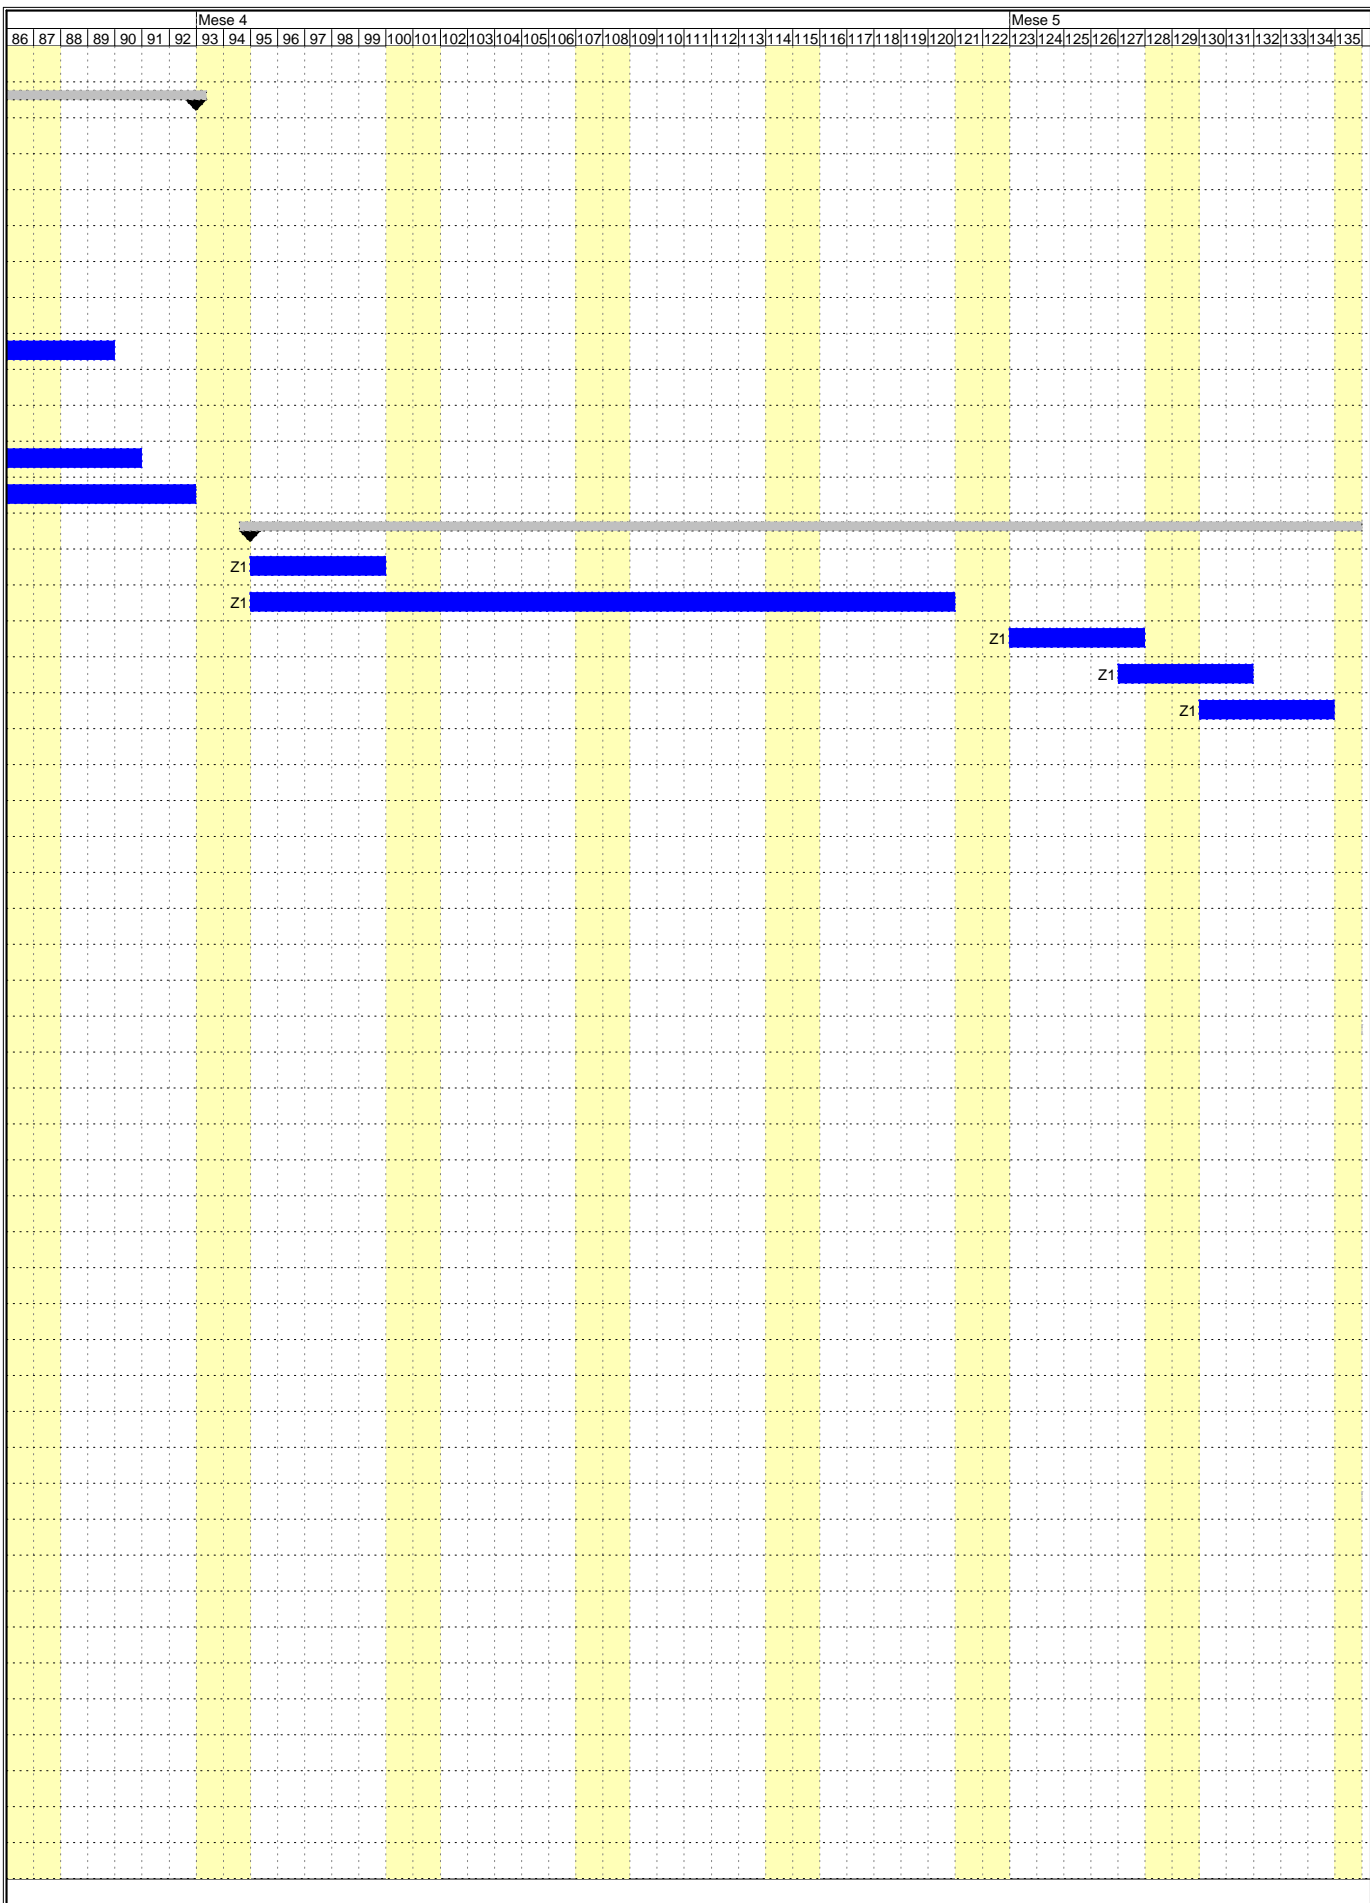


Mese 4																			Mese 5																																			
86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135					

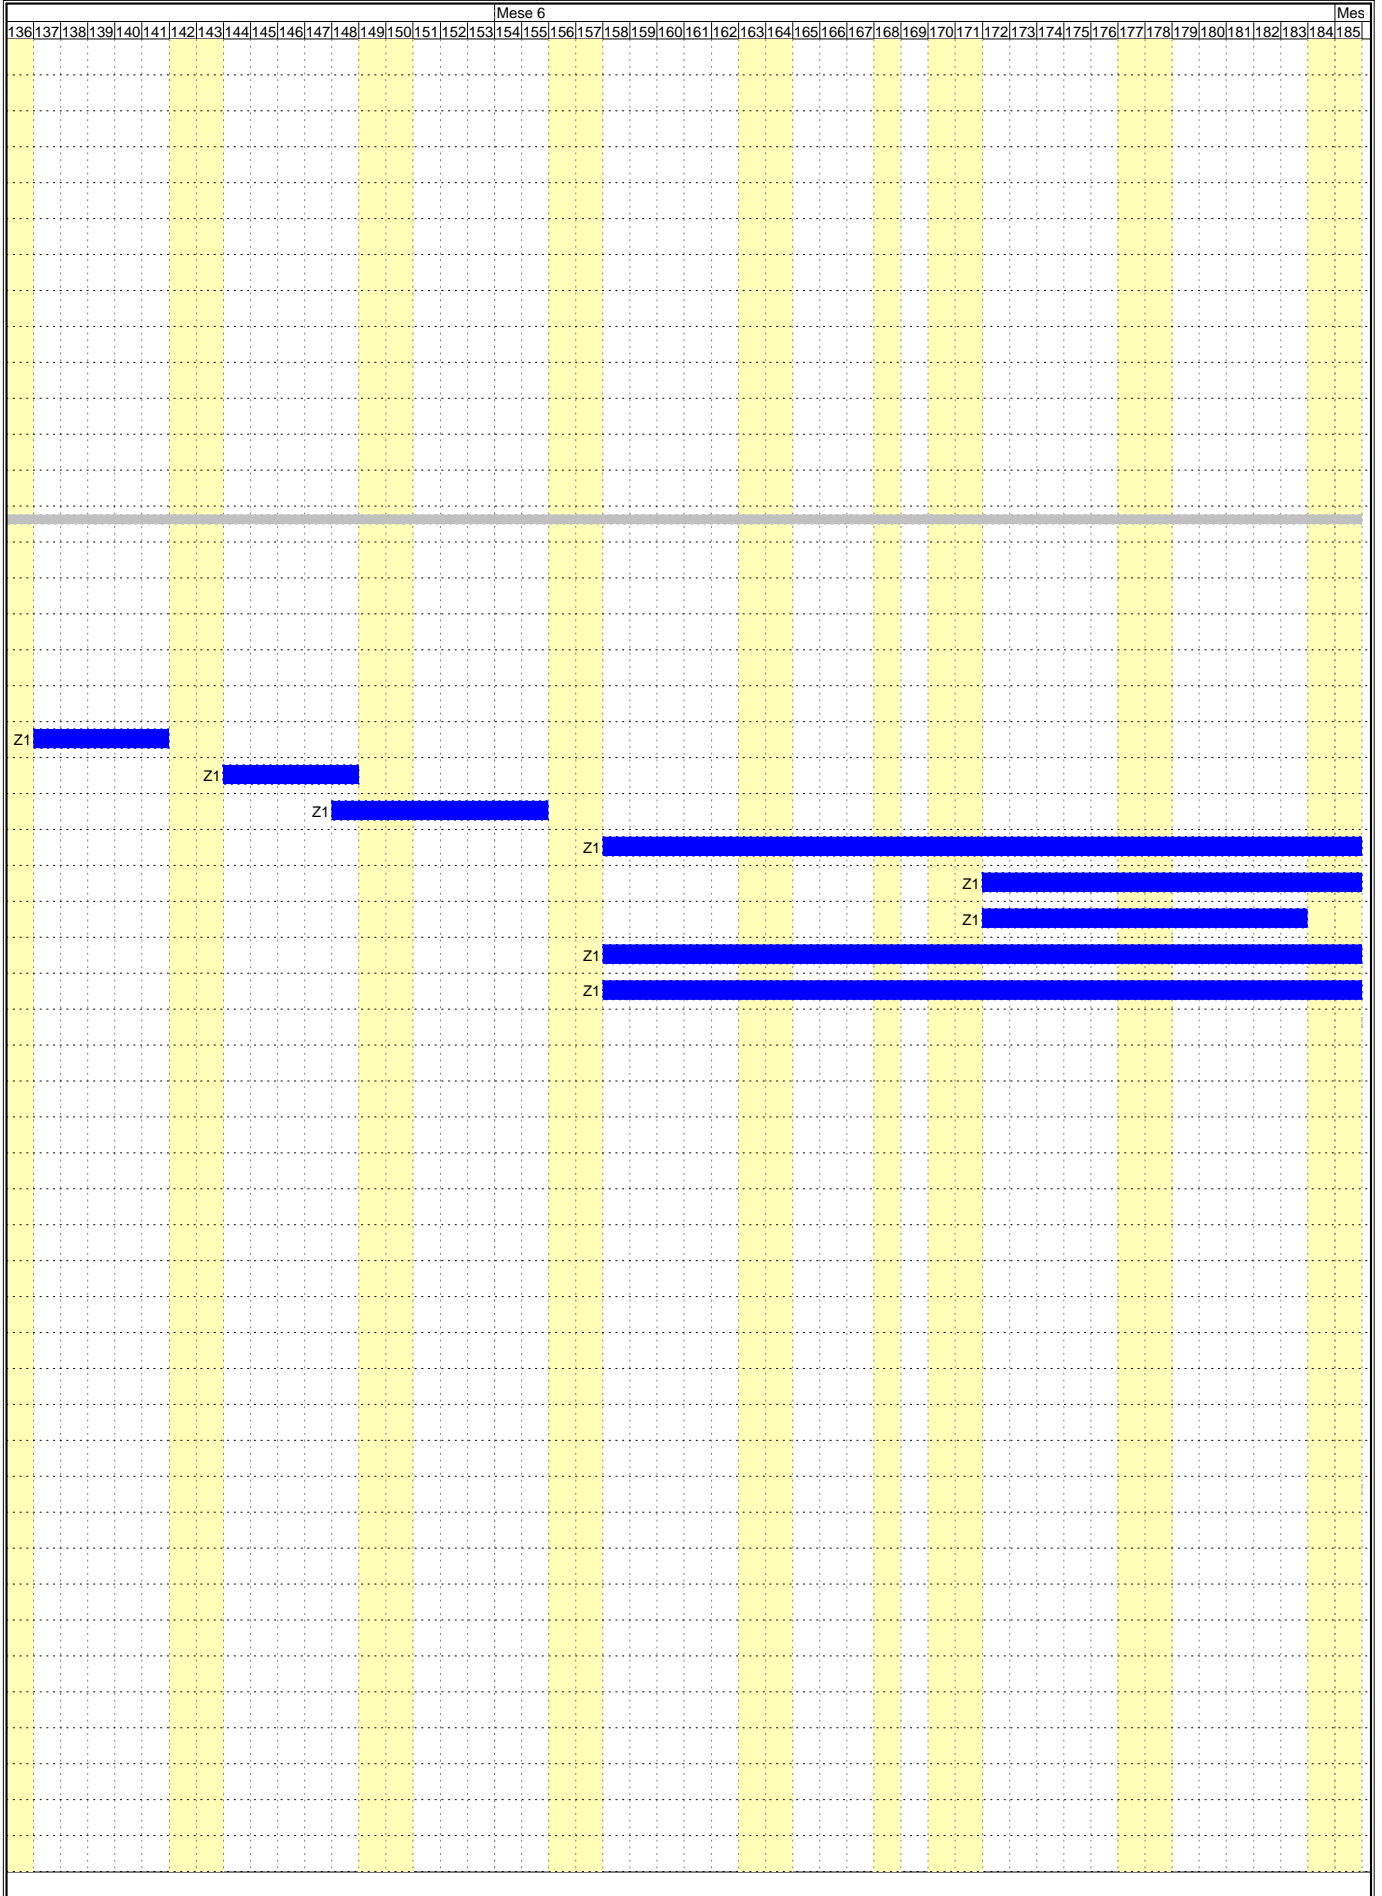

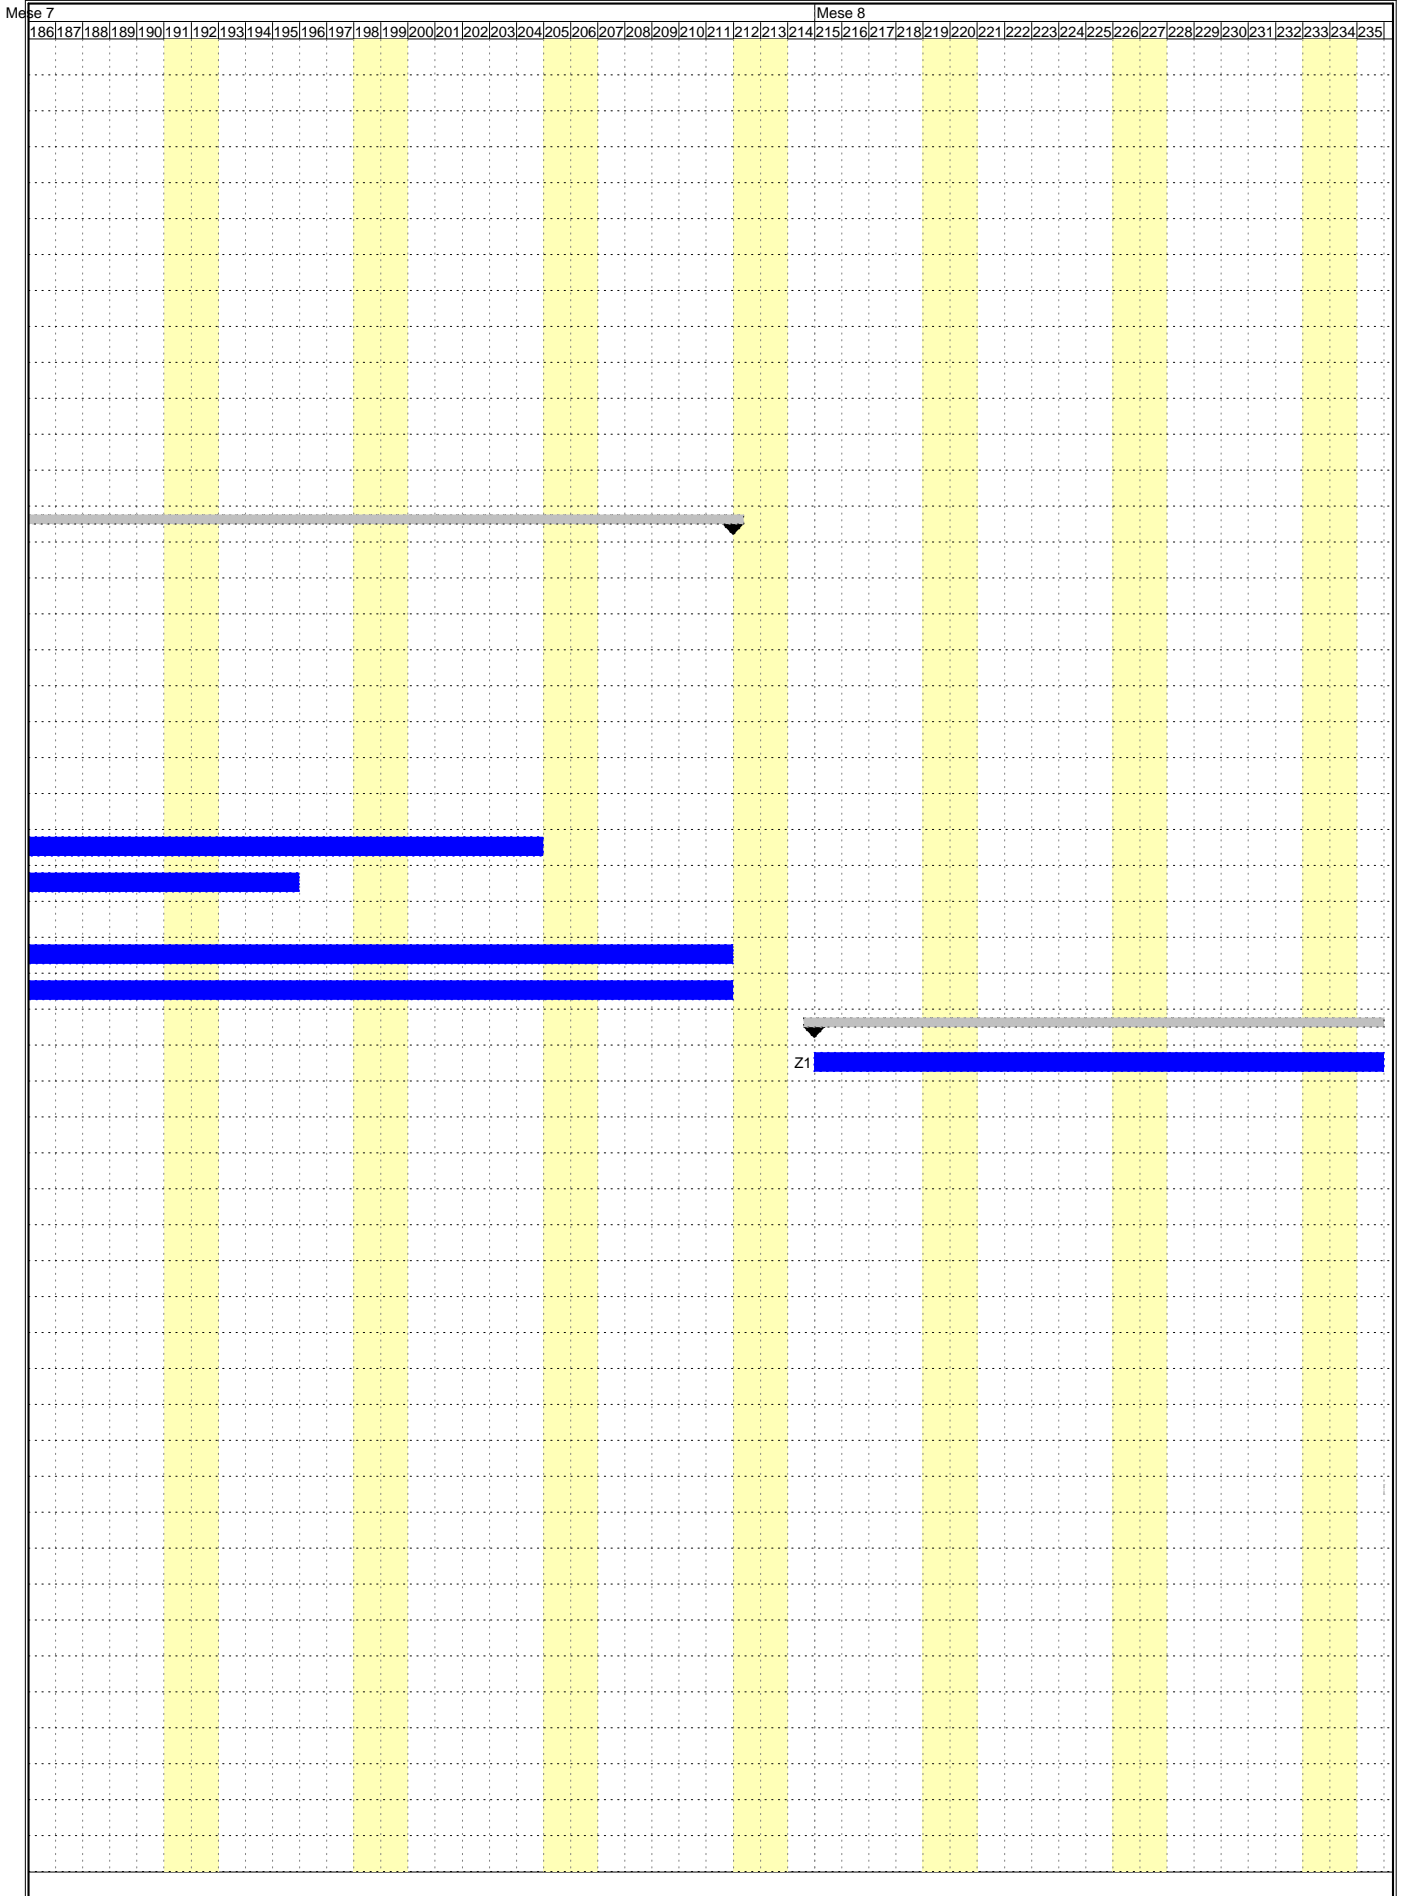

Mese 7	Mese 8
186	187
188	189
190	191
192	193
194	195
196	197
198	199
200	201
202	203
204	205
206	207
208	209
210	211
212	213
214	215
216	217
218	219
220	221
222	223
224	225
226	227
228	229
230	231
232	233
234	235

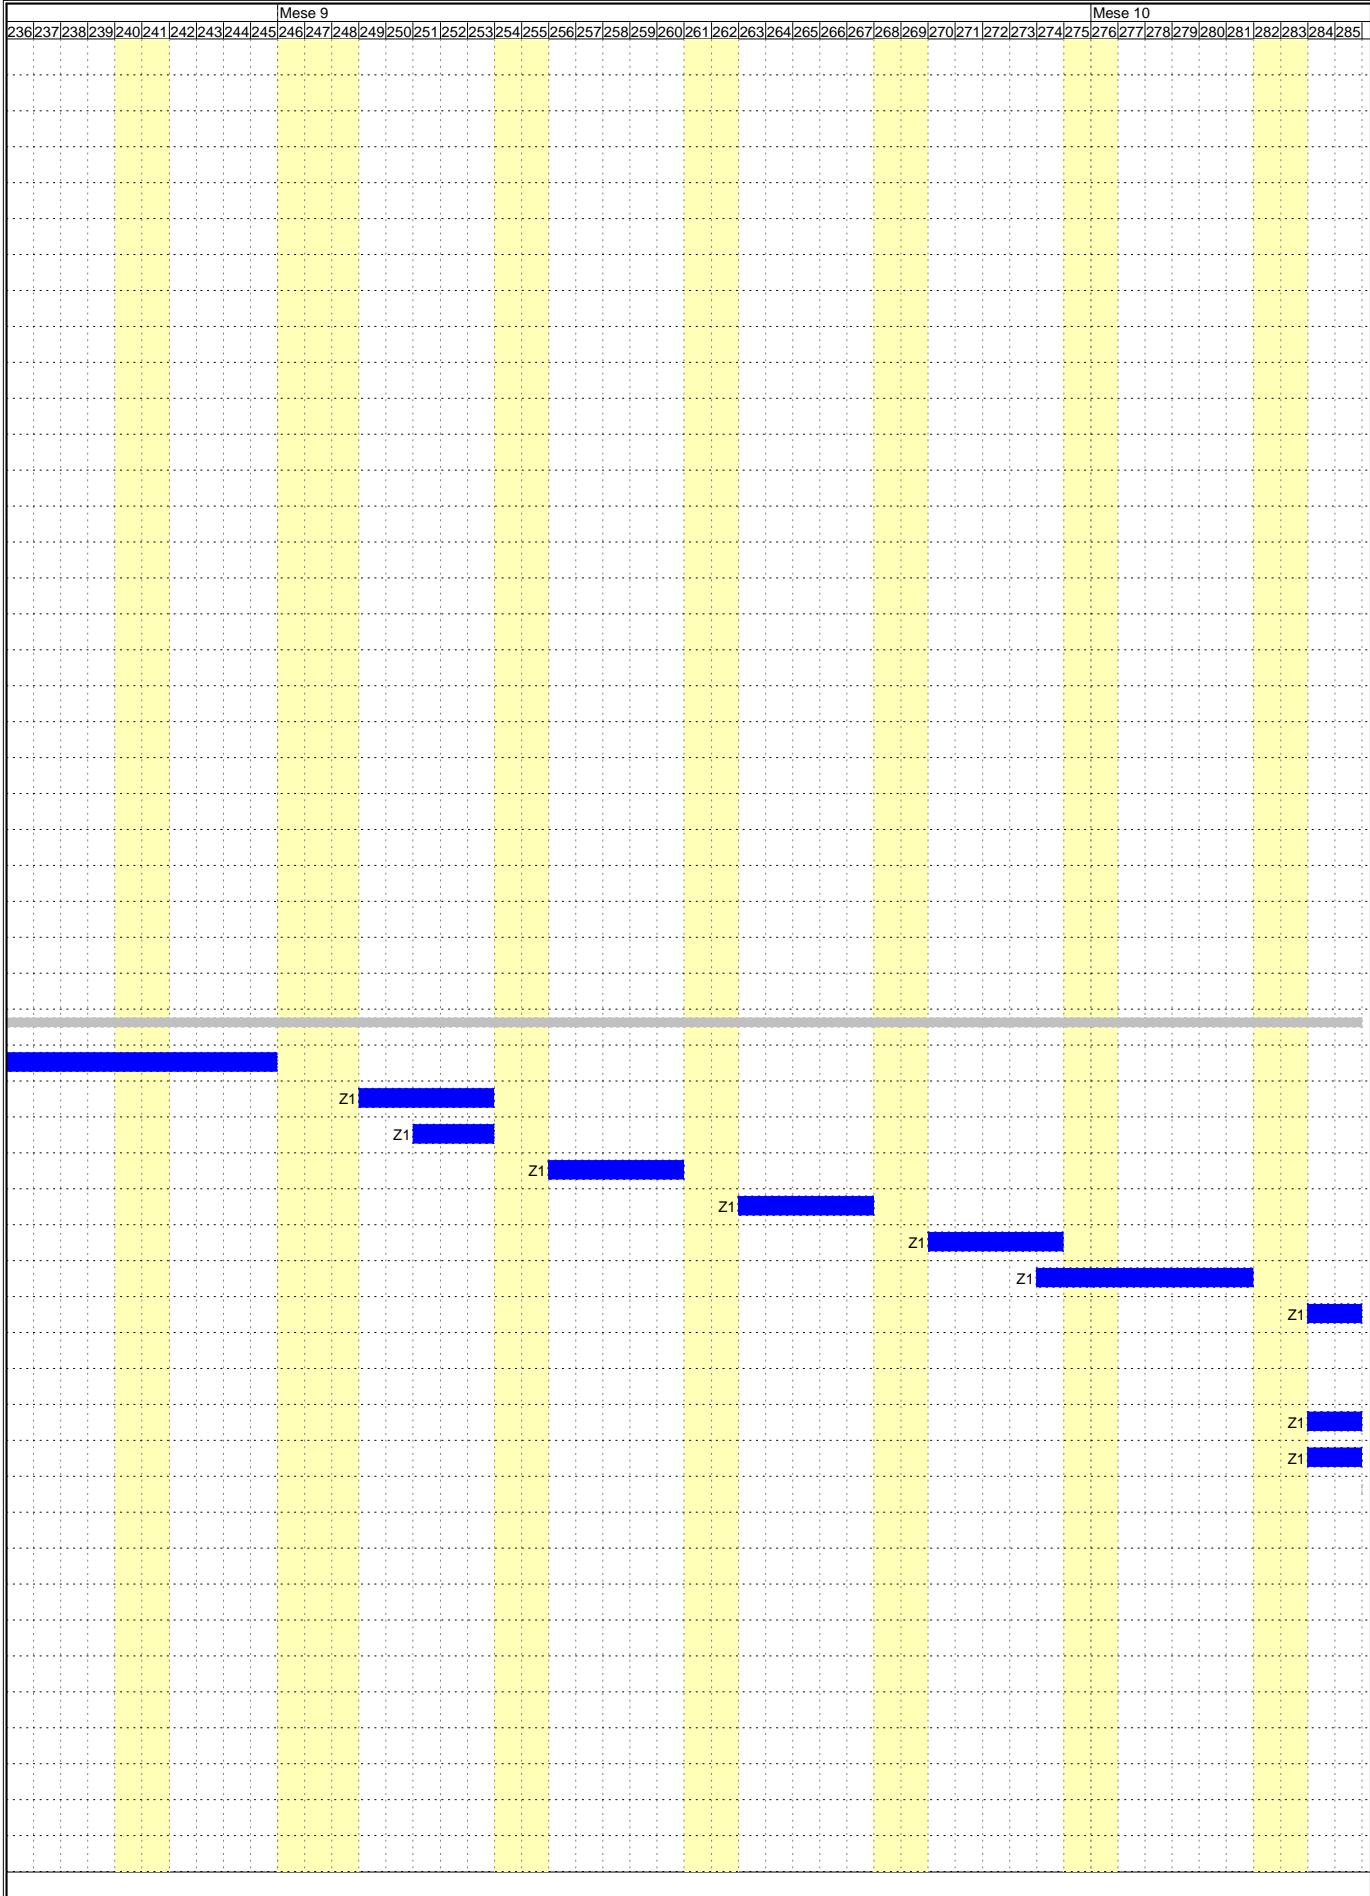


286|287|288|289|290|291|292|293|294|295|296|297|298|299|300|301|302|303|304|305|306|307|308|309|310|311|312|313|314|315|316|317|318|319|320|321|322|323|324|325|326|327|328|329|330|331|332|333|334|335

Z1

Z1


286|287|288|289|290|291|292|293|294|295|296|297|298|299|300|301|302|303|304|305|306|307|308|309|310|311|312|313|314|315|316|317|318|319|320|321|322|323|324|325|326|327|328|329|330|331|332|333|334|335

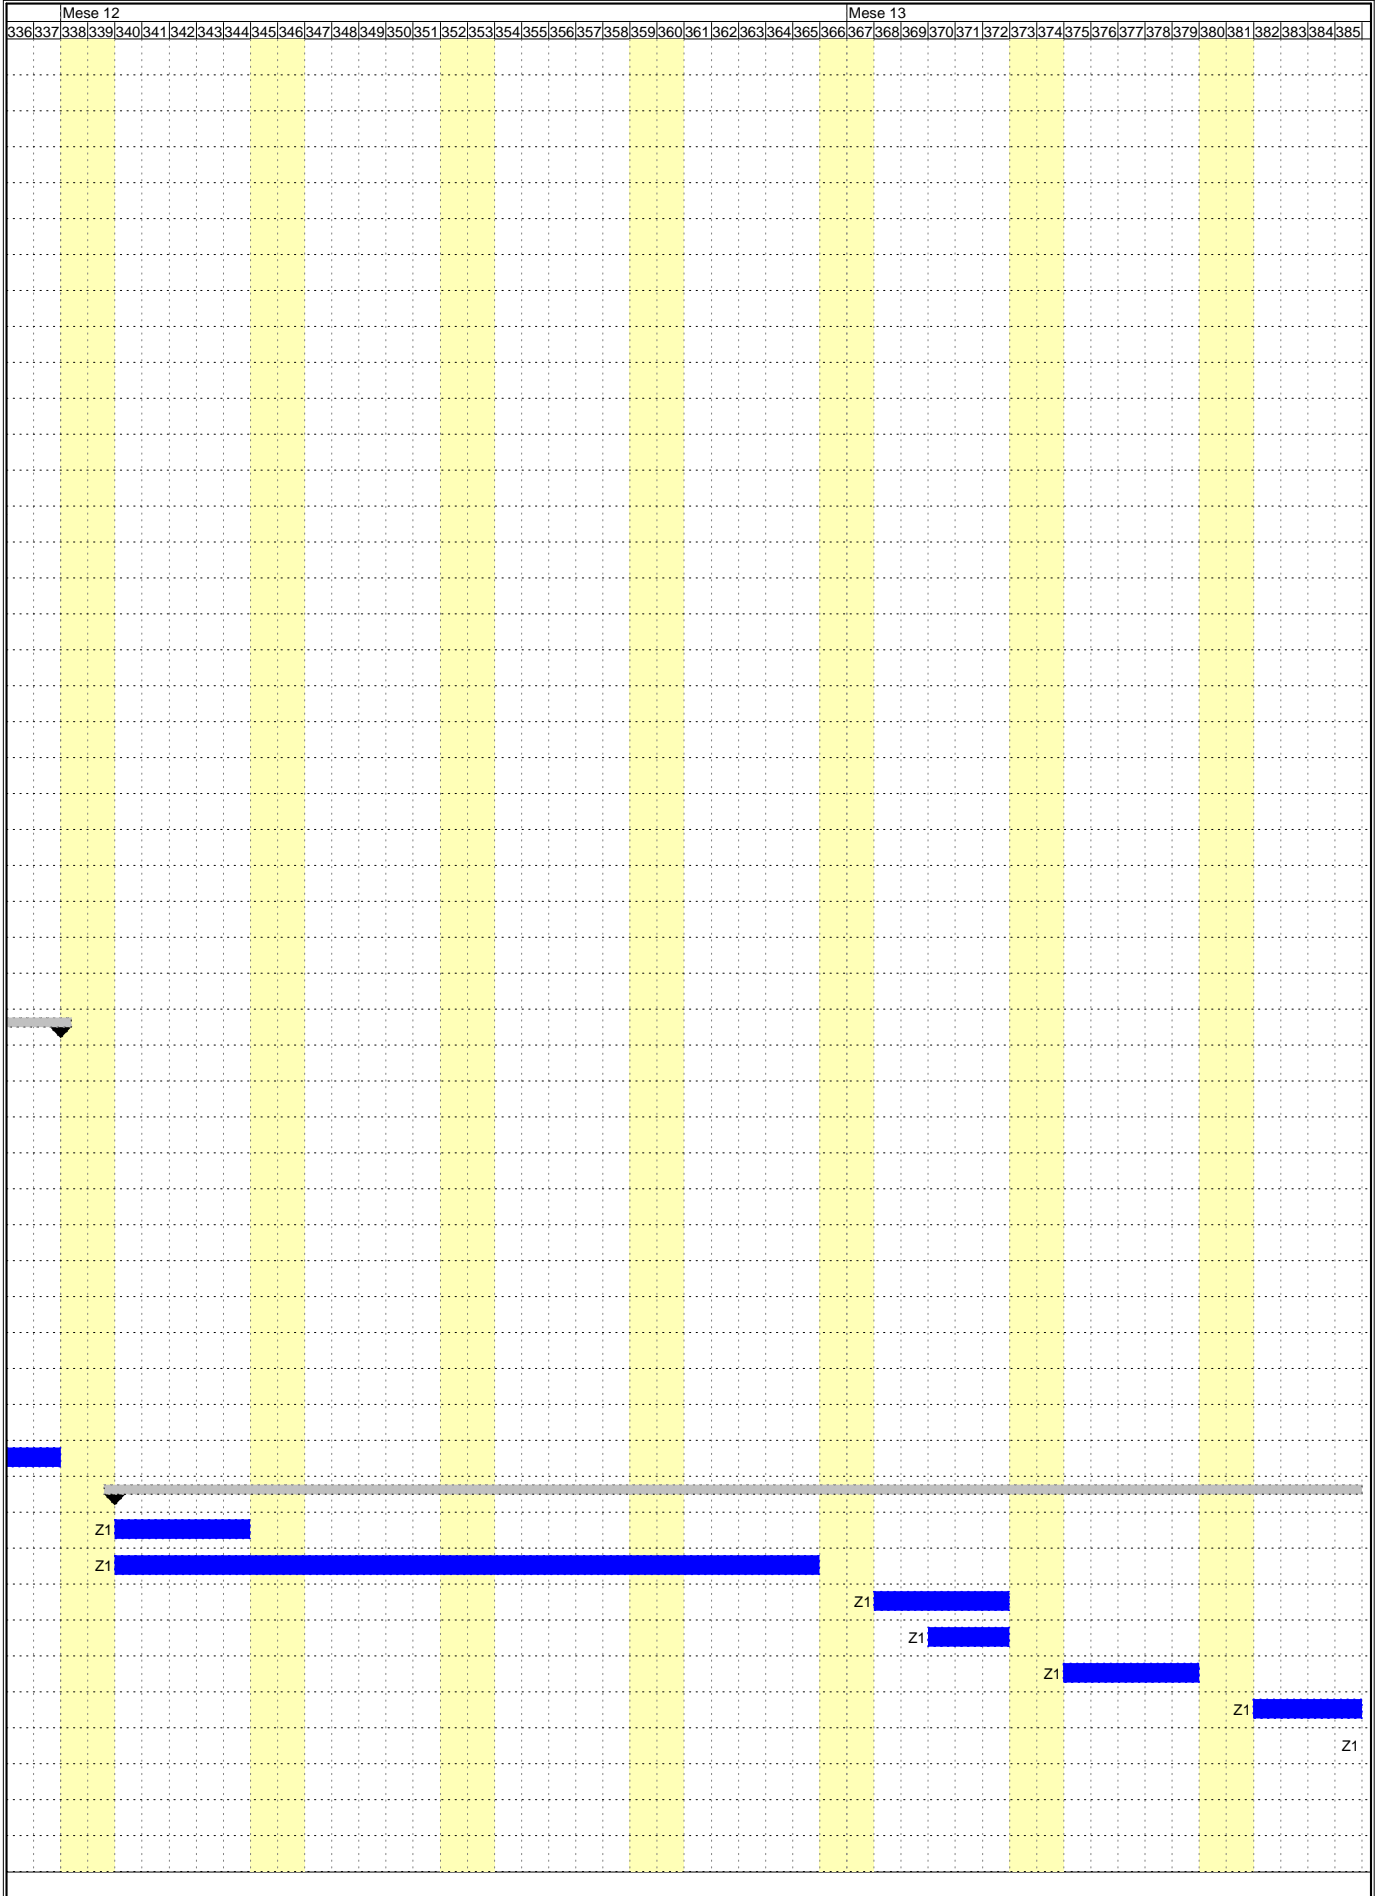

Mese 12

Mese 13

336|337|338|339|340|341|342|343|344|345|346|347|348|349|350|351|352|353|354|355|356|357|358|359|360|361|362|363|364|365|366|367|368|369|370|371|372|373|374|375|376|377|378|379|380|381|382|383|384|385

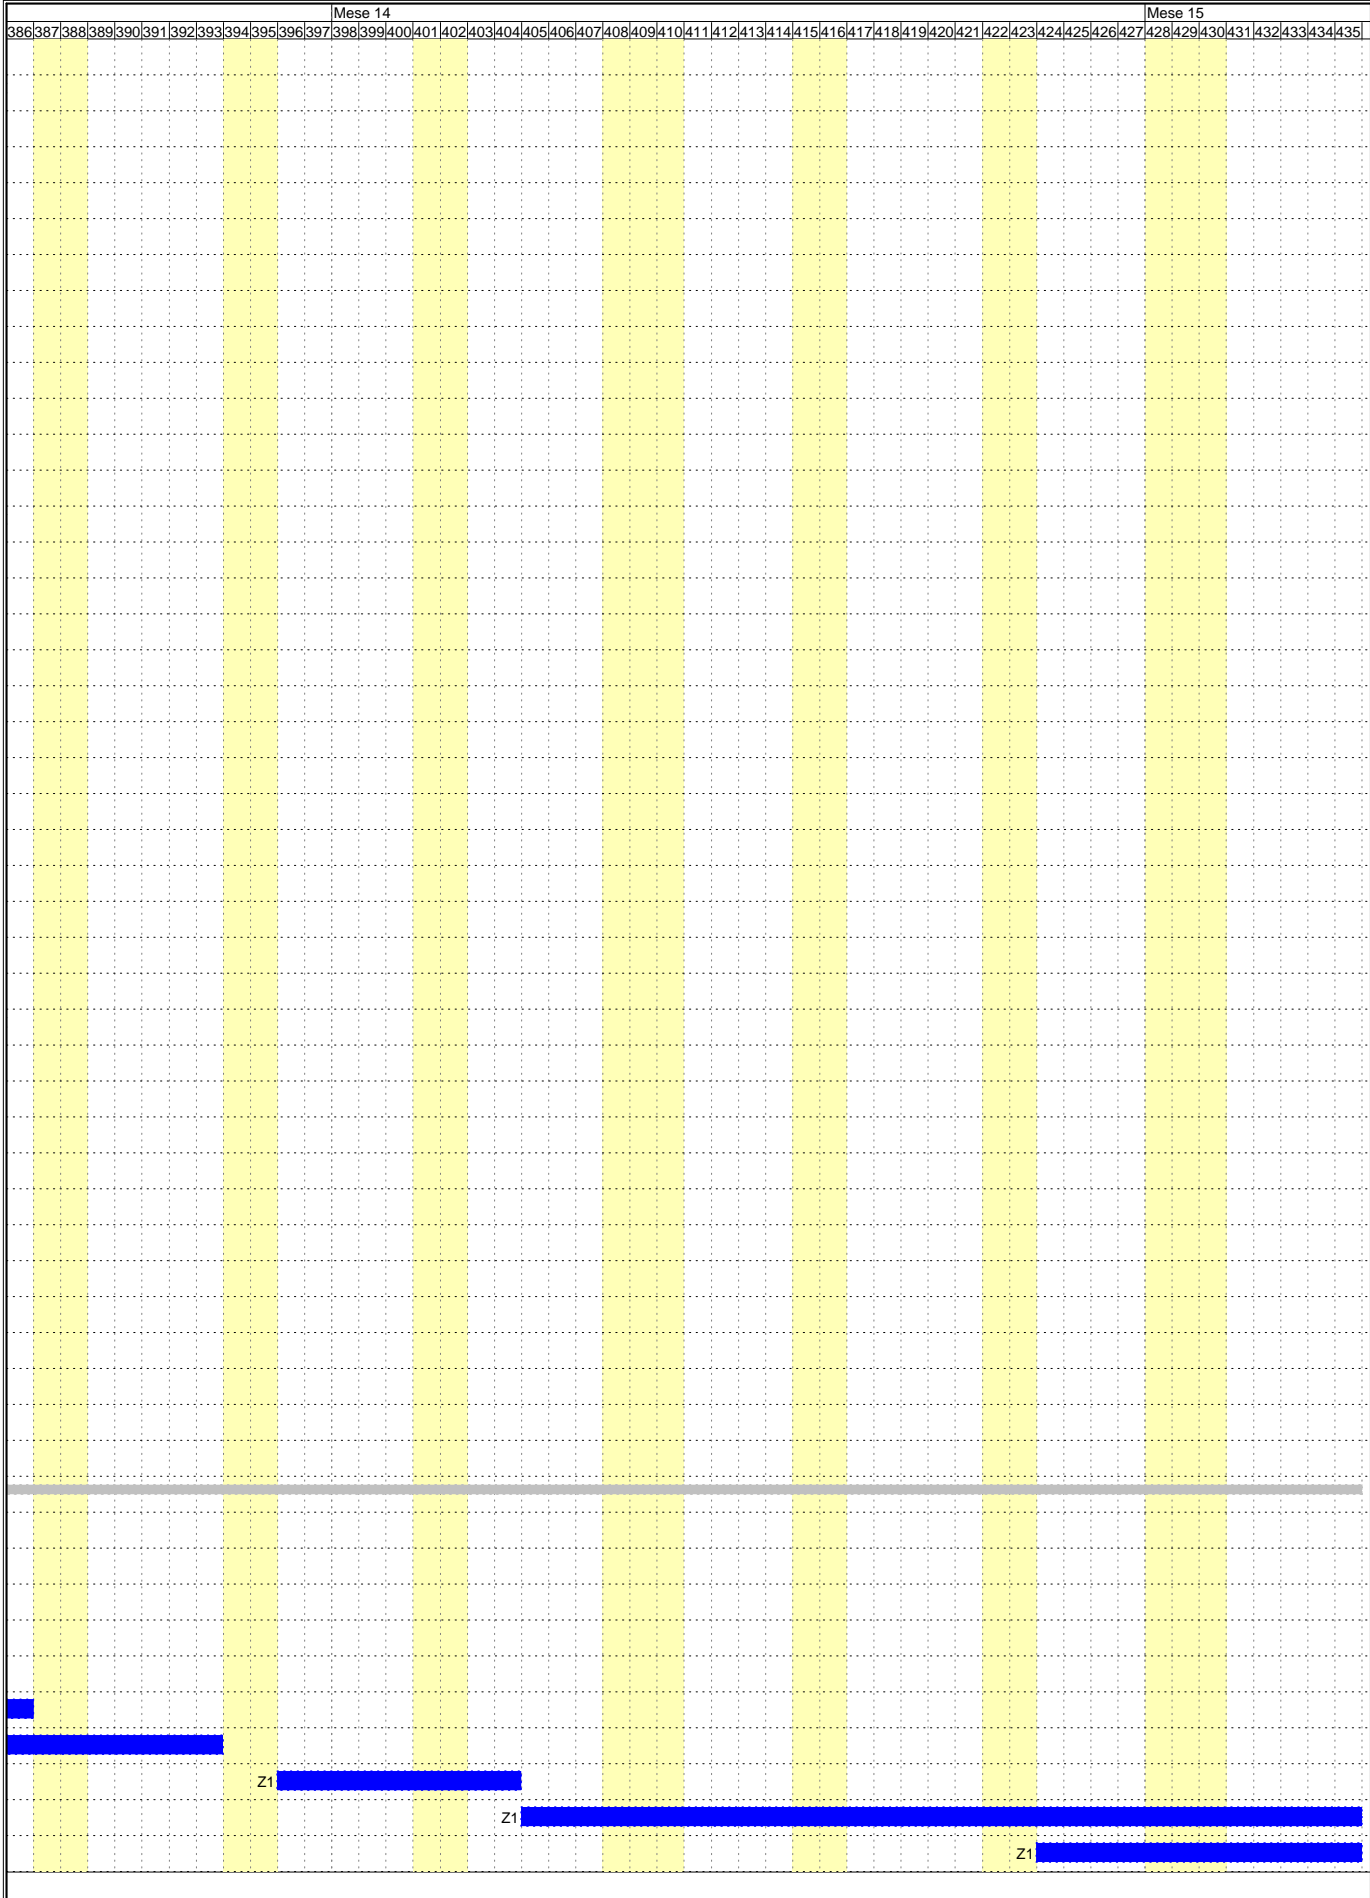


436|437|438|439|440|441|442|443|444|445|446|447|448|449|450|451|452|453|454|455|456|457|458|459|460|461|462|463|464|465|466|467|468|469|470|471|472|473|474|475|476|477|478|479|480|481|482|483|484|485



Mese 16

436|437|438|439|440|441|442|443|444|445|446|447|448|449|450|451|452|453|454|455|456|457|458|459|460|461|462|463|464|465|466|467|468|469|470|471|472|473|474|475|476|477|478|479|480|481|482|483|484|485

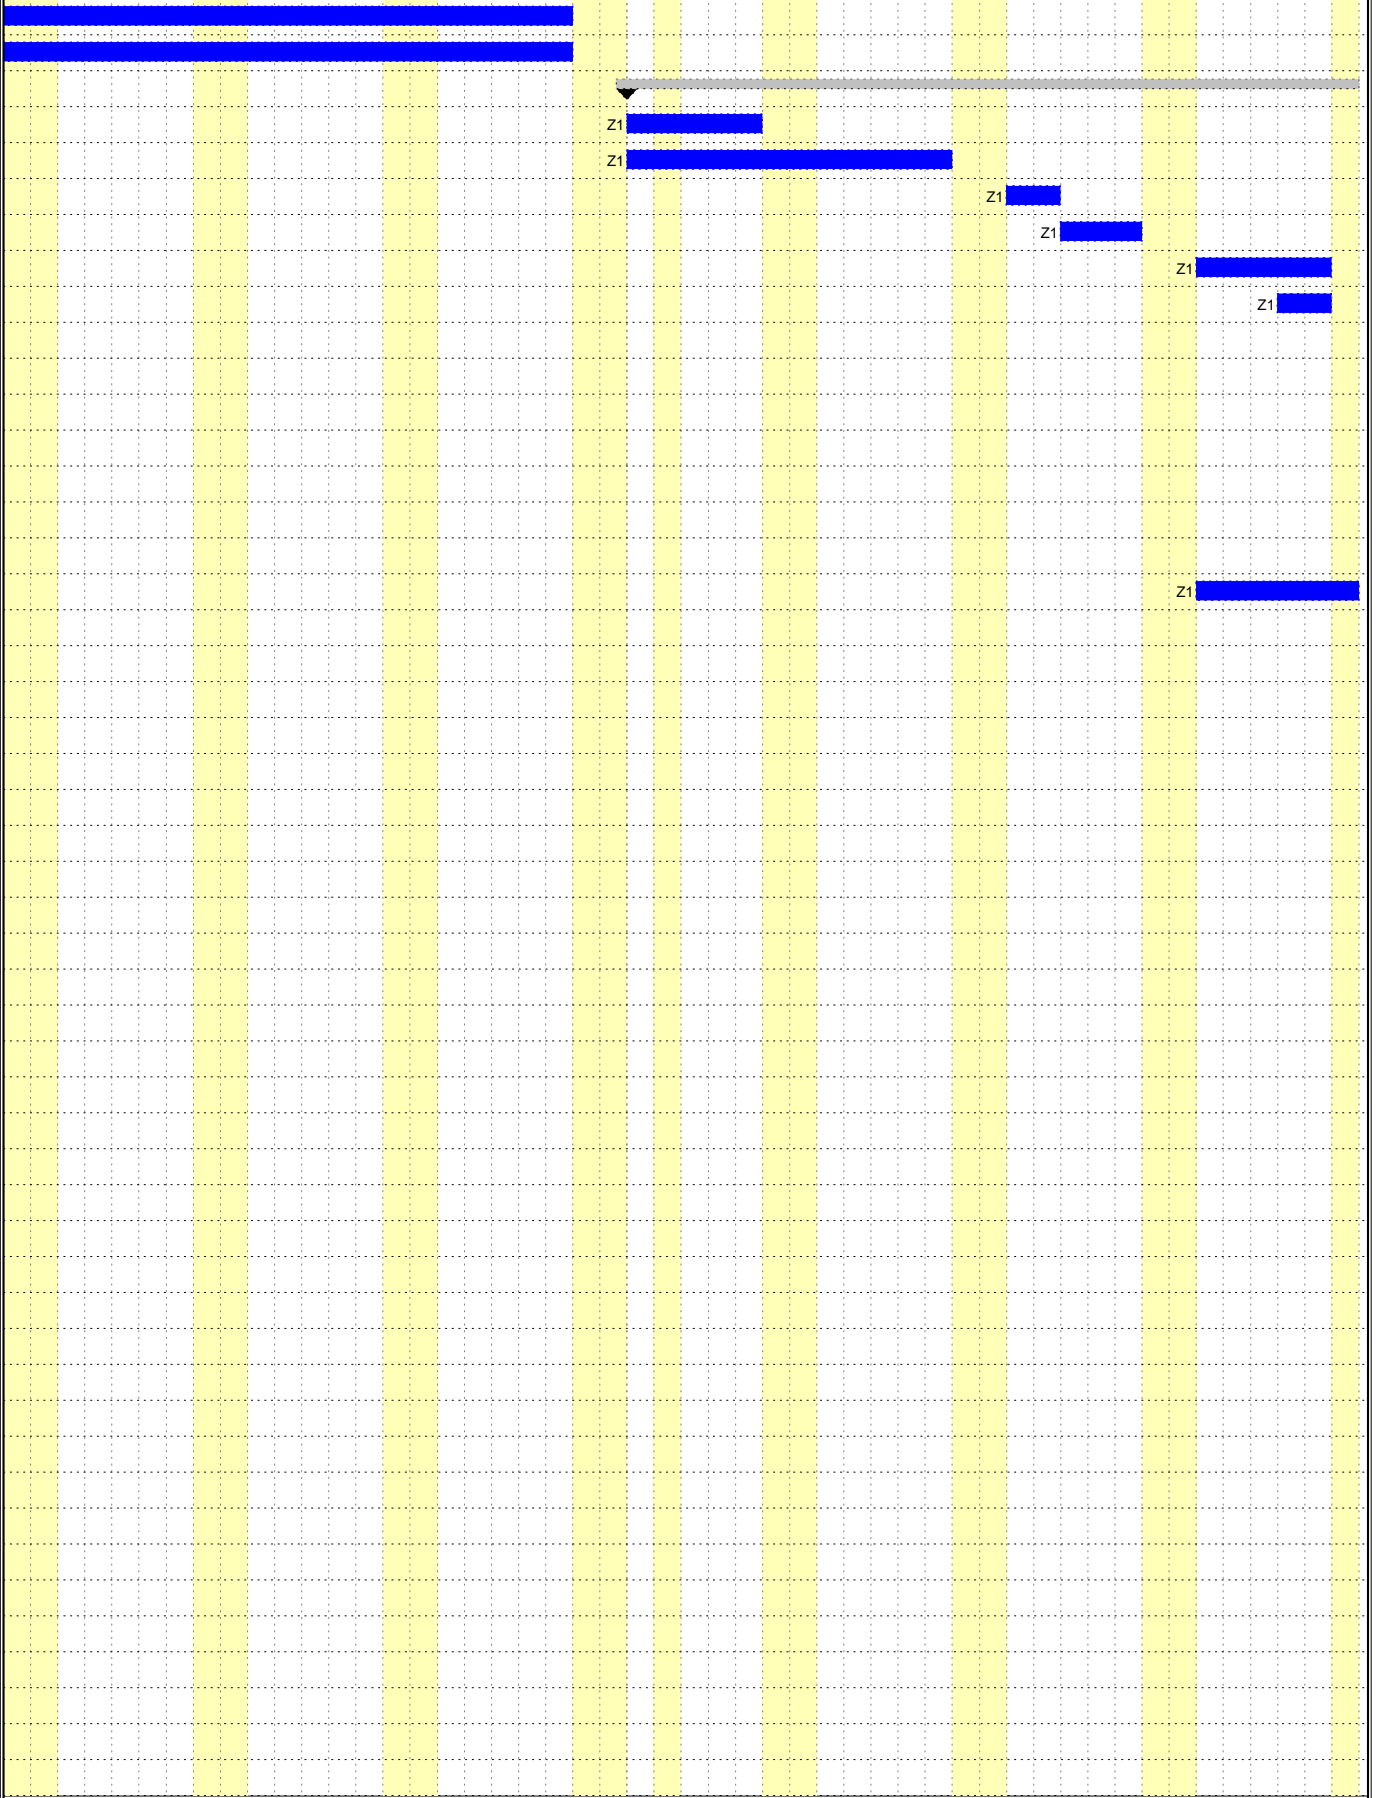

Mese 17	Mese 18
486	487
488	489
490	491
492	493
494	495
496	497
498	499
500	501
502	503
504	505
506	507
508	509
510	511
512	513
514	515
516	517
518	519
520	521
522	523
524	525
526	527
528	529
530	531
532	533
534	535

