



Data di pubblicazione: 25/10/2018

Nome allegato: GANTT CANTU'.PDF

CIG: 7638022725 (1);

Nome procedura: *Lavori di rinforzo solai e riqualificazione funzionale presso l'Agenzia territoriale INPS di Cantù, sita in via Salvo D'Acquisto 3, 22063 Cantu' (CO).*

Conferma nomina Responsabile unico del procedimento.

Autorizzazione dell'indizione di procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera c) del Dlgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., mediante Richiesta di offerta (RdO) sul Mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA), ai sensi dell'art. 36, comma 6, ultimo periodo del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.

ALLEGATO "A"

Comune di Cantù
Provincia di Como

DIAGRAMMA DI GANTT

cronoprogramma dei lavori

(Allegato XV e art. 100 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.)
(D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)

OGGETTO: Rifornimento solai e riqualificazione funzionale

COMMITTENTE: I.N.P.S. ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE.

CANTIERE: Via Salvo D'Acquisto, 3, Cantù (Como)

Milano, 02/07/2018

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA

(Perito industriale Termotecnico Dozio Egidio)

per presa visione

IL COMMITTENTE

(direttore regionale INPS della Lombardia Quattrone Giuliano)

Perito industriale Termotecnico Dozio Egidio

via Maurizio Gonzaga 4-6
20123 Milano (Milano)
Tel.: 02.8893255 - Fax: 02.8893344
E-Mail: egidio.dozio@inps.it

CerTus by Guido Cianciulli - Copyright ACCA software S.p.A.

TABELLA ANALITICA GANTT

Tabella Analitica Gantt

FASI DI LAVORO	Z	I	gg L	gg C	data Iniziale	data Finale
Realizzazione di impianto elettrico generale del cantiere	2	E	2	2	24/08/2015	25/08/2015
Delimitazione aree di cantiere per carico e scarico e zona impianti fissi	2	E	2	2	24/08/2015	25/08/2015
Rimozione di serramenti interni	4	E	4	6	26/08/2015	31/08/2015
Rimozione di apparecchi igienico sanitari	5	E	3	3	01/09/2015	03/09/2015
Rimozione di corpi scaldanti	5	E	2	4	04/09/2015	07/09/2015
Rimozione di zoccolini e manufatti in legno	4	E	2	2	08/09/2015	09/09/2015
Rimozione di impianti elettrici	5	E	4	6	10/09/2015	15/09/2015
Rimozione di impianti termici/cdz	5	E	5	7	10/09/2015	16/09/2015
Demolizione di tramezzature eseguita a mano	4	E	4	6	17/09/2015	22/09/2015
Rimozione di pavimento in ceramica e sottofondi	4	E	8	10	23/09/2015	02/10/2015
Esecuzione di tracce eseguite a mano	16	E	3	3	05/10/2015	07/10/2015
Realizzazione impianto termico	18	E	35	49	08/10/2015	25/11/2015
Formazione completa impianto idrici/igienico sanitari	7	E	10	15	26/11/2015	10/12/2015
Getto in calcestruzzo per consolidamento solaio	6	E	38	57	11/12/2015	05/02/2016
Realizzazione di pareti divisorie interne in cartongesso	3	E	15	19	08/02/2016	26/02/2016
Posa di pavimenti per interni in materie plastiche	8	E	17	23	29/02/2016	22/03/2016
Posa di pavimenti per interni in ceramica	9	E	5	8	23/03/2016	30/03/2016
Montaggio di serramenti interni	10	E	6	8	31/03/2016	07/04/2016
Posa impianto condizionamento VRV	17	E	14	19	11/04/2016	29/04/2016
Manutenzione su opere in ferro con smerigliatrice	12	E	5	5	02/05/2016	06/05/2016
Realizzazione della rete idrica e degli attacchi per impianto antincendio	13	E	2	2	09/11/2015	10/11/2015
Realizzazione di impianto elettrico/dati	19	E	53	74	09/05/2016	21/07/2016
Montaggio di serramenti interni in vetro/alluminio	14	E	10	14	22/07/2016	04/08/2016
Realizzazione controsoffitti	11	E	5	7	13/11/2015	19/11/2015
Tinteggiatura di superfici interne	15	E	7	12	05/08/2016	16/08/2016
Smobilizzo del cantiere, smontaggio ponteggi e ascensore meccanico esterno, pulizia generale	2	E	3	5	18/08/2016	22/08/2016

LEGENDA:

Z = ZONA

Elenco delle Zone attribuite alle Fasi del Programma Lavori:

1) = ZONA UNICA

2) = ALLESTIMENTO CANTIERE

3) = Opere murarie costruzioni

4) = Demolizioni

5) = Rimozione impianti

6) = Gesso consolidamento e maturazione

7) = Impianti idrico sanitario antincendio

8) = posa pavimentazione in gomma

9) = posa pavimentazione in ceramica

- 10) = Serramenti interni
- 11) = Controsoffitti
- 12) = Opere su ferro
- 13) = Linea idrica antincendio
- 14) = Divisori interni vetro/alluminio
- 15) = Tinteggiature
- 16) = Esecuzione tracce
- 17) = Impianto cdz VRV
- 18) = Impianto riscaldamento
- 19) = Impianto elettrico/dati


I = IMPRESA

Elenco delle Imprese presenti nel Programma Lavori:


E <Nessuna impresa definita>

gg C = DURATA, espressa in giorni naturali e consecutivi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro


gg L = DURATA, espressa in giorni lavorativi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro

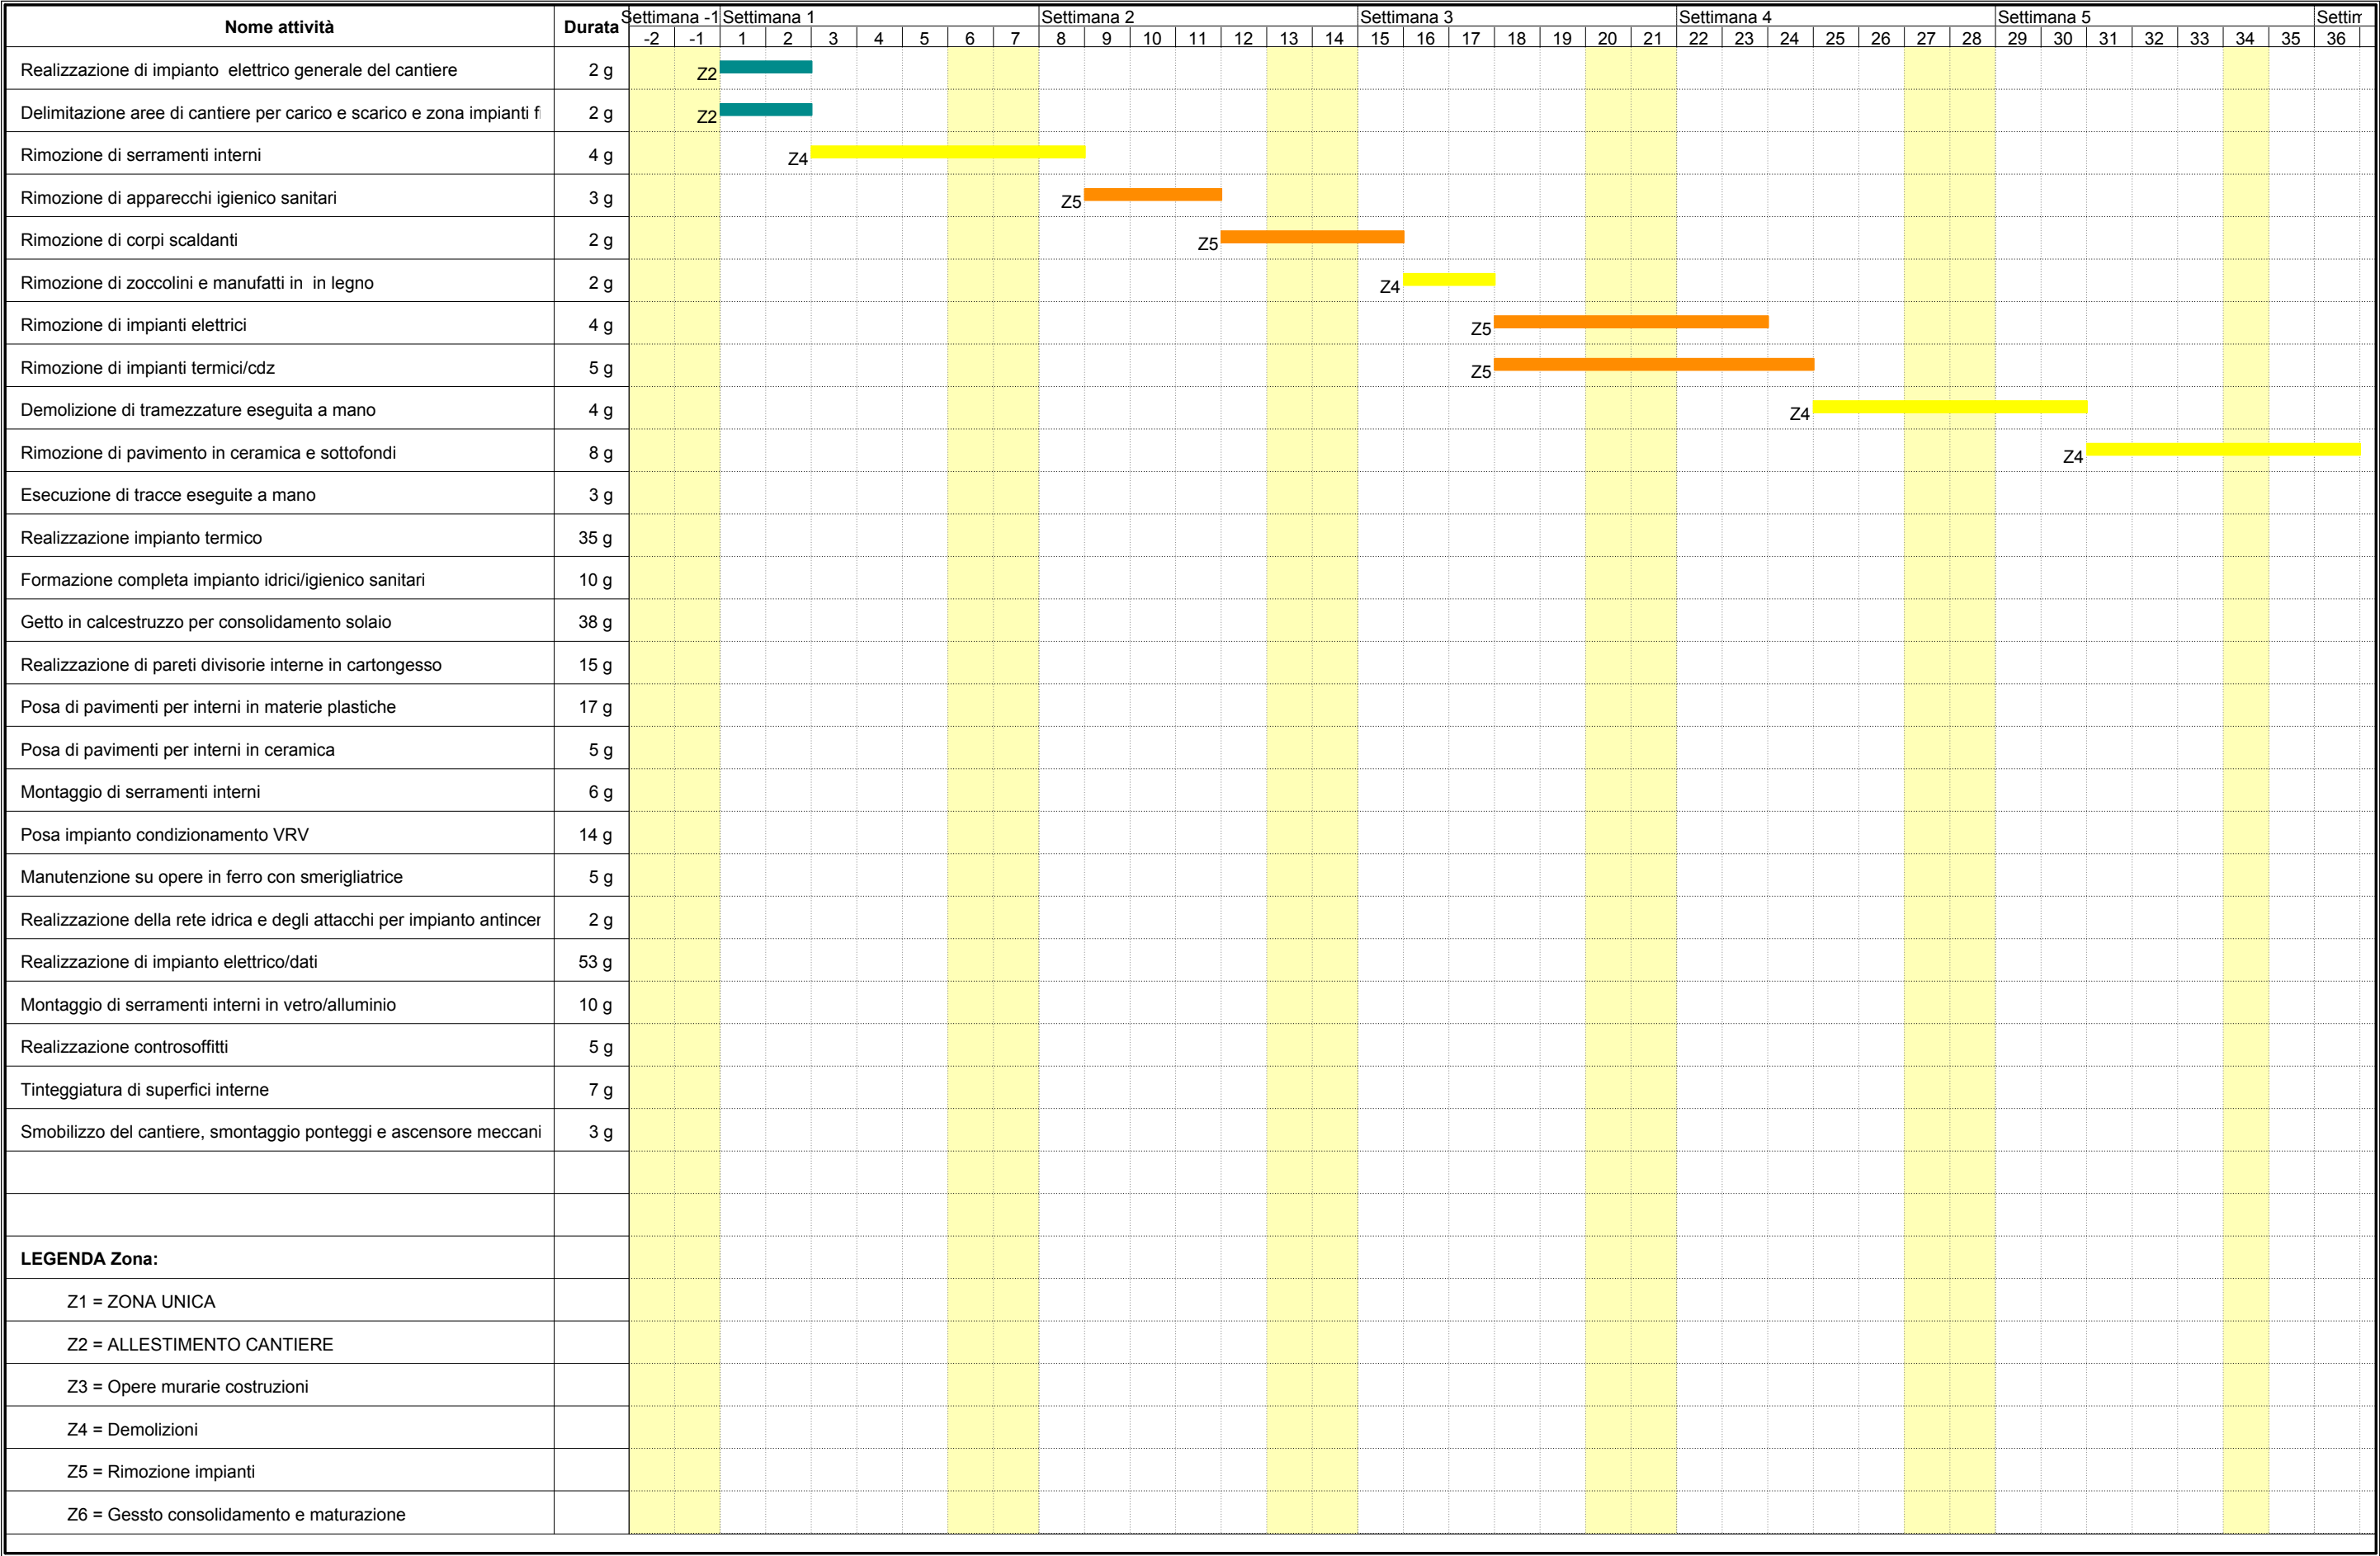

[illegible]

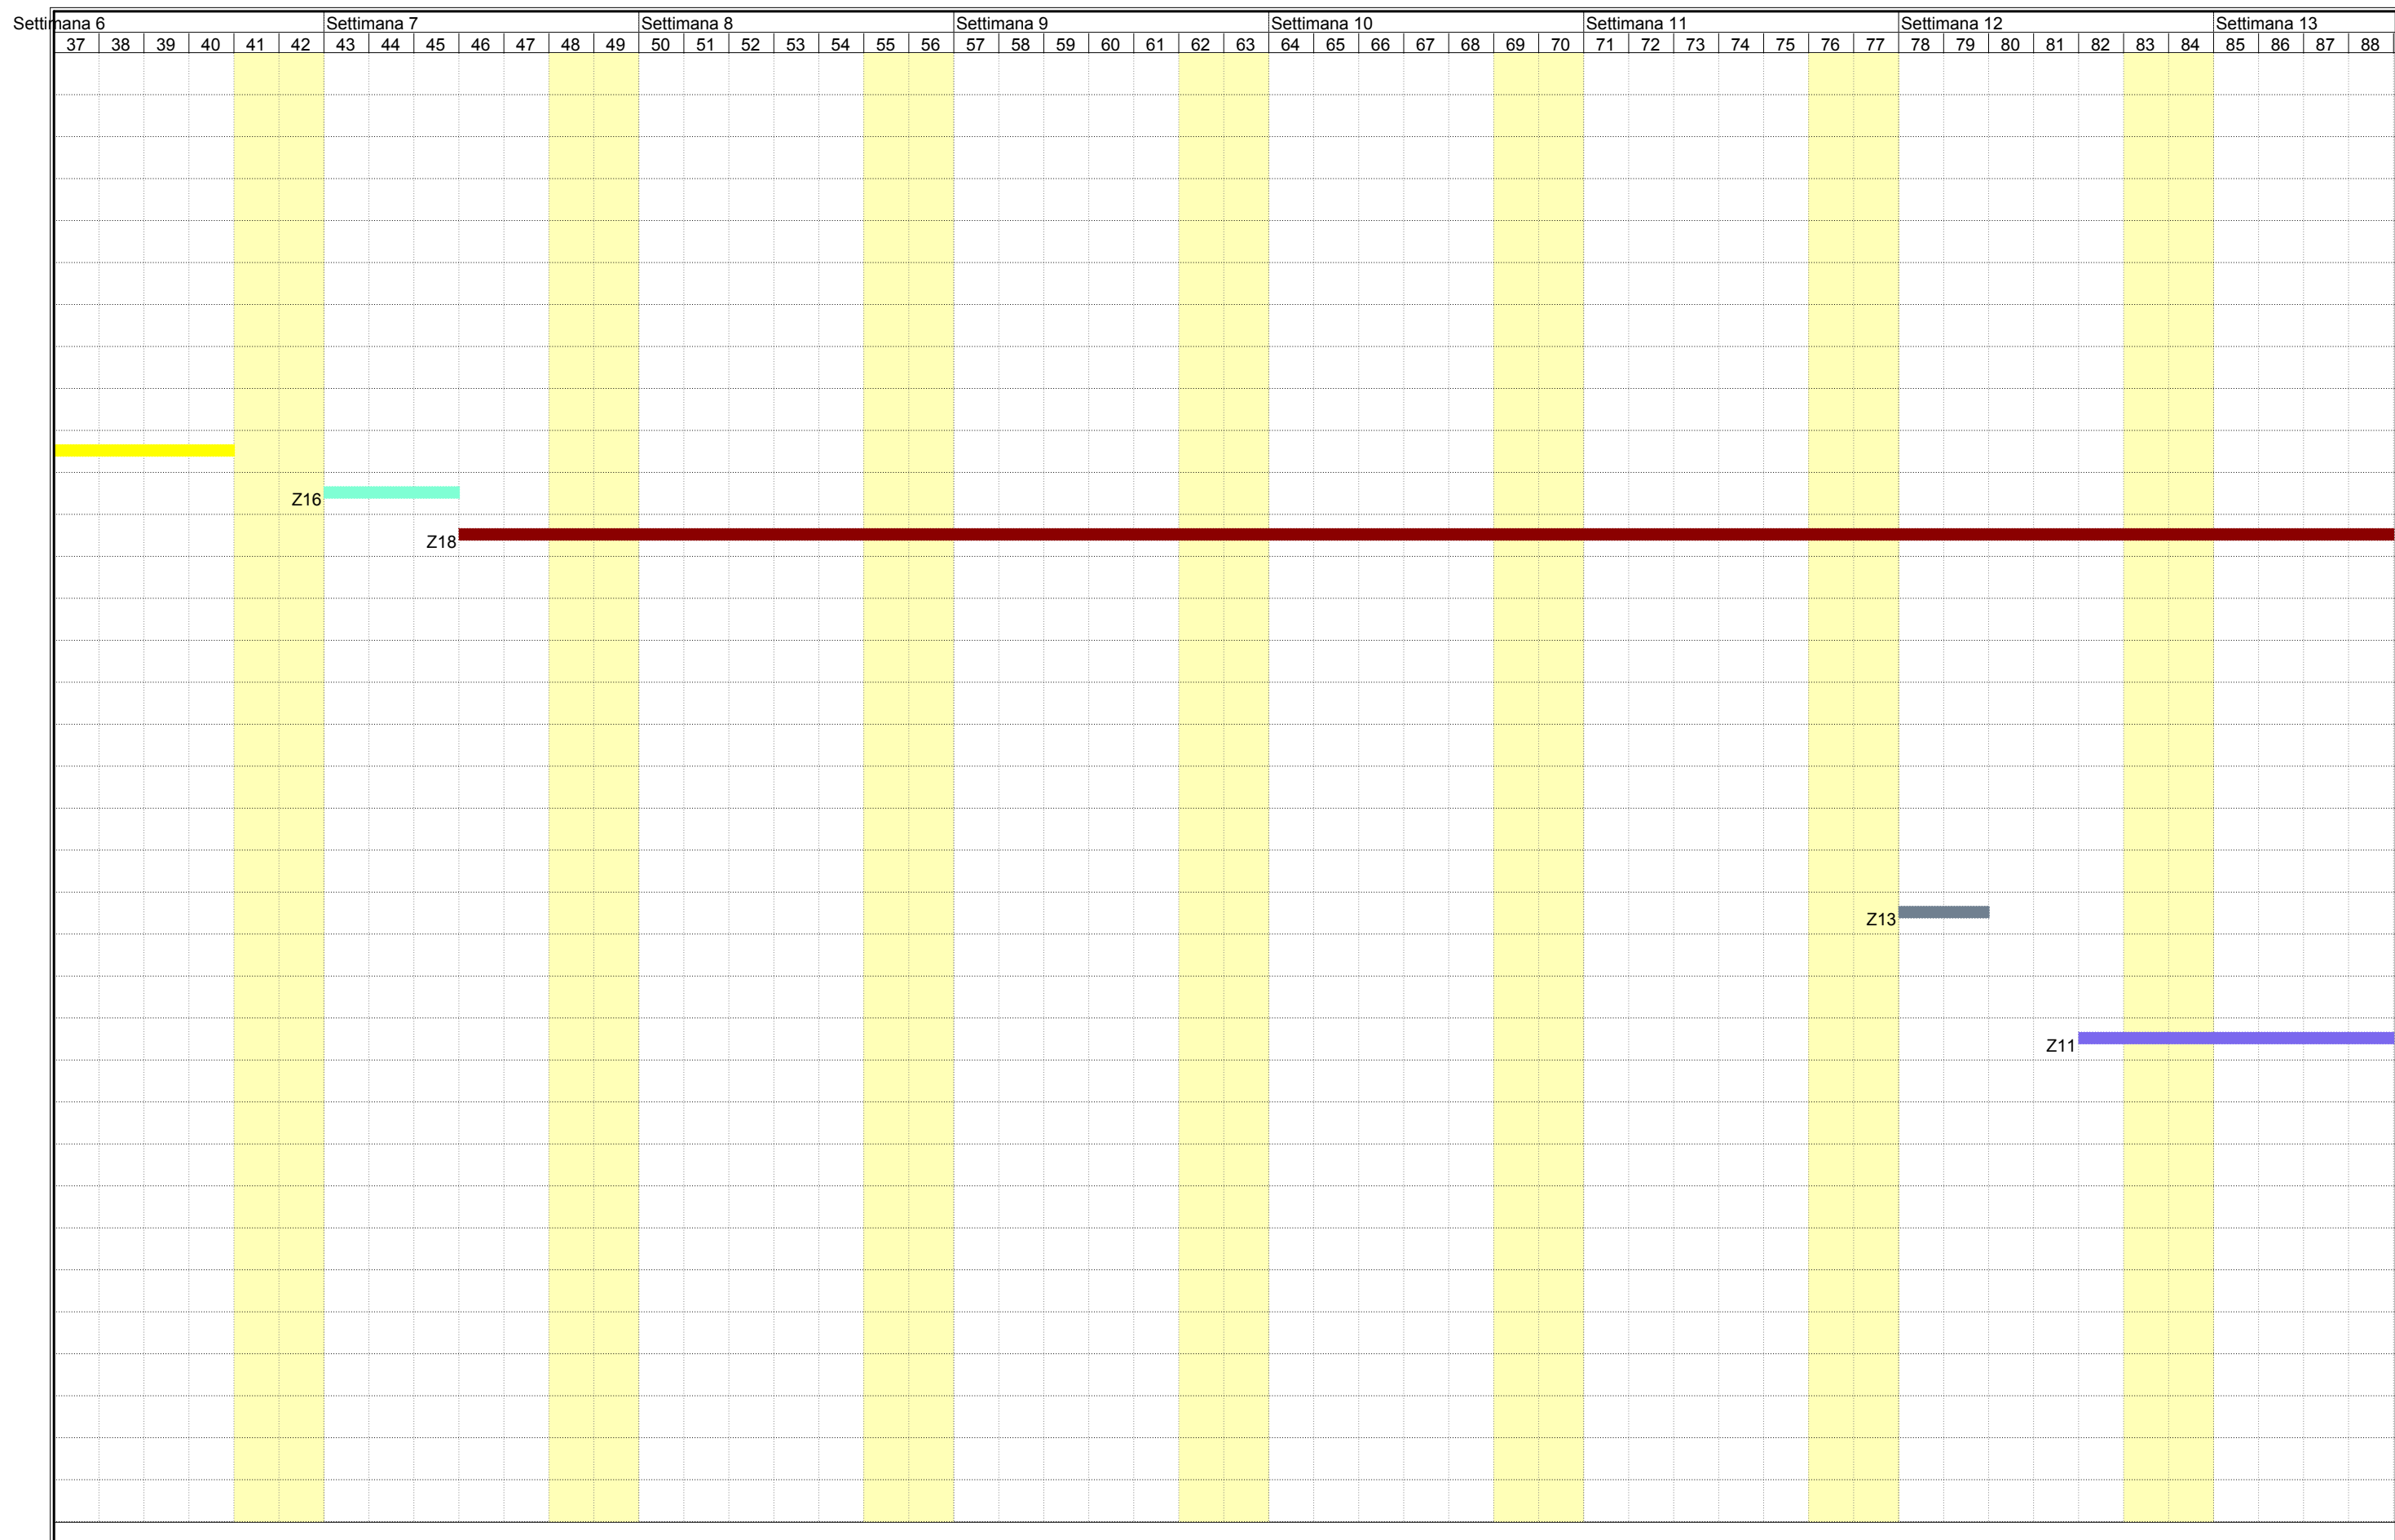



[illegible]

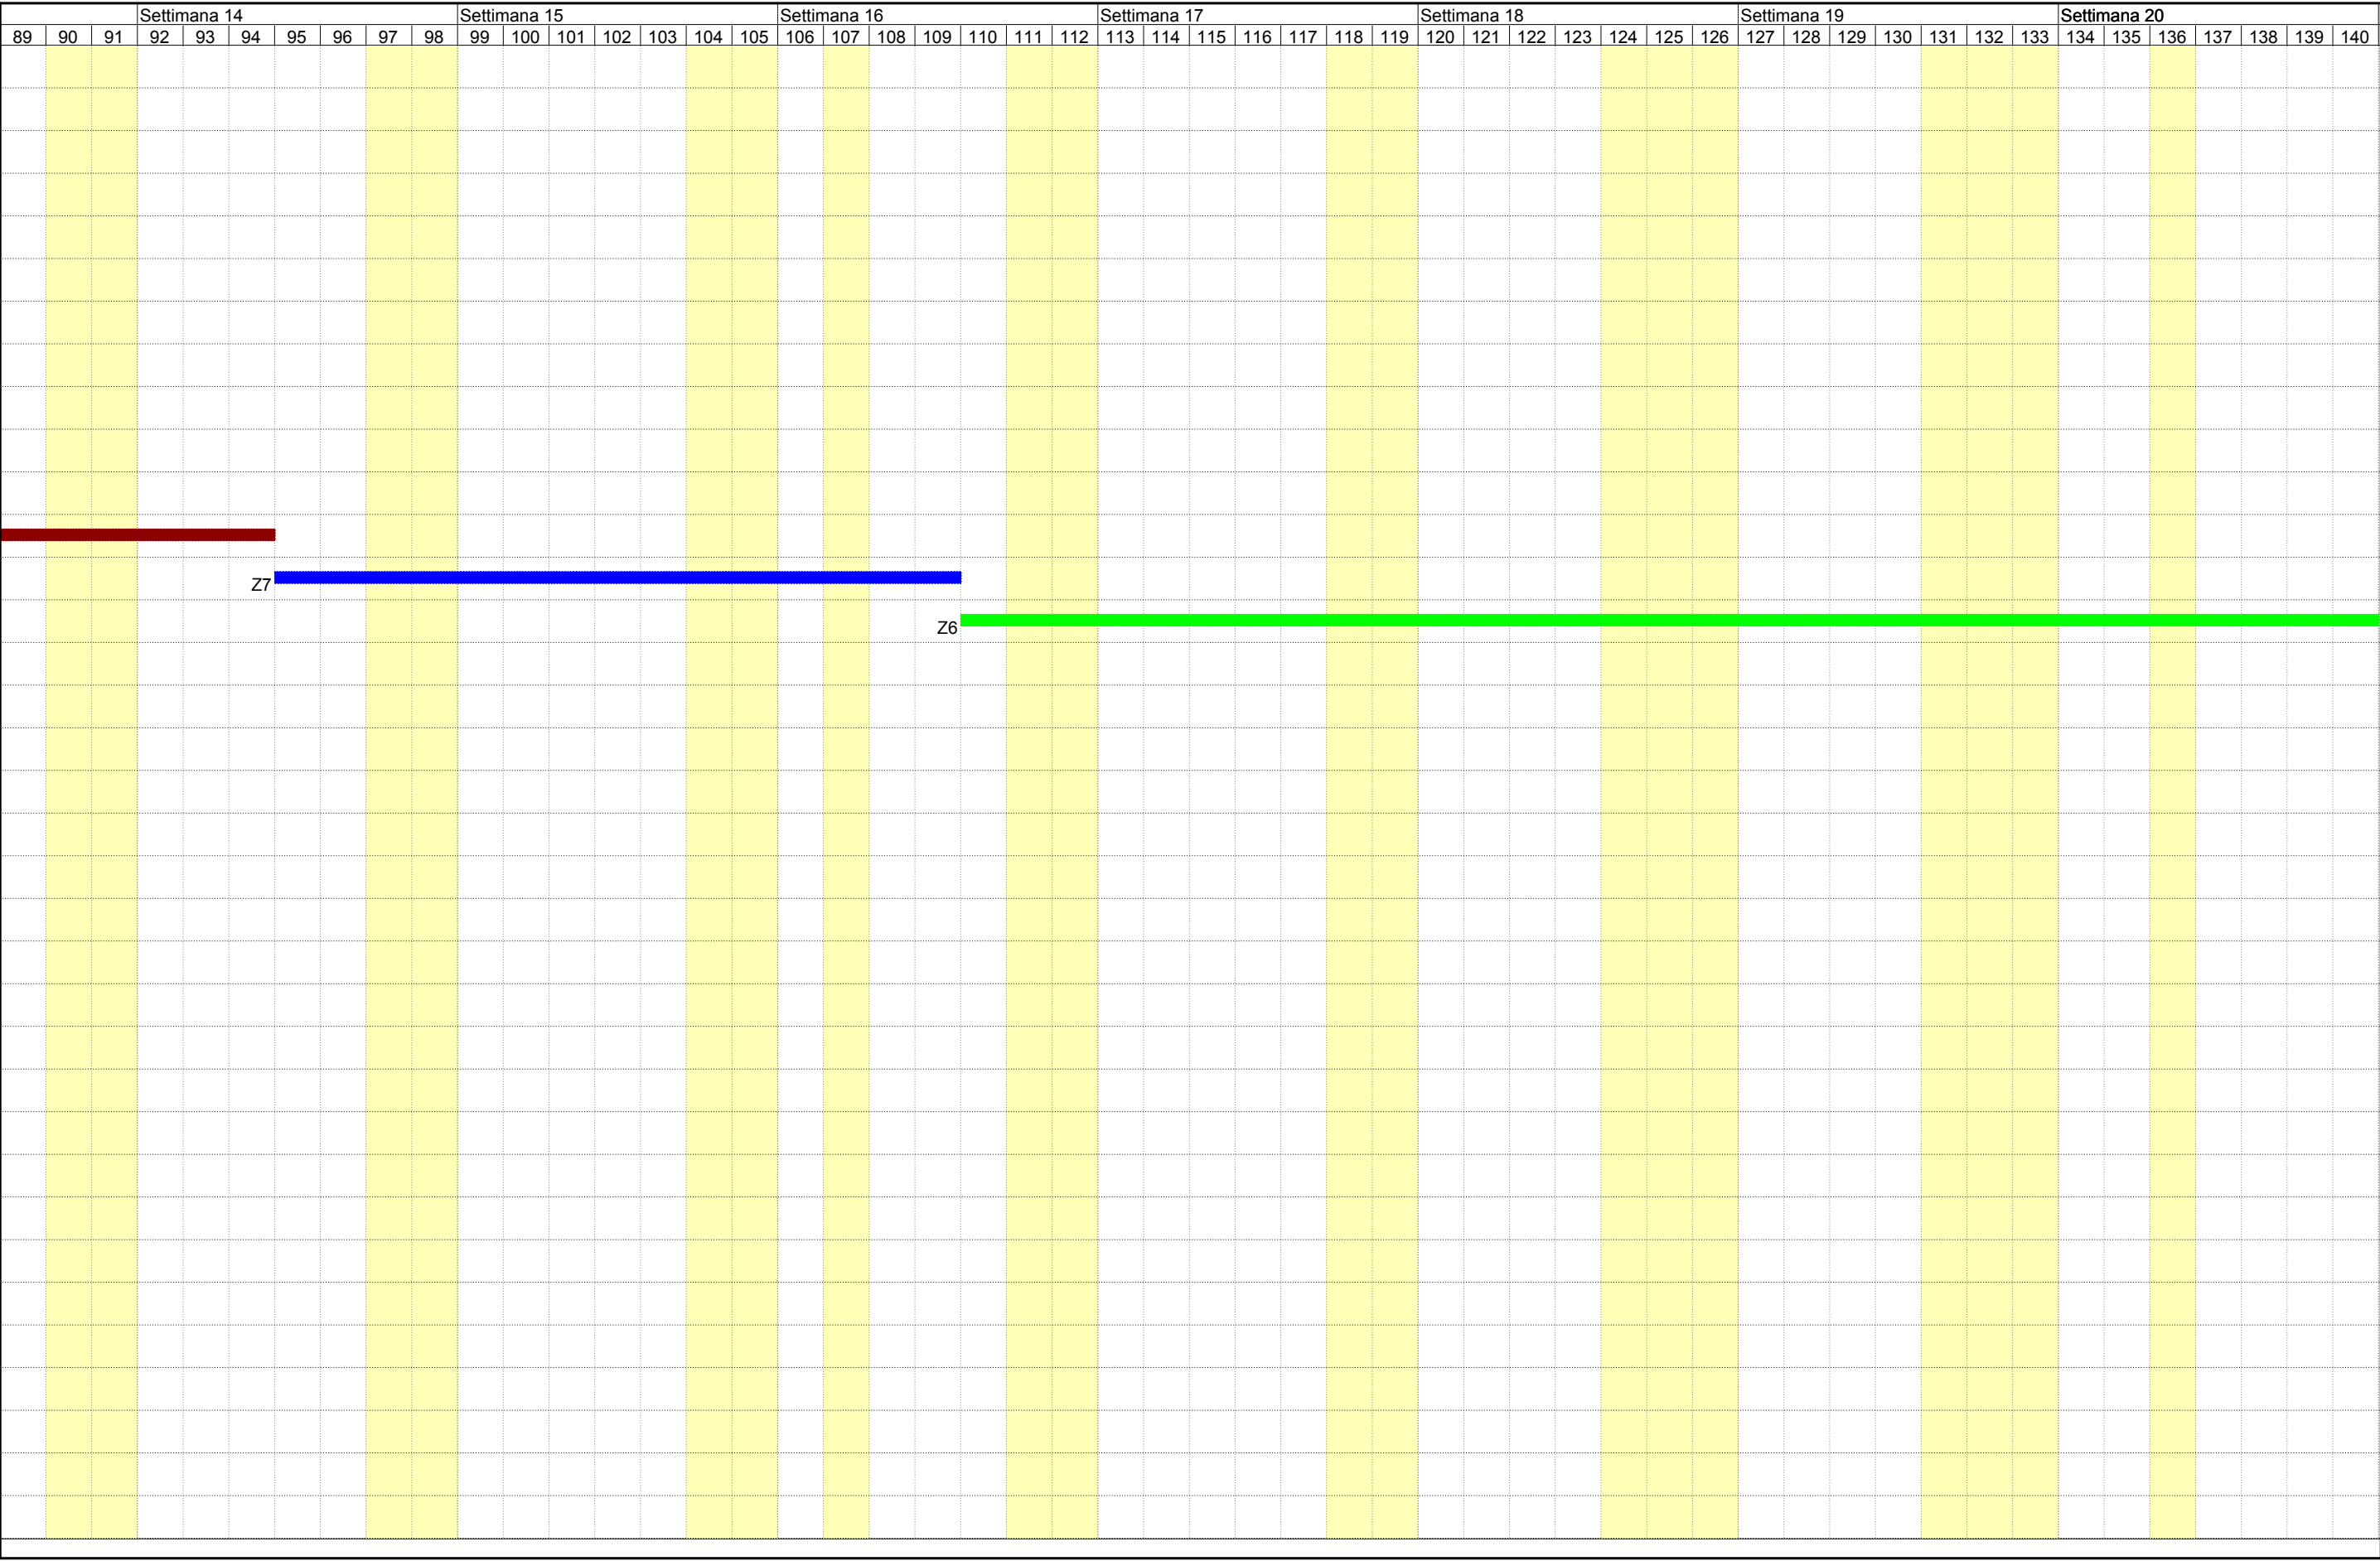

[illegible]

[illegible]

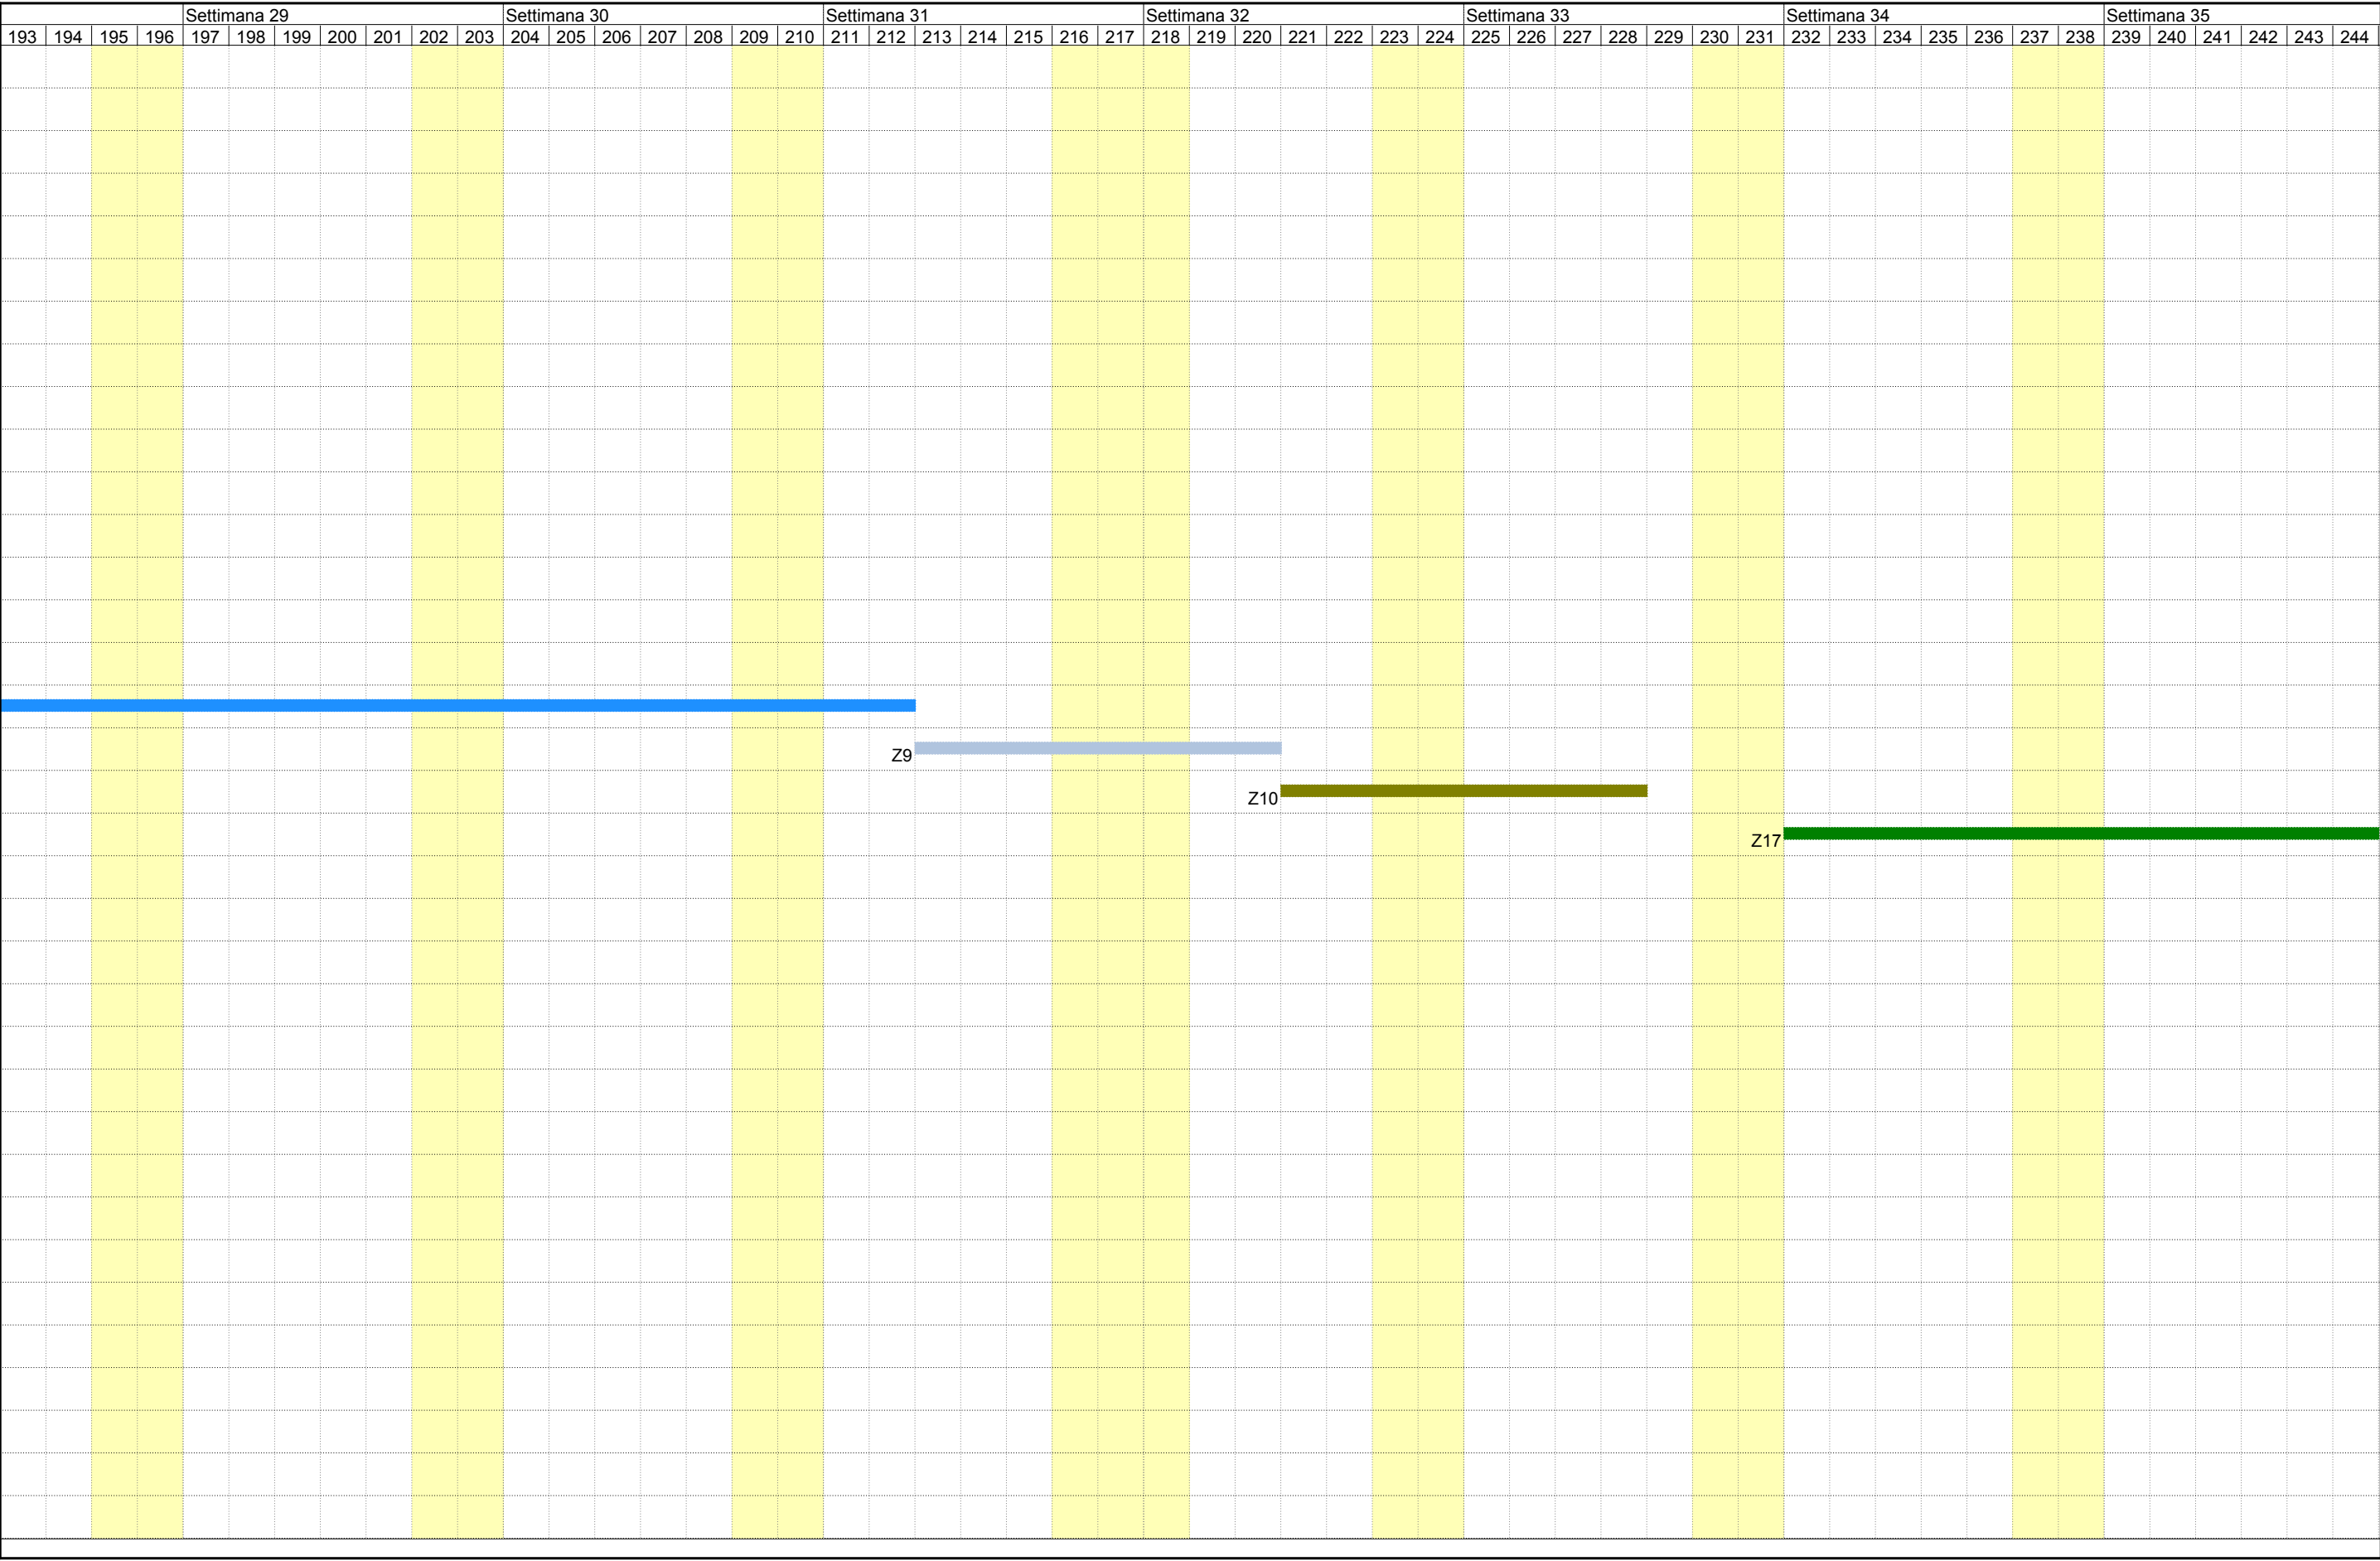

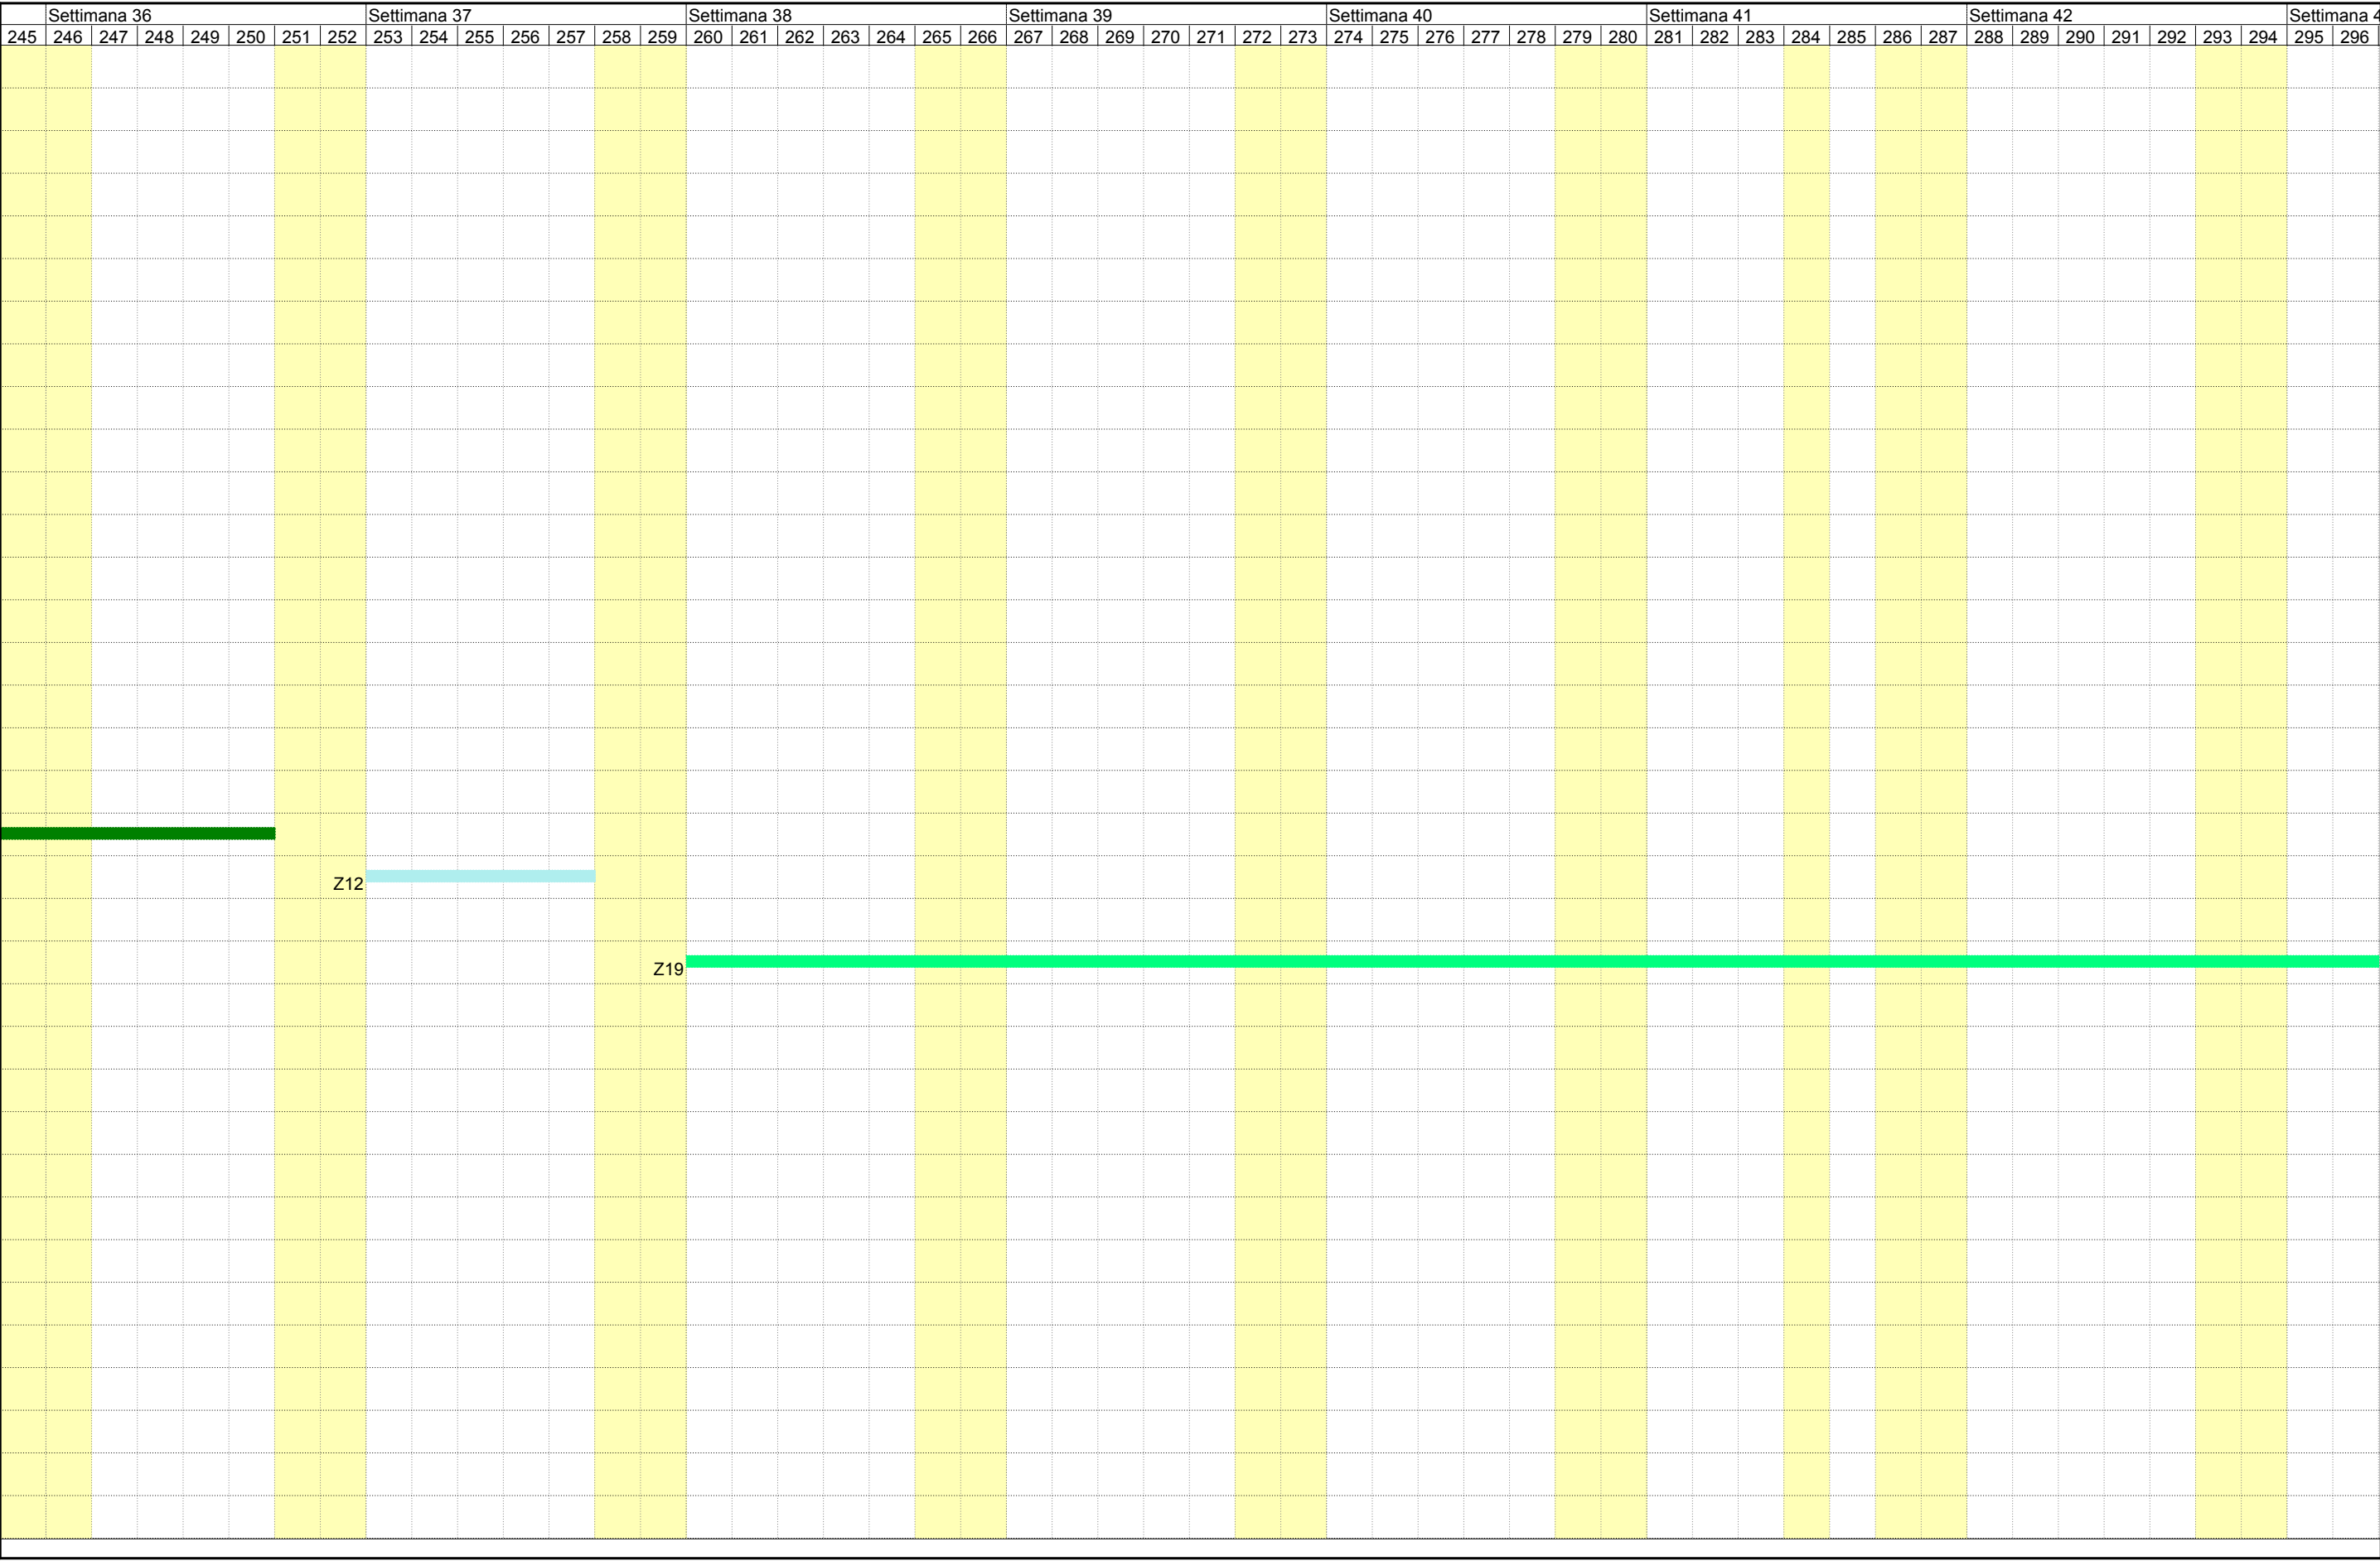

[illegible]

[illegible]

[illegible]

