

Diagramma di Gantt



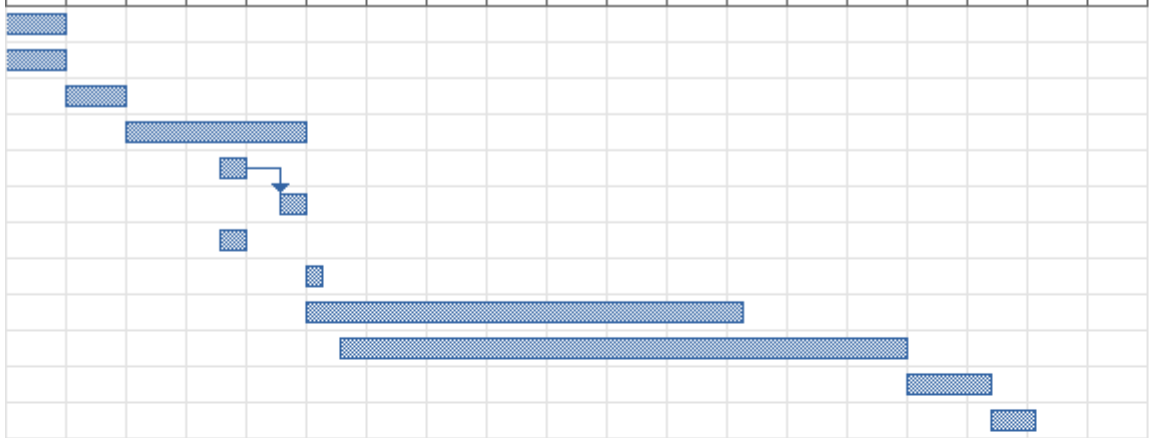
Comune di
Roma

Provincia di
Rm

Committente
**Dott. Vincenzo DAMATO della D.C. Risorse
Strumentali I.N.P.S.**

Cantiere
INPS Sostituzione gruppi frigo

Lavorazione	Durata	Data inizio	Data fine	Impresa	
					24...
■ 1 - Formazione di recinzione di cantiere.	7,00	01 12 14 00:00:00	08 12 14 00:00:00		
■ 2 - Allestimento impianto elettrico di canti...	7,00	01 12 14 00:00:00	08 12 14 00:00:00		
■ 3 - Recupero dei Gas refrigeranti su tutti...	7,00	08 12 14 00:00:00	15 12 14 00:00:00		
■ 4 - Rimozione tubazioni (scarichi, gomiti, ...	21,00	15 12 14 00:00:00	05 01 15 00:00:00		
■ 5 - Rimozione e tiro in basso degli otto v...	3,00	26 12 14 00:00:00	29 12 14 00:00:00		
■ 6 - Sollevamento dal piano stradale e fin...	3,00	02 01 15 00:00:00	05 01 15 00:00:00		
■ 7 - Trasporto in basso con autogru' dei ...	3,00	26 12 14 00:00:00	29 12 14 00:00:00		
■ 8 - Rimozione area cantiere nell'area ogg...	2,00	05 01 15 00:00:00	07 01 15 00:00:00		
■ 9 - Installazione nuove tubazioni (scarich...	51,00	05 01 15 00:00:00	25 02 15 00:00:00		
■ 10 - Sostituzione degli apparati di regolazi...	66,00	09 01 15 00:00:00	16 03 15 00:00:00		
■ 11 - Esecuzione prove di funzionalità.	10,00	16 03 15 00:00:00	26 03 15 00:00:00		
■ 12 - Rimozione impianto di cantiere all'ott...	5,00	26 03 15 00:00:00	31 03 15 00:00:00		
Data Inizio Lavori					
Data Fine Lavori					
Durata Lavori					
Uomini/giorno					0,00
Uomini/giorno Progressivo					0,00

Dic				Gen				Feb				Mar							
1/12	8/12	15...	22...	29...	5/1	12/1	19/1	26/1	2/2	9/2	16/2	23/2	2/3	9/3	16/3	23/3	30/3	6/4	
																			
															1/12/2014				
															31/3/2015				
															120,0				
				324,00				328,00				296,00				152,00			
				324,00				652,00				948,00				1.100,00			
