

ALLEGATO "A"

Comune di Arezzo
Provincia di AR

DIAGRAMMA DI GANTT Cronoprogramma dei lavori

(Allegato XV e art. 100 del D.Lgs 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i - D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)

OGGETTO: Procedura aperta per l'appalto di sola esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria per opere edili ed impianti elettrici a rilevante complessità tecnica/ esecutiva s.i.o.s e di climatizzazione, da eseguire al piano 4° dello stabile di proprietà dell'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale (I.N.P.S.) adibito a Sede Provinciale di Arezzo - Viale Luca Signorelli, n° 20 – 52100 Arezzo. CIG 6796613679

COMMITTENTE: INPS - Direzione Regionale Toscana

CANTIERE: Viale Luca Signorelli, n° 20, Arezzo (AR)

Arezzo, 15/09/2016


IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA
(Geometra Inps - UTR Toscana PAGGINI Roberto)


per presa visione
IL COMMITTENTE
(Dirigente Regionale Sardi Dott. Paolo)


Geometra Inps - UTR Toscana PAGGINI Roberto



Nome attività	Durata	Settimana -1		Settimana 1						
		-2	-1	1	2	3	4	5	6	7
Allestimento del cantiere	11 g			▼						
Realizzazione della recinzione, area ed accessi al cantiere	3 g		Z1	█						
Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e	1 g					Z1	█			
Realizzazione di impianto elettrico del cantiere	1 g						Z1	█		
Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere	1 g								Z1	
Realizzazione di impianto idrico del cantiere	1 g									
Montaggio e smontaggio del ponteggio metallico fisso	3 g									
Realizzazione di tettoia in legno a protezione delle postazioni	1 g									
Demolizioni	13 g									
Demolizione controsoffitti, tramezzi in muratura, battiscopa	3 g									
Rimozione di pavimenti e rivestimenti interni	6 g									
Rimozione di impianti (sanitari, radiatori, tubazioni)	3 g									
Rimozione infissi interni ed esterni	1 g									
Costruzioni	59 g									
Realizzazione di tramezzi in mattoni forati 8x15x30	6 g									
Modifica dei vani porta esistenti	4 g									
Controtelai per porte in legno	5 g									
Intonaco civile per interni (tradizionali)	10 g									
Formazione di massetto per pavimenti interni	10 g									
Posa di pavimenti e battiscopa per interni	15 g									
Posa di rivestimenti interni	5 g									
Opere edili, da impiantista, finiture varie	4 g									
Impianto elettrico	7 g									
Smantellamento impianto elettrico e di illuminazione esistente	3 g									
Realizzazione di impianto elettrico interno (punti luce interrotti	4 g									
Impianto idrico	2 g									
Realizzazione di impianto idrico-sanitario e scarico	2 g									
Impianto climatizzazione	2 g									
Impianto climatizzazione	2 g									
Finiture	15 g									
Tinteggiatura di superfici interne	7 g									
Posa di serramenti esterni	2 g									
Posa di serramenti interni	2 g									
Realizzazione di contropareti e controsoffitti	4 g									
Impianto illuminazione	4 g									

Nome attività	Durata	Settimana -1		Settimana 1							
		-2	-1	1	2	3	4	5	6	7	
Realizzazione di impianto di illuminazione interno	4 g										
Opere di prevenzione incendi	12 g										
Porta antincendio 1 e 2 battenti	4 g										
Impianto rivelazione fumi e centrale antincendio analogica	3 g										
Muratura EI 240 spessore cm. 25	2 g										
Pulsante di allarme a rottura vetro e dispositivo di segnalazio	3 g										
Smobilizzo cantiere	3 g										
Smobilizzo del cantiere	3 g										
LEGENDA Zona:											
Z1 = ZONA UNICA											

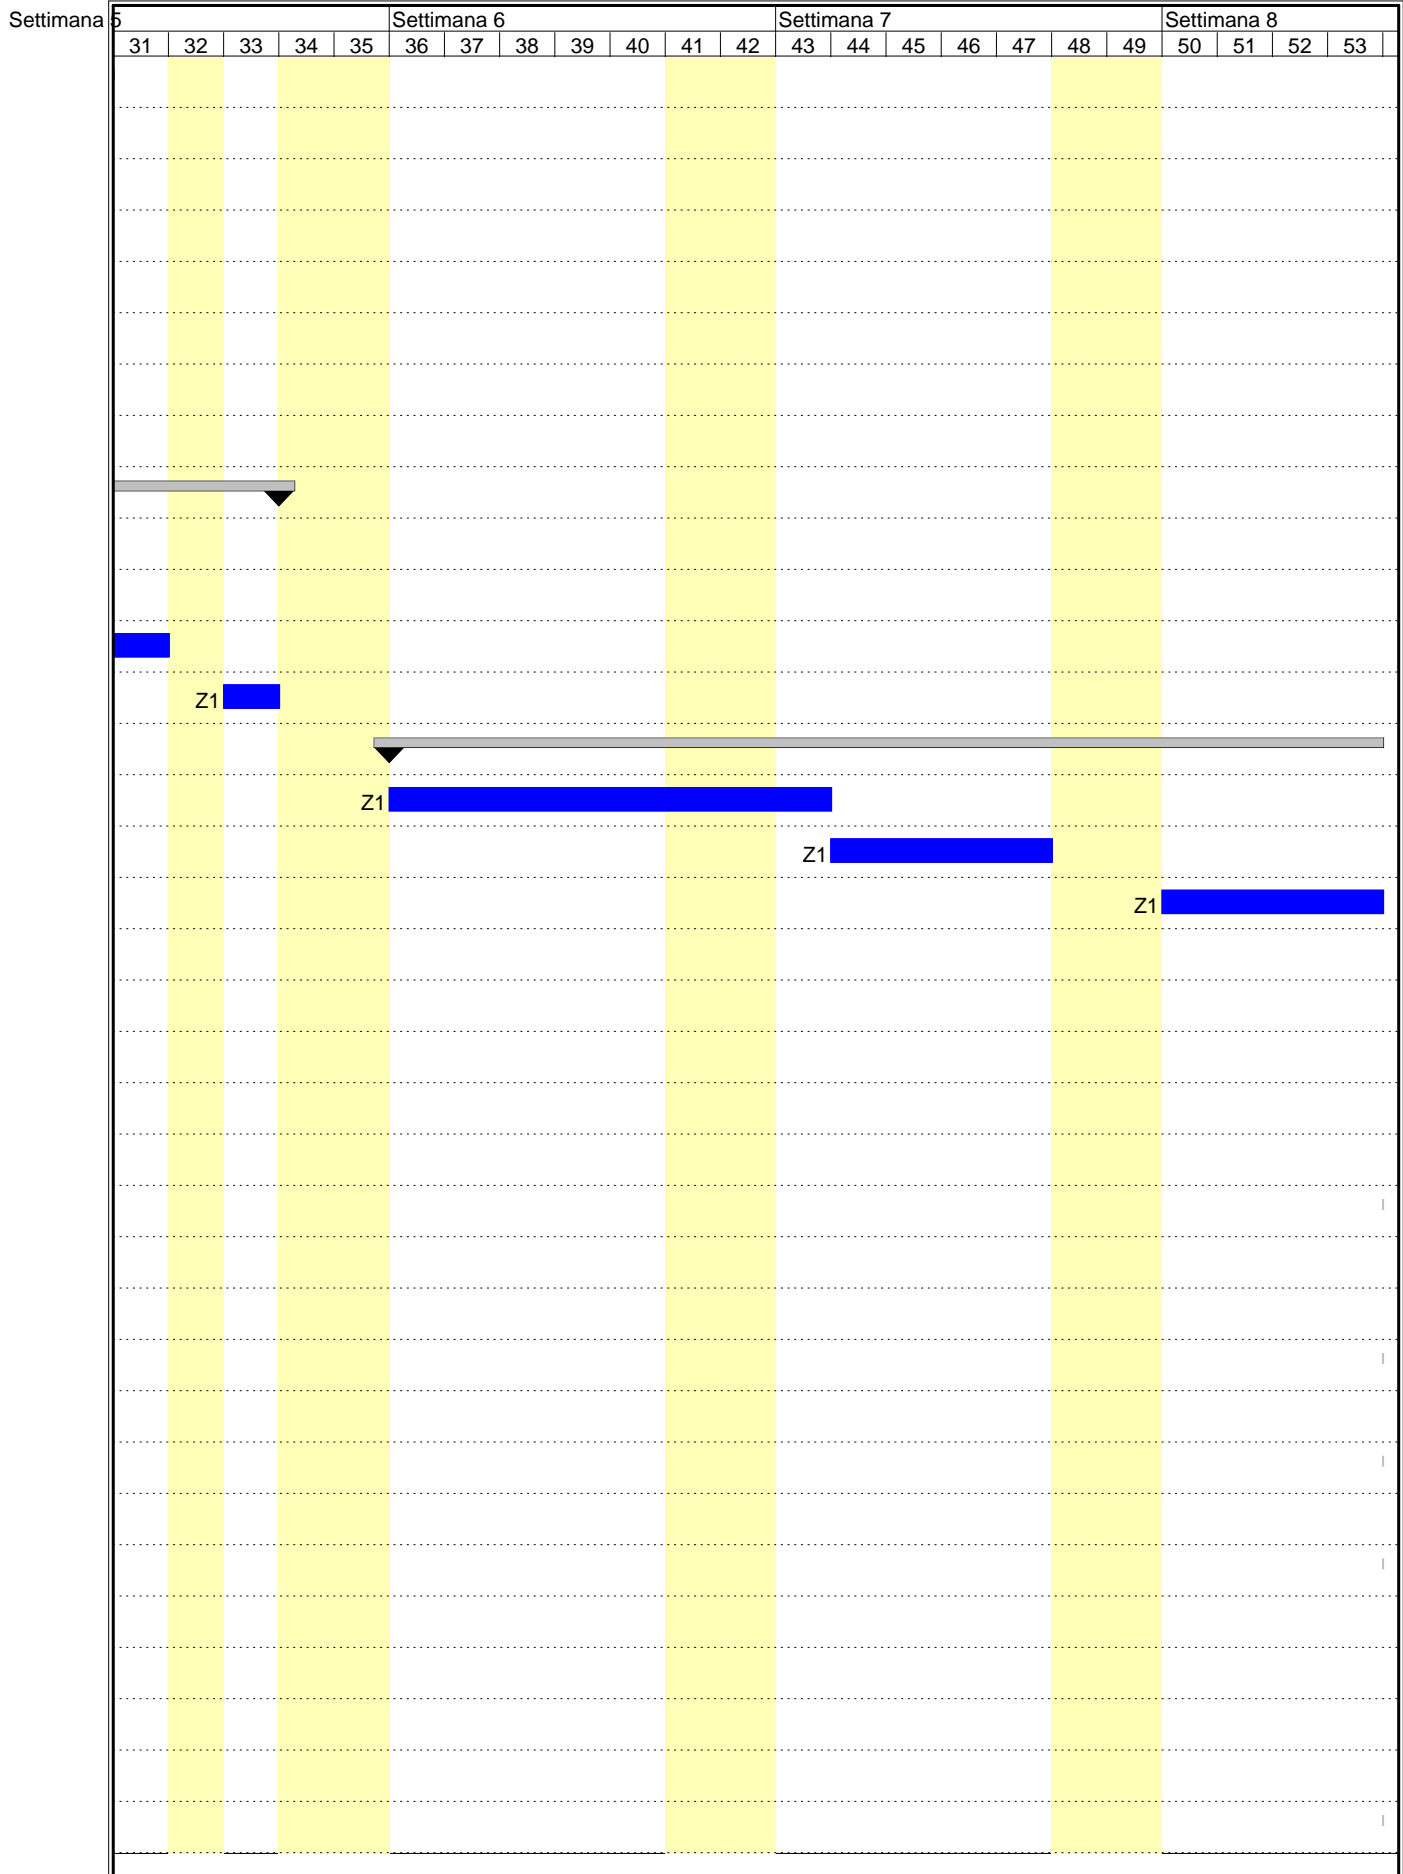

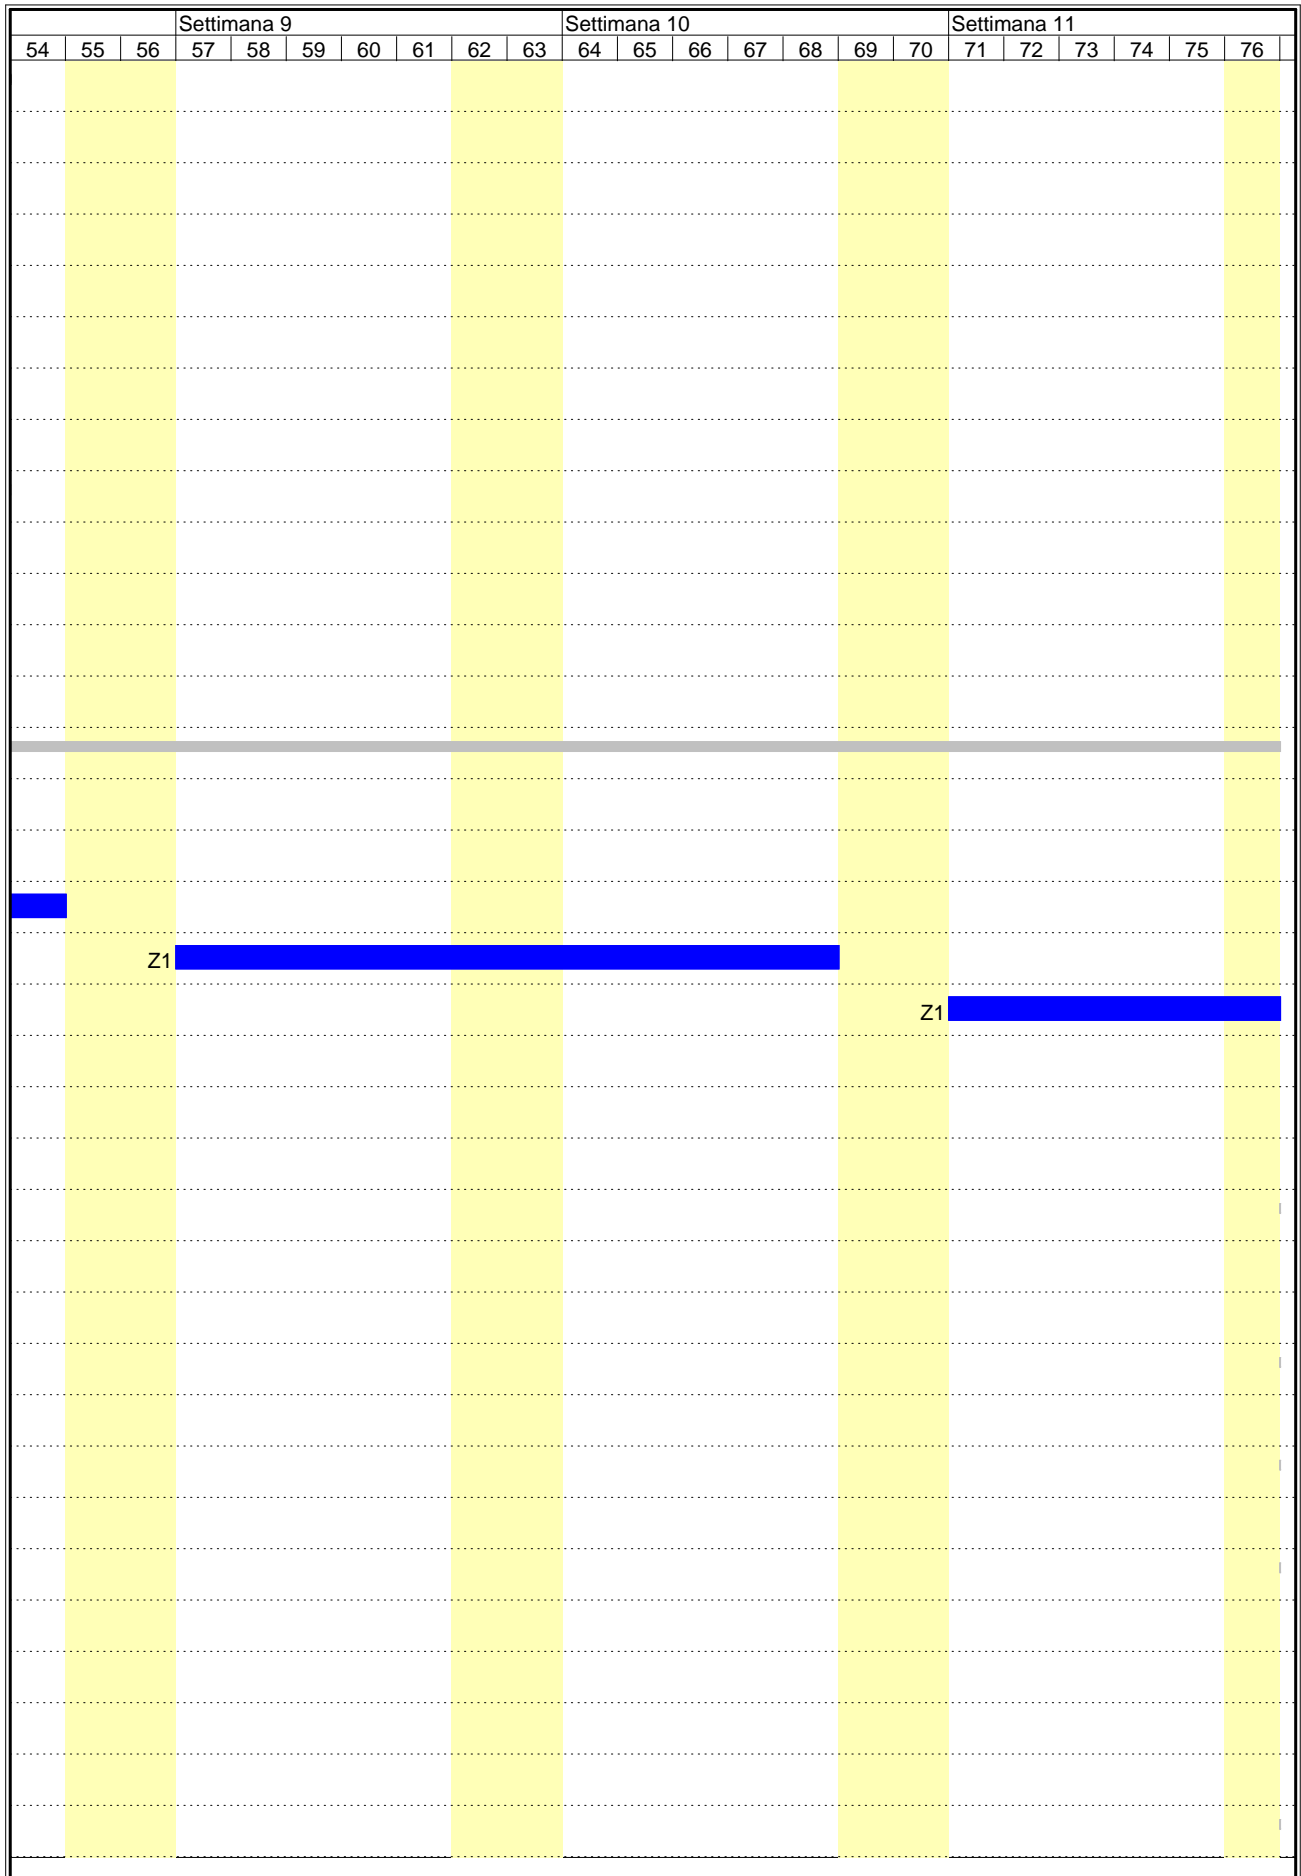

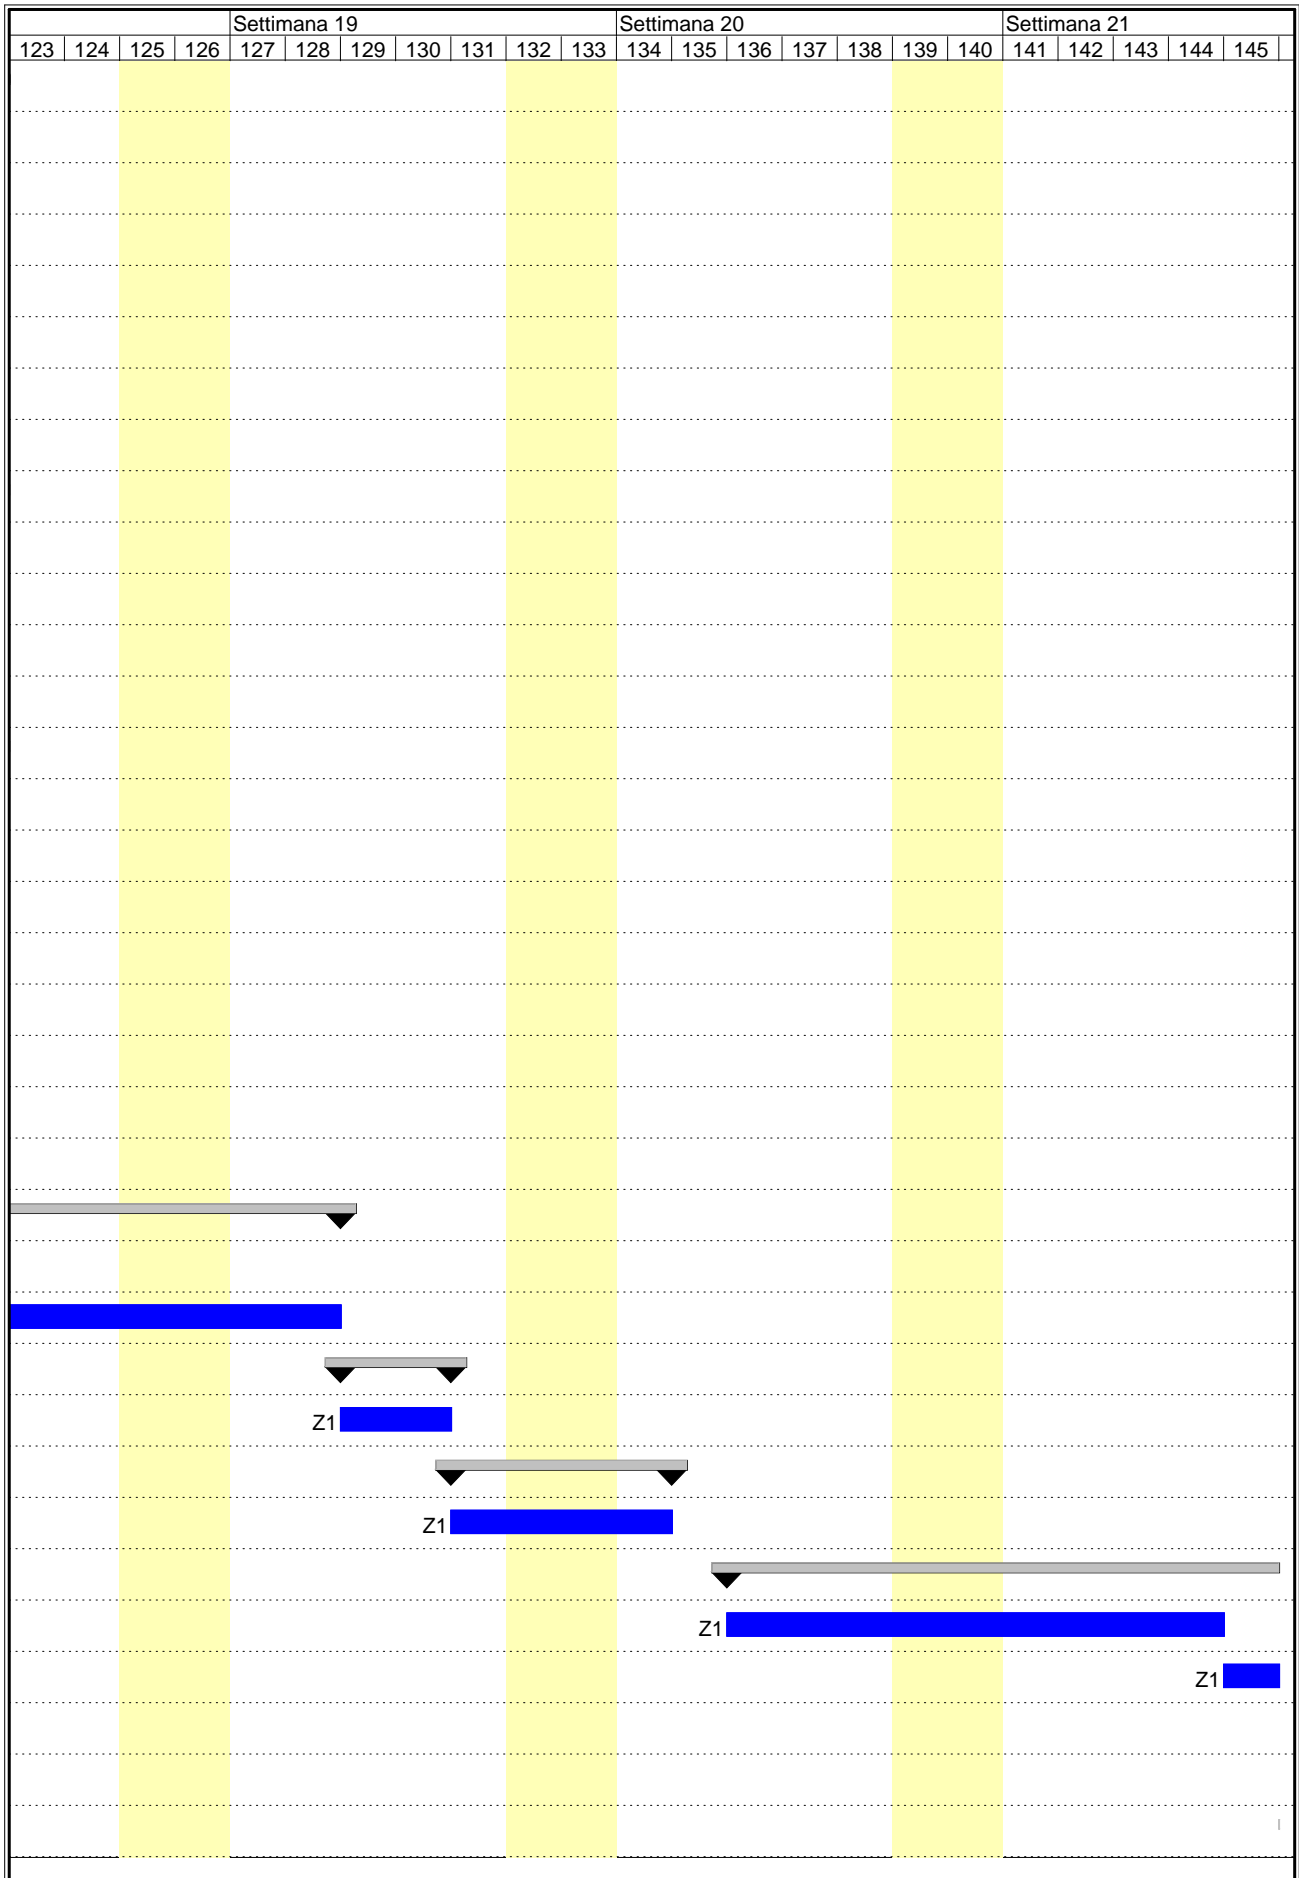

		Settimana 22							Settimana 23							Settimana 24								
146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168		
										Z1														
																								
																Z1								
																						Z1		

