


PRIMI INTERVENTI MESSA IN SICUREZZA ANTINCENDIO ARCHIVIO STABILE EX-INPDAI via NUOVA POGGIOREALE CON REALIZZAZIONE IMPIANTO SPEGNIMENTO WATER-MIST

DURATA  
(gg) **150**

| N. ord. | Cod. | Attività   | Inizio     | Fine       | Durata gg. |
|---------|------|--|------------|------------|------------|
| 1       | A    | Consegna dei lavori  | 01/02/2017 | 01/02/2017 | 0          |
| 2       | B    | Preparazione cantiere                                      | 02/02/2017 | 08/02/2017 | 6          |
| 3       | C    | <b>Realizzazione impianto water-mist</b>                   |            |            |            |
| 4       | C.1  | Installazione tubazioni acciaio                            | 09/02/2017 | 30/04/2017 | 80         |
| 5       | C.2  | Installazione erogatori sprinkler                          | 15/03/2017 | 24/05/2017 | 70         |
| 6       | C.3  | Fornitura e posa in opera gruppo pompaggio                 | 25/05/2017 | 09/06/2017 | 15         |
| 7       | C.4  | Fornitura e posa in opera serbatoi in resina               | 10/06/2017 | 14/06/2017 | 10         |
| 8       | C.5  | Fornitura e posa in opera quadro elettrico unità pompaggio | 15/06/2017 | 24/06/2017 | 9          |
| 9       | D    | Pulizie e smobilizzo                                       | 25/06/2017 | 30/06/2017 | 6          |
| 10      | E    | Fine lavori  | 01/07/2017 | 01/07/2017 | 1          |
|         |      |  |            |            |            |
|         |      |  |            |            |            |
|         |      |  |            |            |            |
|         |      |  |            |            |            |
|         |      |  |            |            |            |

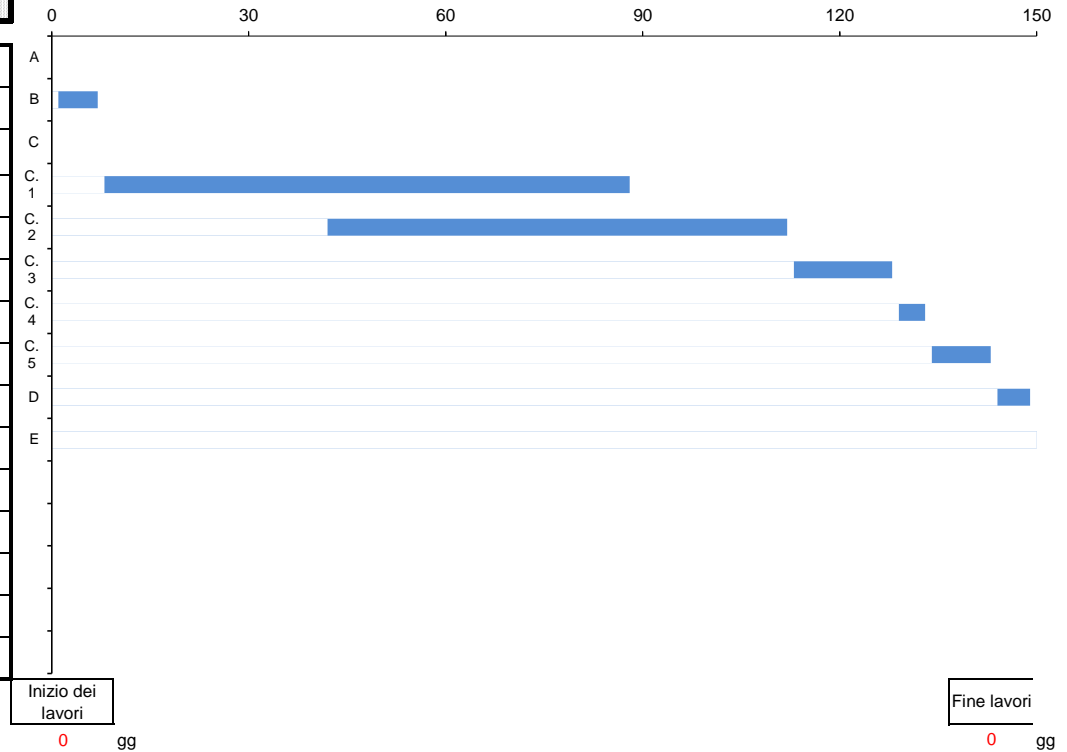

TC

**150** gg.  
naturali consecutivi

Inizio dei lavori  
0 gg

Fine lavori  
0 gg
