



**Data di pubblicazione:** 19/12/2022

**Nome allegato:** *cronoprogramma\_GANTT.pdf*


**CIG:** 9518192484;

**Nome procedura:** *Interventi di riqualificazione Energetica consistenti in Opere Elettriche per la "sostituzione dei corpi illuminanti" ed Opere Idrauliche per la "sostituzione dei ventilconvettori" da eseguirsi presso lo stabile strumentale adibito a direzione Provinciale INPS di ROVIGO, sito in piazza Cervi, 5*

## CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

**Interventi di riqualificazione Energetica consistenti in:  
 Opere Elettriche per la "sostituzione dei corpi illuminanti"  
 Opere Idrauliche per la "sostituzione dei ventilconvettori"  
 presso lo stabile strumentale adibito a direzione Provinciale INPS di ROVIGO, sito in piazza Cervi, 5**

N. ord.	Cod.	Attività	Inizio	Fine	Durata gg.
1	A	Consegna dei lavori	20/02/2023	21/02/2023	1
2	B	Attività di programmazione lavori riunione di coordinamento	21/02/2023	25/02/2023	4
6	F	Preparazione cantiere con formazione di area deposito materiali	23/02/2023	26/02/2023	3
8	H	Parziale smontaggio di controsoffitto nei corridoi dei piani interessati	28/02/2023	05/03/2023	5
9	I	Inizio attività di sostituzione apparecchi di illuminazione - Operazione tolgo/metto	28/02/2023	14/04/2023	45
15	Q	Chiusura fori e rimontaggio del controsoffitto	14/04/2023	19/04/2023	5
10	L	Svuotamento impianto termoidraulico	08/04/2023	10/04/2023	2
11	M	Rimozione degli esistenti ventilconvettori, comprese valvole e detentori, modifiche elettriche	10/04/2023	18/04/2023	8
12	N	Opere idrauliche d adattamento tubazioni ed attacchi per nuove valvole e detentori	10/04/2023	30/04/2023	20
13	O	Installazione dei nuovi ventilconvettori	15/04/2023	15/05/2023	30
14	P	Collegamenti elettrici di potenza e regolazione ventilconvettori	08/05/2023	16/05/2023	8
12	N	Carico impianto e Prove di tenuta	17/05/2023	19/05/2023	2
16	R	Formazione del personale	19/05/2023	20/05/2023	1
17	S	Collaudo e messa in marcia dell'impianto.	20/05/2023	21/05/2023	1
19	U	Fine lavori	21/05/2023	21/05/2023	0

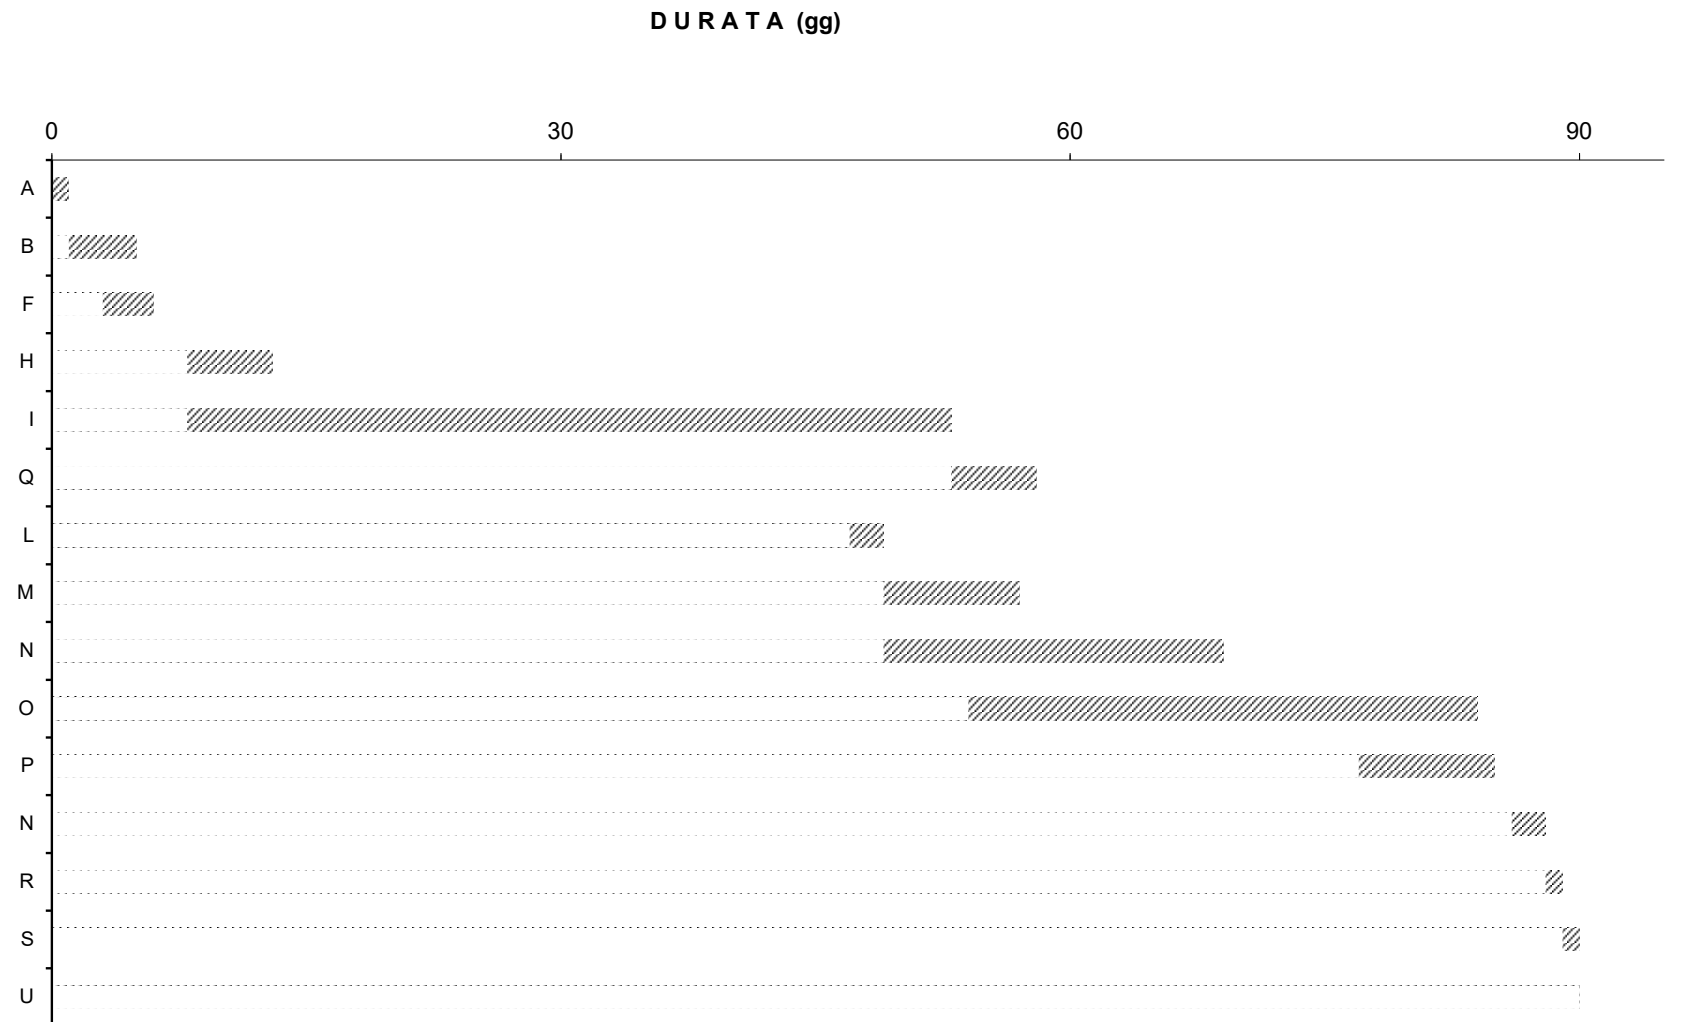

TC

**90**  
 naturali consecutivi gg.

Inizio dei lavori  
 20/02/2023 gg

Fine lavori  
 21/05/2023 gg

**N.B.** Al fine della predisposizione del presente CRONO PROGRAMMA DEI LAVORI si ipotizza, compatibilmente con le procedure e le verifiche amministrative, la consegna dei lavori per il **20/02/2023**
