


SISTEMA DI TERMOREGOLAZIONE E CONTABILIZZAZIONE DEL CALORE
A SERVIZIO DEGLI APPARTAMENTI E DEI NEGOZI SITI NEL CONDOMINIO INPS (EX INPDAP) DENOMINATO "FABBRICATO A"
UBICATO IN
TREVISO – VIA CAPODISTRIA/VIA ALBONA

N. ord.	Attività	Inizio	Fine	Durata gg.
1	Consegna dei lavori	30/05/2017	30/05/2017	0
2	Pulizia e lavaggio impianto con apposito liquido, bonifica delle tubazioni e dei radiatori	30/05/2017	09/06/2017	10
3	Svuotamento totale dell'impianto e Sostituzione valvole e detentori esistenti con valvole termostatabili	10/06/2017	28/06/2017	18
4	Rilievo e censimento di tutti i corpi scaldanti con identificazione delle potenze installate	30/05/2017	11/06/2017	12
5	Fornitura e posa in opera di n° 640 Ripartitori di calore costituiti da dispositivo elettronico	05/06/2017	25/06/2017	20
6	Inserimento di n° 3 contaltri meccanico di gasolio sulle tubazioni di adduzione combustibile	26/06/2017	28/06/2017	2
7	Modifica circuiti distribuzione x Inserimento in linea di n° 3 Contatori Calore configurabile con unità calcolo	19/06/2017	23/06/2017	4
8	Inserimento di valvola di sovrappressione da 1 ¼" su circuito radiatori Negozi	19/06/2017	23/06/2017	4
9	Modifica colonne montanti circuito Appartamenti per installazione di n° 42 valvole di sfioro e by-pass da ¾"	10/06/2017	22/06/2017	12
10	Installazione dei sistemi ripetitori nei n° 5 vani scala e nel locale Centrale Termica	05/06/2017	10/06/2017	5
11	Prove di tenuta e funzionalità	22/06/2017	30/06/2017	8
12	Formazione del personale	29/06/2017	30/06/2017	1
13	Collaudo e messa in marcia dell'impianto.	29/06/2017	30/06/2017	1
14	Pulitura a ultimazione lavori dell'area di cantiere e smobilizzo.	29/06/2017	30/06/2017	1
15	Fine lavori	30/06/2017	30/06/2017	0

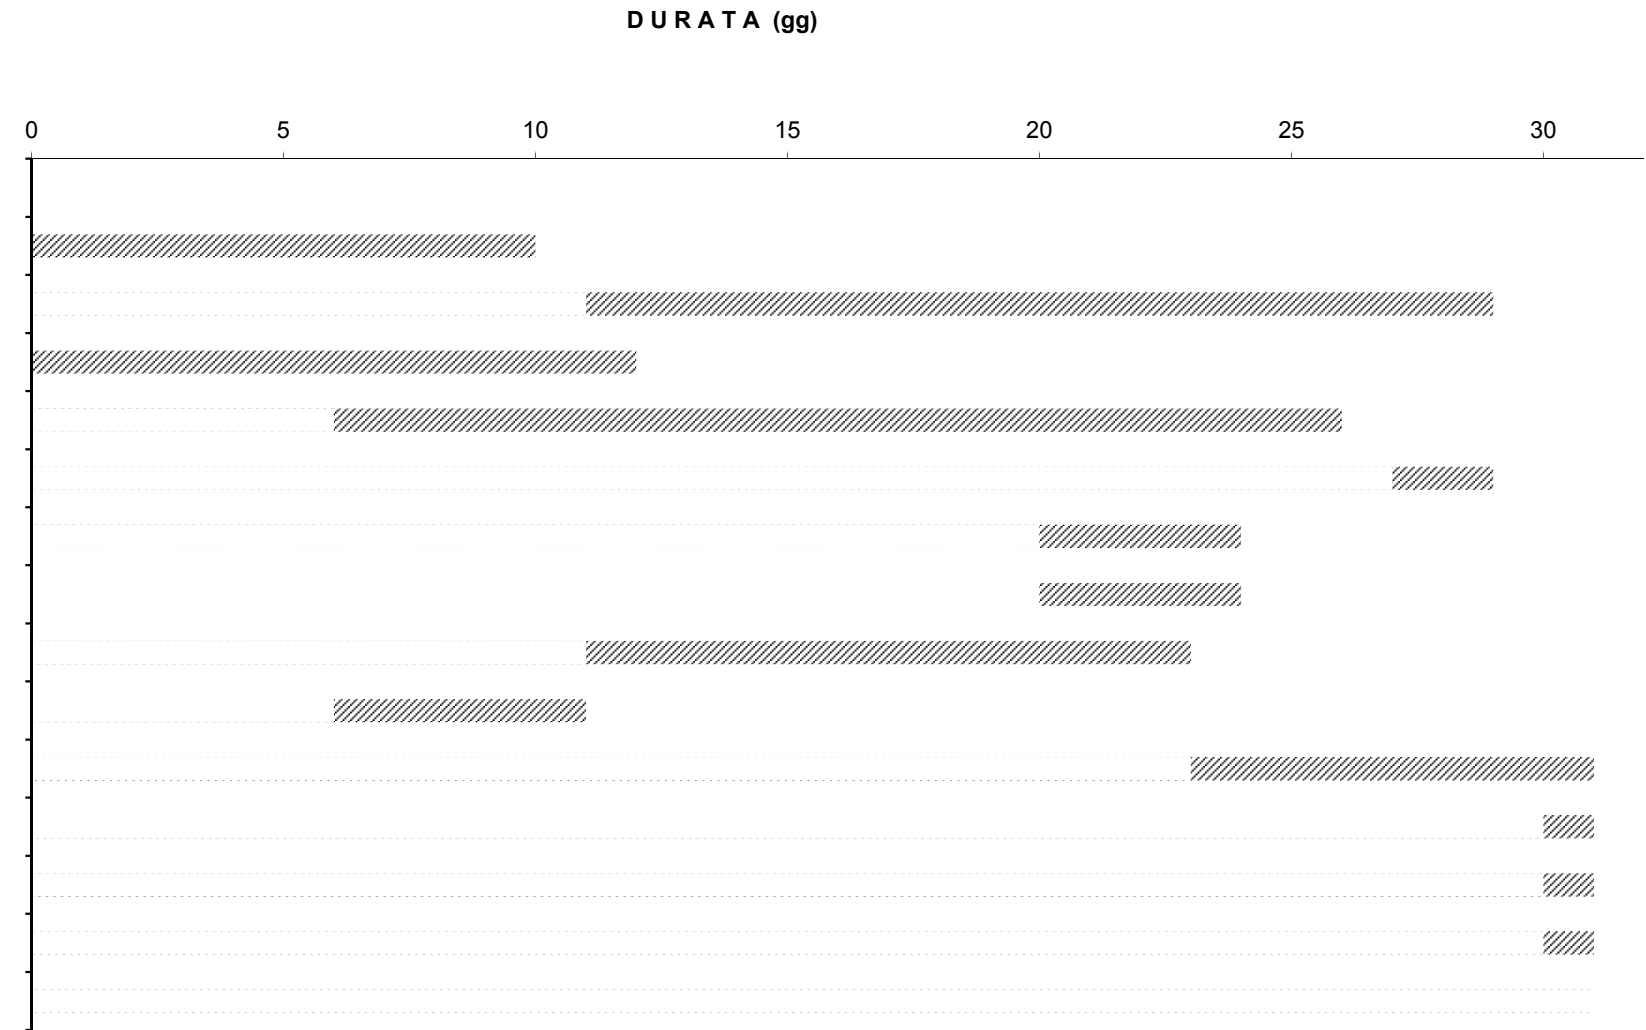

Inizio dei lavori
0 gg

Fine lavori
45 gg

TC

30
gg.
naturali consecutivi
