




Data di pubblicazione: 29/03/2018

Nome allegato: *cronoprogramma_GANT.pdf*

CIG: 7419429280;

Nome procedura: *Procedura negoziata ai sensi del combinato disposto dell'art. 36 comma 2 lettera c) e comma 6 del D.LGS.VO n. 50/2016 per lavori di riqualificazione della C.T. di adeguamento normativo locali ai fini antincendio con compartimentazione delle strutture presso lo stabile della D.P. INPS di Venezia 3519/I*

N. ord.	Cod.	Attività	Inizio	Fine	Durata gg.
1	A	Consegna dei lavori	04/06/2018	04/06/2018	0
2	B	Preparazione cantiere con eventuale formazione di ponteggio con elementi metallici	05/06/2018	12/06/2018	7
3	C	Sezionamento impianto elettrico esistente dal QEG	04/06/2018	06/06/2018	2
4	D	Smantellamento e demolizione totale degli impianti siti in Centrale Termica	06/06/2018	24/06/2018	18
5	E	Lavaggio impianti Direzione Provinciale e Regionale	14/06/2018	04/07/2018	20
6	F	Esecuzione delle opere edili, serramentista e di compartimentazione	25/06/2018	25/07/2018	30
7	G	Posizionamento nuovi generatori di calore a condensazione	23/07/2018	02/08/2018	10
8	H	Realizzazione di nuovi canali di fumo ed intubamento delle esistenti canne fumarie	25/07/2018	15/08/2018	21
9	I	Riposizionamento e esistenti scambiatori di calore e posizionamento dei nuovi	02/08/2018	08/08/2018	6
10	L	Fornitura in opera collettori circuiti secondari	06/08/2018	11/08/2018	5
11	M	Realizzazione circuiti primari e collegamento dei circuiti secondari	02/08/2018	11/09/2018	40
12	N	Esecuzione della linea di scarico condensa	02/08/2018	05/08/2018	3
13	O	Prove di tenuta, realizzazione di rivestimenti isolanti e di finitura	11/09/2018	26/09/2018	15
14	P	Realizzazione di impianto elettrico di potenza, di controllo e di comando	28/08/2018	27/09/2018	30
15	Q	Chiusura fori e sigillature, ritocchi dipinture	25/09/2018	29/09/2018	4
16	R	Formazione del personale	28/09/2018	01/10/2018	3
17	S	Collaudo e messa in marcia dell'impianto.	28/09/2018	29/09/2018	1
18	T	Pulitura a ultimazione lavori dell'area di cantiere e smobilizzo.	29/09/2018	02/10/2018	3
19	U	Fine lavori	02/10/2018	02/10/2018	0

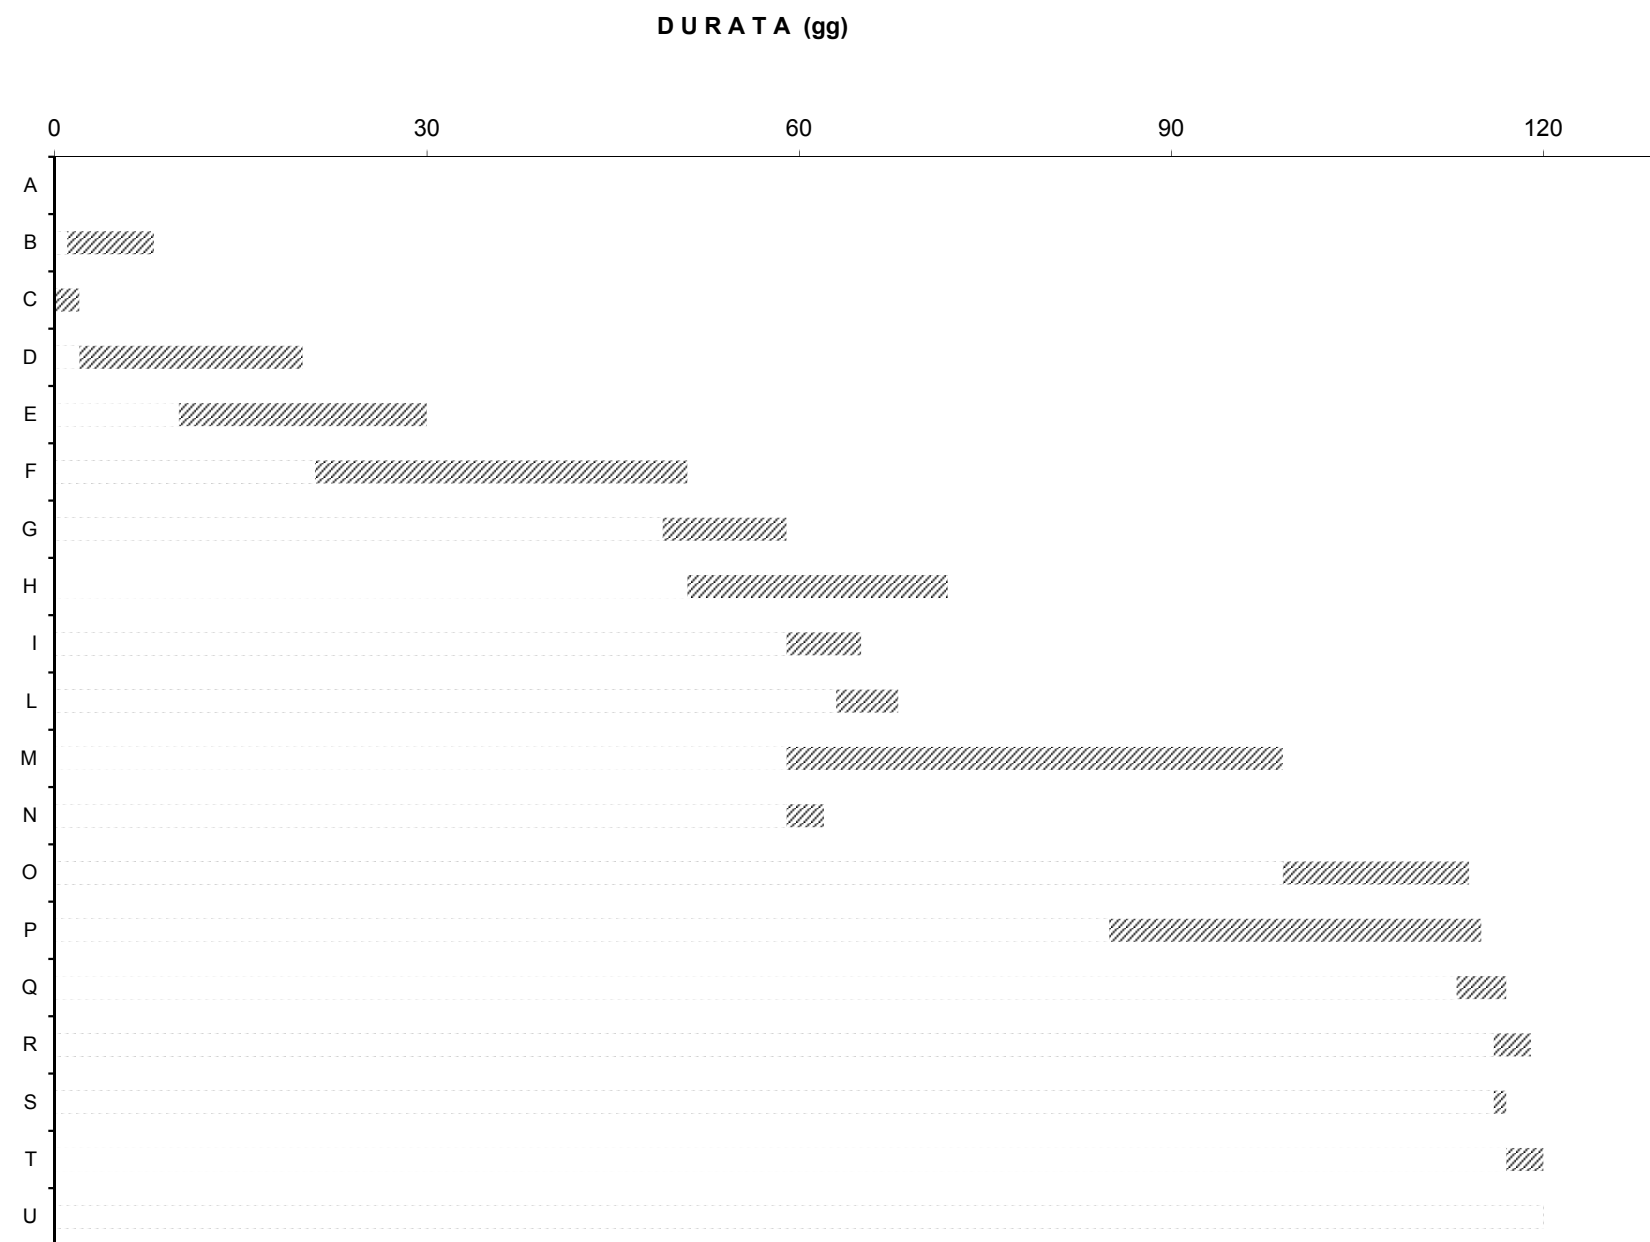

Inizio dei lavori
0 gg

Fine lavori
120 gg

TC **120** gg.
 naturali consecutivi
