



ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Direzione Regionale per la Sardegna

Area Tecnico Edilizio

Via dei Giudicati 33 – 09131 - Cagliari telefono 07040941 telefax 0704094-447/428

**DIREZIONE PROVINCIALE INPS DI CAGLIARI**

**VIALE REGINA MARGHERITA 9A**

Lavori di

“ADEGUAMENTO CENTRO MEDICO LEGALE AL PIANO  
TERRA E PIANO SEMINTERRATO “

CUP: F21E13000120005

CIG: 52554430C3

# Cronoprogramma

		<i>importi in euro</i>
1	Importo esecuzione lavoro a corpo	110.217,00
2	Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza	3.150,00
A	<b>Totale appalto (1 + 2)</b>	<b>123.367,00</b>

*Progettisti:*

**Perito edile Mario Frongia**


**Per. Ind. El. Giampaolo Meloni**

*Il responsabile del procedimento*

**Ing. Giampaolo Cuboni**

DURATA (gg)

N. ord.	Cod.	Attività	Inizio	Fine	Durata gg.
1	A	PIANO SENMERRATO Consegna dei lavori	14/10/2013	14/10/2013	0
2	B	Preparazione cantiere	15/10/2013	18/10/2013	3
3	C.1	Demolizioni	19/10/2013	25/10/2013	6
4	C.2	murature	26/10/2013	31/10/2013	5
5	C.3	impianti idrici e fognari	01/11/2013	03/11/2013	2
6	C.4	intonaci, controcasse	04/11/2013	10/11/2013	6
7	C.5	pavimenti rivestimenti	11/11/2013	14/11/2013	3
8	C.6	impianti elettrici e telem.	15/11/2013	18/11/2013	3
9	C.7	tinteggiature	19/11/2013	23/11/2013	4
10	C.8	<b>posa in opera di infissi</b>	24/11/2013	25/11/2013	1
11	D.1	PIANO TERRA consegna lavori	02/12/2013	02/12/2013	0
12	D.2	preparazione cantiere	03/12/2013	05/12/2013	2
13	D.3	demolizioni	06/12/2013	09/12/2013	3
14	D.4	murature intonaci e controcasse	10/12/2013	13/12/2013	3
15	D.5	pavimenti e posa di lastre	14/12/2013	16/12/2013	2
16	D.6	tinteggiatura	17/12/2013	19/12/2013	2
17	D.7	impianto elettrico e telem.	20/12/2013	24/12/2013	4
18	D.8	sostituzione di infissi area medico legale	25/12/2013	28/12/2013	3
19	E	Pulizie e smobilizzo	29/12/2013	31/12/2013	2
20	F	Fine lavori	01/01/2014	02/01/2014	1

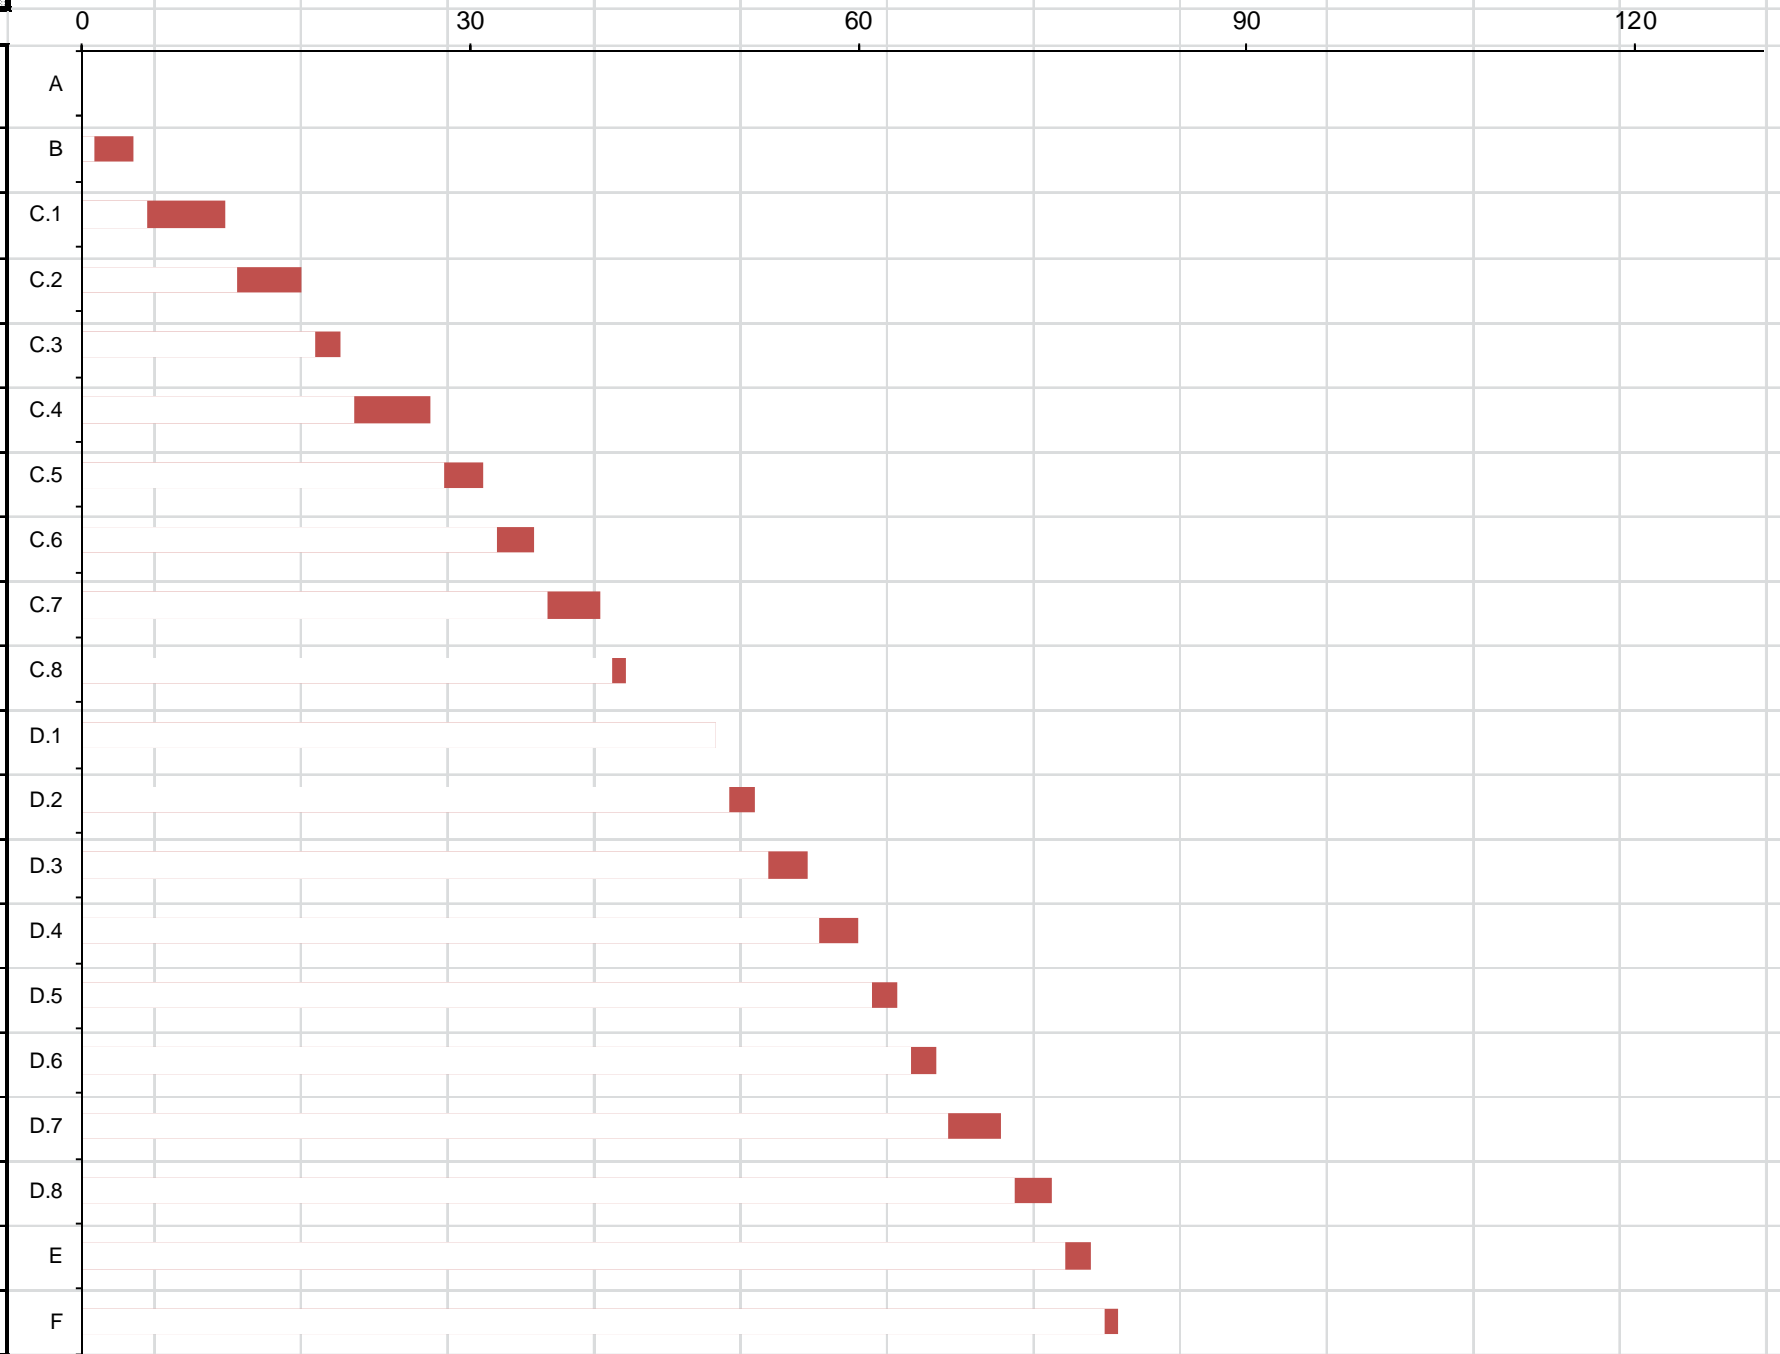

Inizio dei lavori

0 gg

Fine lavori

80 gg

**TC** **80** gg.  
naturali consecutivi

