



Direzione Regionale Molise
Coordinamento Tecnico-Edilizio

Comune di Campobasso

DIAGRAMMA DI GANTT

Cronoprogramma dei lavori

Decreto Legislativo n°81/2008 - Titolo IV e s.m.i.

(Allegato XV e art. 100 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.)

(D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)

OGGETTO: Lavori di adeguamento impiantistico, edile ed antincendio finalizzati al miglioramento energetico, alla sostituzione dell'impianto di condizionamento ed al rilascio dell'Attestazione di Prevenzione Incendi (CPI) per lo stabile strumentale sito in Campobasso via G. Zurlo, 11

COMMITTENTE: INPS - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale – Direzione Regionale Molise

Data, 28/11/2018

Il Coordinatore della Sicurezza

P.I. Aurelio Mastrangelo

Il Committente

Dr. Elio Rivezzi

LAVORO

CARATTERISTICHE GENERALI DELL'OPERA:

Natura dell'Opera: Opere impiantistiche ed edili di completamento per i lavori di manutenzione straordinaria ed adeguamento normativo.

OGGETTO: Lavori di adeguamento impiantistico, edile ed antincendio finalizzati al miglioramento energetico, alla sostituzione dell'impianto di condizionamento ed al rilascio del Attestazione di Prevenzione Incendi (CPI) per lo stabile strumentale sito in Campobasso via G. Zurlo, 11

Indirizzo del CANTIERE:

Località: via Giuseppe Zurlo, 11

Città: Campobasso

COMMITTENTI

DATI COMMITTENTE:

Ragione sociale: INPS - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale – Direzione Regionale Molise

Indirizzo: Via G. Zurlo 11

Città: Campobasso

Telefono / Fax: 0874 480462

nella Persona di:

Nome e Cognome: Pasquale Cerbone

Qualifica: Ingegnere - RUP

Indirizzo: Via G. Zurlo 11

Città: Campobasso

Telefono / Fax: 0874 480427

RESPONSABILI

Progettista:


Nome e Cognome: Claudio Petitto/ Luigi Maiella/ Aurelio Mastrangelo
Qualifica: Ingegnere / Geometra / Perito Industriale
Indirizzo: Via G. Zurlo 11
Città: Campobasso
Telefono / Fax: 0874 480447
Data conferimento incarico: 28/11/2018

Direttore dei Lavori:

Nome e Cognome: Claudio Petitto
Qualifica: Ingegnere
Indirizzo: Via G. Zurlo 11
Città: Campobasso
Telefono / Fax: 0874 480447
Data conferimento incarico: 28/11/2018

Coordinatore Sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione:

Nome e Cognome: Aurelio Mastrangelo
Qualifica: Perito Industriale
Indirizzo: Via G. Zurlo 11
Città: Campobasso
Telefono / Fax: 0874 480447
Data conferimento incarico: 28/11/2018

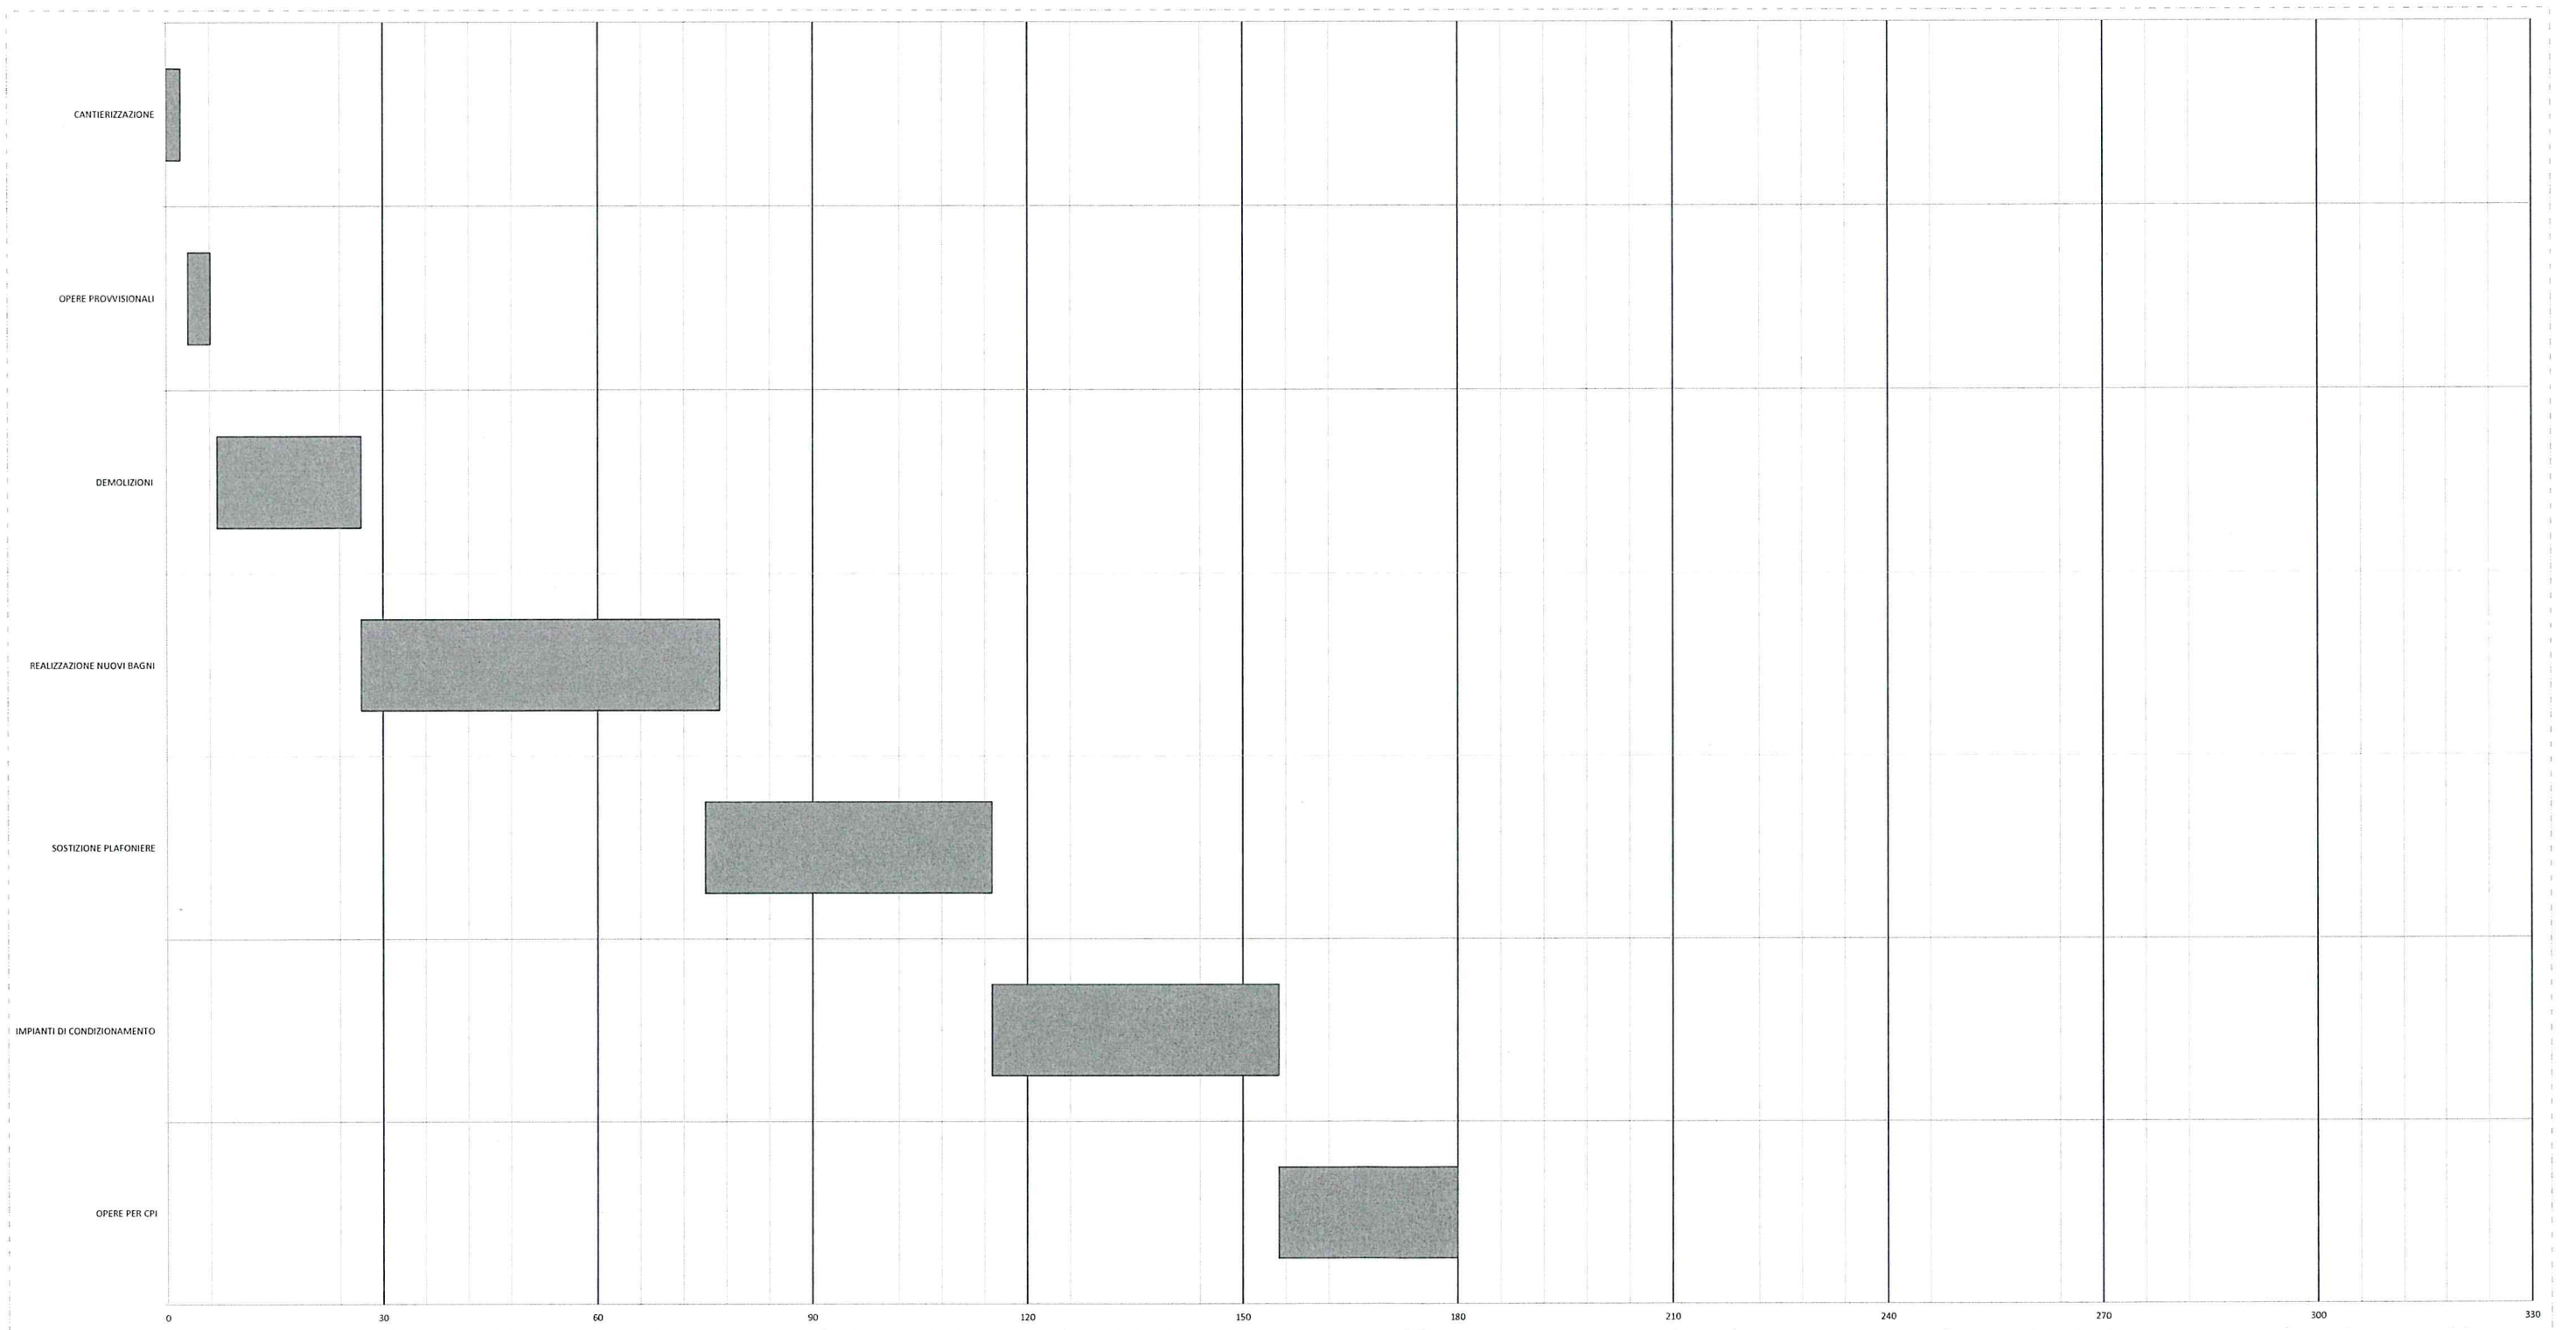

MACROCATEGORIE LAVORATIVE DA COMPUTO METRICO ESTIMATIVO DI PROGETTO ESECUTIVO	IMPORTI PROGETTO ESECUTIVO	% CATEGORIE	% MAN.	COSTO MAN. (ance)	ORE	LAVORATORI	NGL	GIORNI ANNO	GIORNI UTILI	NGC	INIZIO	FINE	DURATA
CANTIERIZZAZIONE	€ 700,00	0,26%	100	€ 25,00	8	2,00	2	365	236	2	0	2	2
OPERE PROVVISORIALI	€ 500,00	0,18%	100	€ 25,00	8	2,00	2	365	236	3	3	6	3
DEMOLIZIONI	€ 16.401,55	6,05%	75	€ 25,00	8	4,00	16	365	236	20	7	27	20
REALIZZAZIONE NUOVI BAGNI	€ 68.009,09	25,08%	65	€ 25,00	8	6,00	37	365	236	50	27	77	50
SOSTIZIONE PLAFONIERE	€ 38.760,00	14,29%	40	€ 25,00	8	4,00	20	365	236	40	75	115	40
IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO	€ 62.890,18	23,19%	45	€ 25,00	8	4,00	35	365	236	40	115	155	40
OPERE PER CPI	€ 83.912,34	30,94%	35	€ 25,00	8	3,00	55	365	236	25	155	180	25
TOTALI	€ 271.173,16	100,00%								180			

NGC è il numero di giornate consecutive necessarie a terminare le macrocategorie lavorative.
la metodologia per la determinazione dei tempi è ampiamente esplicitata nella allegata relazione

180,00	GIORNI
6,00	MESI
