

ALLEGATO "A"

Comune di Torino - Collegno
Provincia di TO

DIAGRAMMA DI GANTT

cronoprogramma dei lavori

(Allegato XV e art. 100 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.)
(D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)

OGGETTO: Ristrutturazione piano terra e primo piano ad uso centro medico legale

COMMITTENTE: INPS - Direzione Regionale del Piemonte.

CANTIERE: Corso Francia, Torino - Collegno (TO)

Torino - Collegno, 12/11/2019

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA

(Architetto Perazzo Marcello)

per presa visione

IL COMMITTENTE

(Direttore Regionale Baldino Giuseppe)

Architetto Perazzo Marcello

Via Gonzaga 6
20123 Milano (MI)
Tel.: 0285621376 - Fax: \$EMPTY_CSP_10\$
E-Mail: marcello.perazzo@inps.it

CerTus by Guido Cianciulli - Copyright ACCA software S.p.A.

NOTE AL PRESENTE GANTT

ATTENZIONE

Il cantiere si sviluppa su due piani sono previste 4 fasi di intervento al fine di non creare interferenze con le lavorazioni in corso.

prima fase: piano terra due aree delimitate

seconda fase: piano terra wc e attuale sanitario


terza fase: primo piano zona sud ed est

quarta fase: primo piano zona nord e centrale

Il presente diagramma attua le fasi lavorative per ogni zona le quantità di materiali e lavorazioni (indicate nella loro totalità) sono da intendersi da dividere per 4.

Le aree di deposito materiali sono esterne nell'area cortilizia posteriore con accesso dedicato ai mezzi.

La definizione delle zone può essere modificata in concomitanza con necessità di sede.

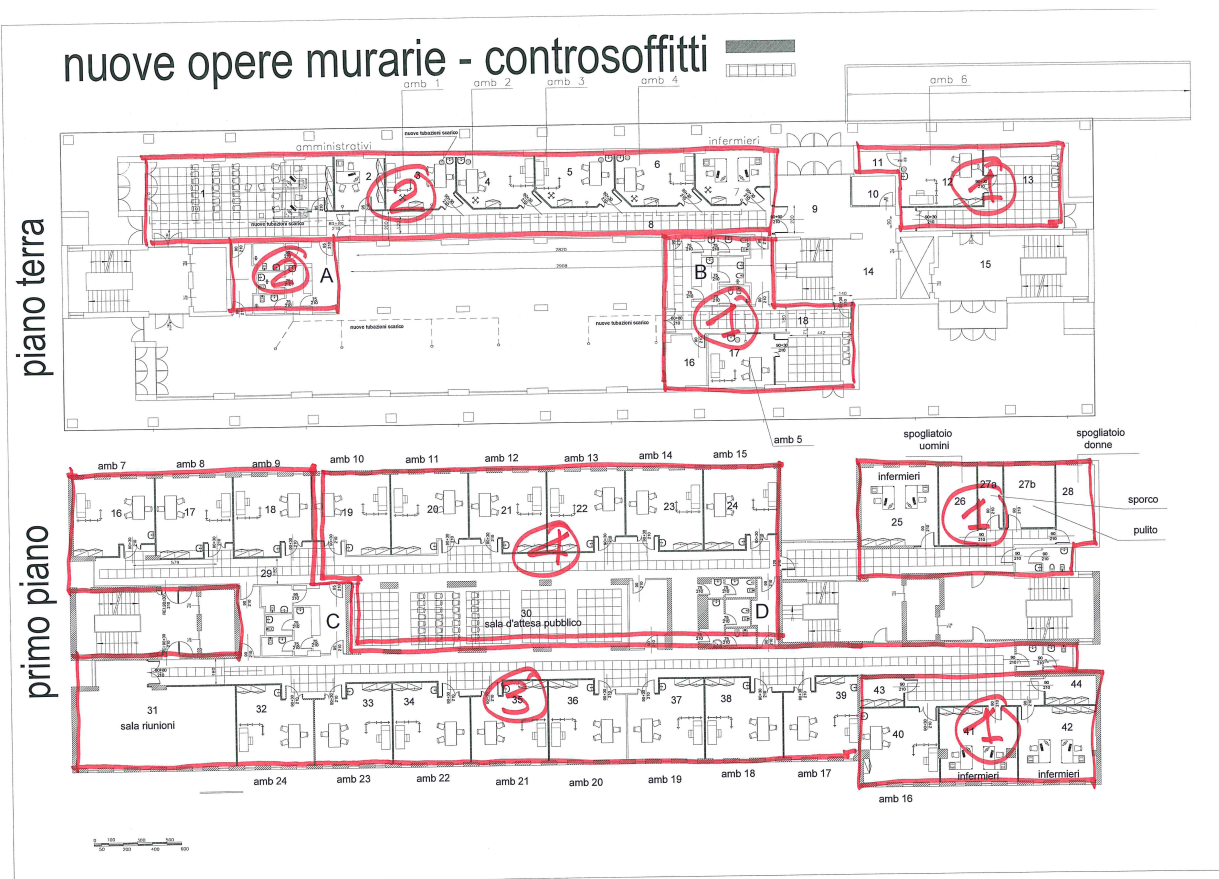

II CSP

Arch. Marcello Perazzo

Nome attività	Durata	Settimana 1					Settimana 2					Settimana 3					Settimana 4					Settimana 5					Settimana 6													
		-2	-1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	
Apprestamenti del cantiere	3 g																																							
Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e	3 g		Z1																																					
Allestimento di servizi sanitari del cantiere	3 g		Z1																																					
Impianti di servizio del cantiere	1 g																																							
Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere	1 g		Z1																																					
Realizzazione di impianto elettrico del cantiere	1 g		Z1																																					
Realizzazione di impianto idrico dei servizi igienico-assistenzi	1 g		Z1																																					
1 Demolizione di tramezzature eseguita a mano	8 g															Z1																								
2 Rimozione di controsoffittature, intonaci e rivestimenti interni	9 g								Z1																															
3 Rimozione di pavimento in ceramica	5 g																											Z1												
3.1 Rimozione di rivestimenti in ceramica	5 g																											Z1												
4 Rimozione di pavimento in materie plastiche	1 g																											Z1												
5 Rimozione di massetto	5 g																											Z1												
6 Rimozione di serramenti interni	5 g								Z1																															
7 Esecuzione di tracce eseguite a mano	4 g																																			Z1				
8 Rimozione di rivestimenti in legno (battiscopa)	4 g								Z1																															
9 Rimozione di apparecchi igienico sanitari	5 g																				Z1																			
9.1 Rimozione di canali d'aria esistenti	5 g													Z1																										
10 Realizzazione di pareti divisorie interne in cartongesso	18 g																																							
11 12 13 25 Realizzazione di contropareti REI 120 e controsoffitti	9 g																																							
14 Tinteggiatura di superfici interne	1 g																																							
15 Formazione intonaci interni (tradizionali)	1 g																																							
16 21 22 Posa di pavimenti per interni in gomma, saldatura e gusci	20 g																																							
17 - 18 Formazione di massetto per pavimenti interni	10 g																																							
19 Posa di pavimenti per interni in ceramica	5 g																																							
20 Posa di rivestimenti interni in ceramica	5 g																																							
23 Posa di zoccolino in legno	1 g																																							
24 Pareti divisorie per compartimentazione antincendio	5 g																																							
27 29 30 31 32 Montaggio di porte tagliafuoco	1 g																																							
33 34 Montaggio di porte interne	1 g																																							
OS3 - IMPIANTI IDRICO SANITARI	8 g																																							
41 42 47 Montaggio di apparecchi igienico sanitari	1 g																																							
43 45 46 Realizzazione della rete di distribuzione di impianto	5 g																																							
44 Installazione di caldaia per impianto termico (autonomo)	5 g																																							
Impianti di condizionamento	9 g																																							

