

ALLEGATO "A"

Comune di Milano
Provincia di MI

DIAGRAMMA DI GANTT

cronoprogramma dei lavori
(Allegato XV e art. 100 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.)
(D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)

OGGETTO: LAVORI VARI DI COMPLETAMENTO ED INSTALLAZIONE NUOVO ASCENSORE

COMMITTENTE: INPS DIREZIONE REGIONALE DELLA LOMBARDIA

CANTIERE: Via Gian Battista Vico 1/B e 1/A, Milano (MI)

Milano, 07/07/2017

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA

(Ingegnere Rigoli Michele)

per presa visione


IL COMMITTENTE

(DIRETTORE REGIONALE QUATTRONE GIULIANO)


Ingegnere Rigoli Michele
Via Gonzaga 6
20123 Milano (MI)
Tel.: 028893217 - Fax: 028893344
E-Mail: michele.rigoli@inps.it

CerTus by Guido Cianciulli - Copyright ACCA software S.p.A.

Nome attività	Durata	Settimana -1		Settimana 1							Settimana 2							Settimana 3				
		-2	-1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per g	1 g	Z1																				
Relazione geologica con indagini geotecniche e prelievo di campior	4 g																					
Prova penetrometrica statica con punta meccanica (CPT)	2 g																					
Demolizione di balconi, cornicioni, aggetti orizzontali	2 g																					
Taglio di muratura a tutto spessore	1 g																					
Scavo a sezione obbligata	2 g																					
Realizzazione della carpenteria per le strutture in fondazione	2 g																					
Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazione	3 g																					
Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione	1 g																					
Montaggio e smontaggio del ponteggio metallico fisso	17 g																					
Montaggio di strutture verticali in acciaio	8 g																					
Realizzazione di impianto ascensore	15 g																					
Posa di serramenti esterni	15 g																					
Realizzazione di impianto telefonico e citofonico	3 g																					
Realizzazione di impianto elettrico interno	5 g																					
Lucidatura a piombo di pavimenti e scalini	7 g																					
Tinteggiatura di superfici interne e opere varie	39 g																					
Smobilizzo del cantiere	1 g																					
LEGENDA Zona:																						
Z1 = ZONA UNICA																						

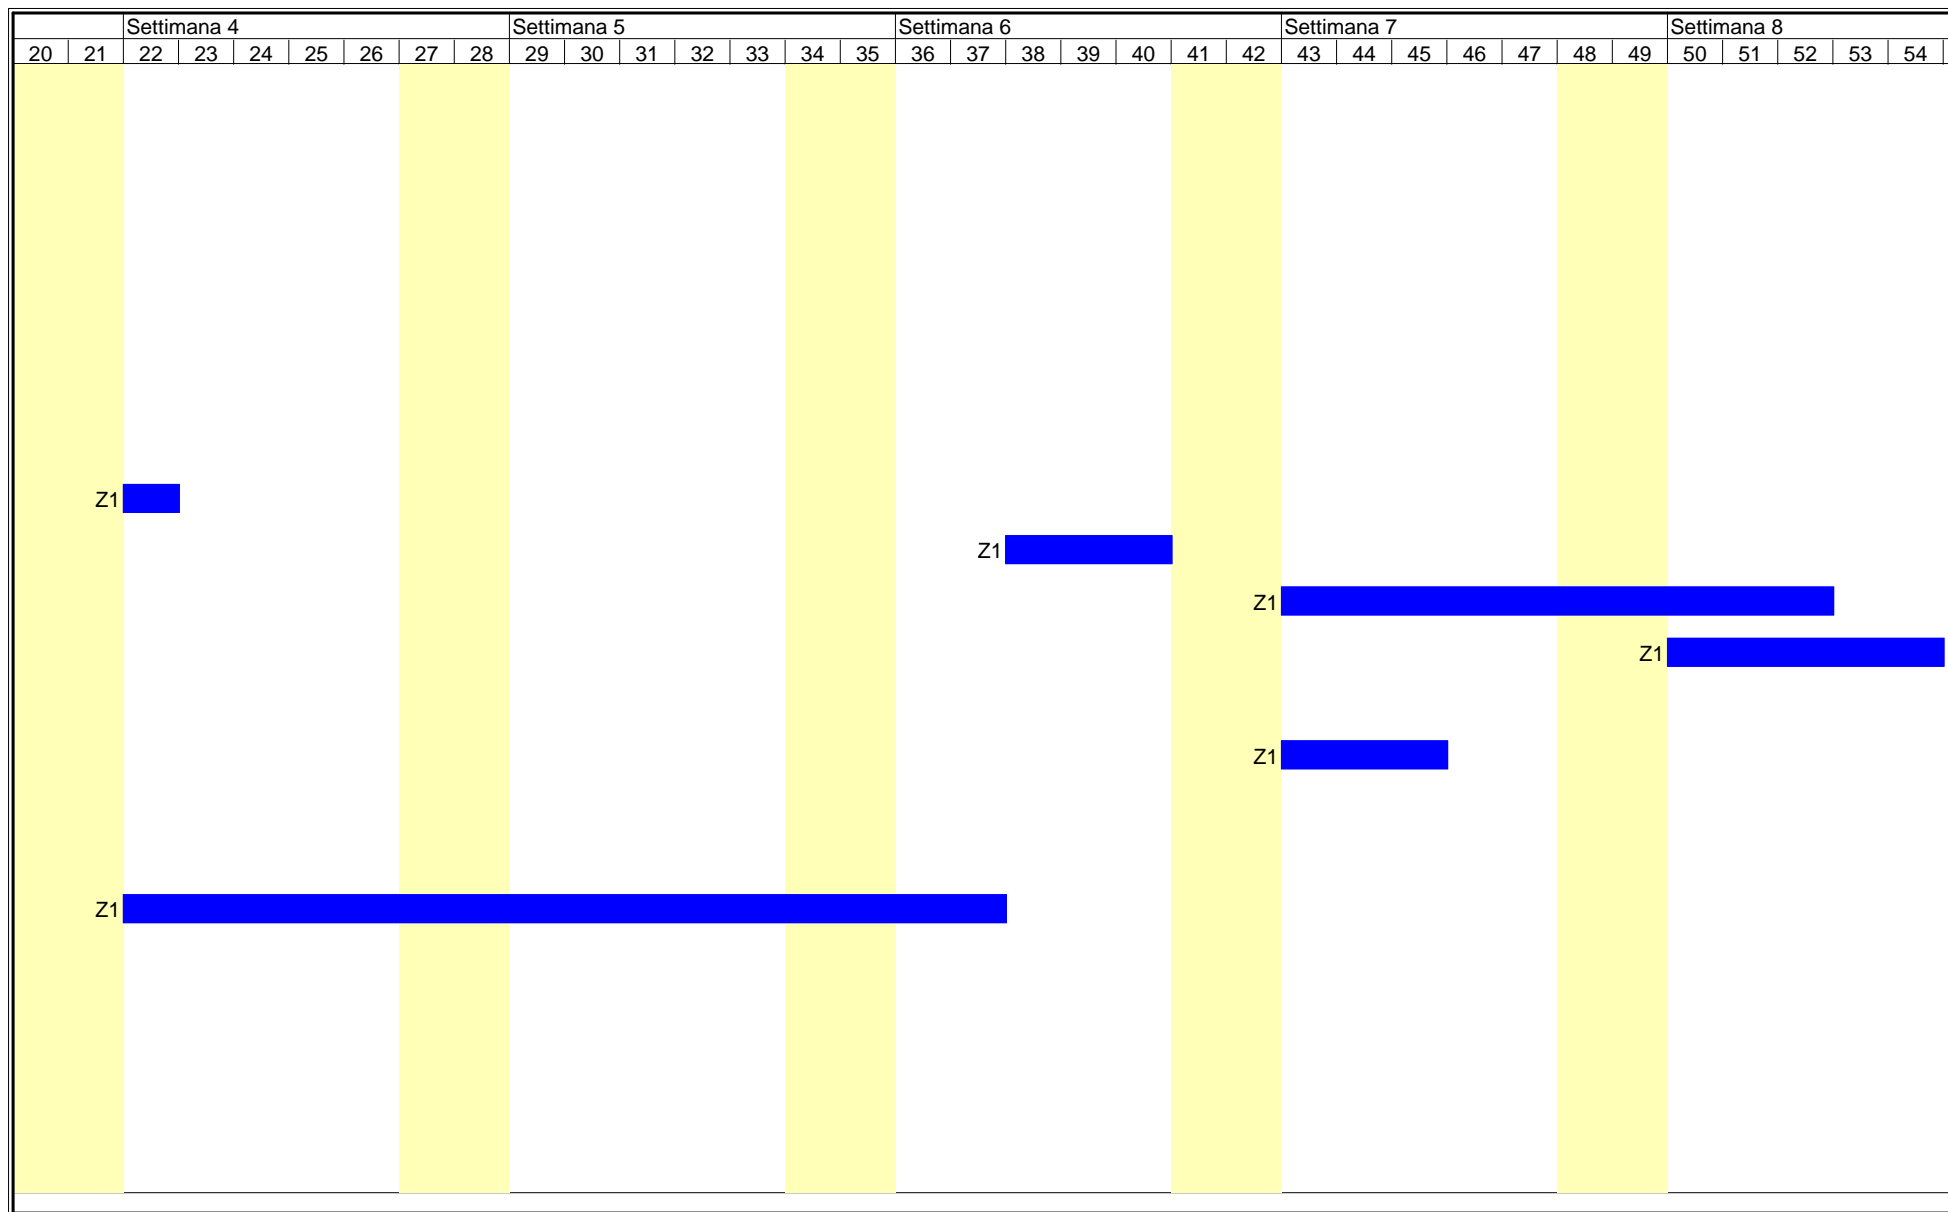

[illegible]

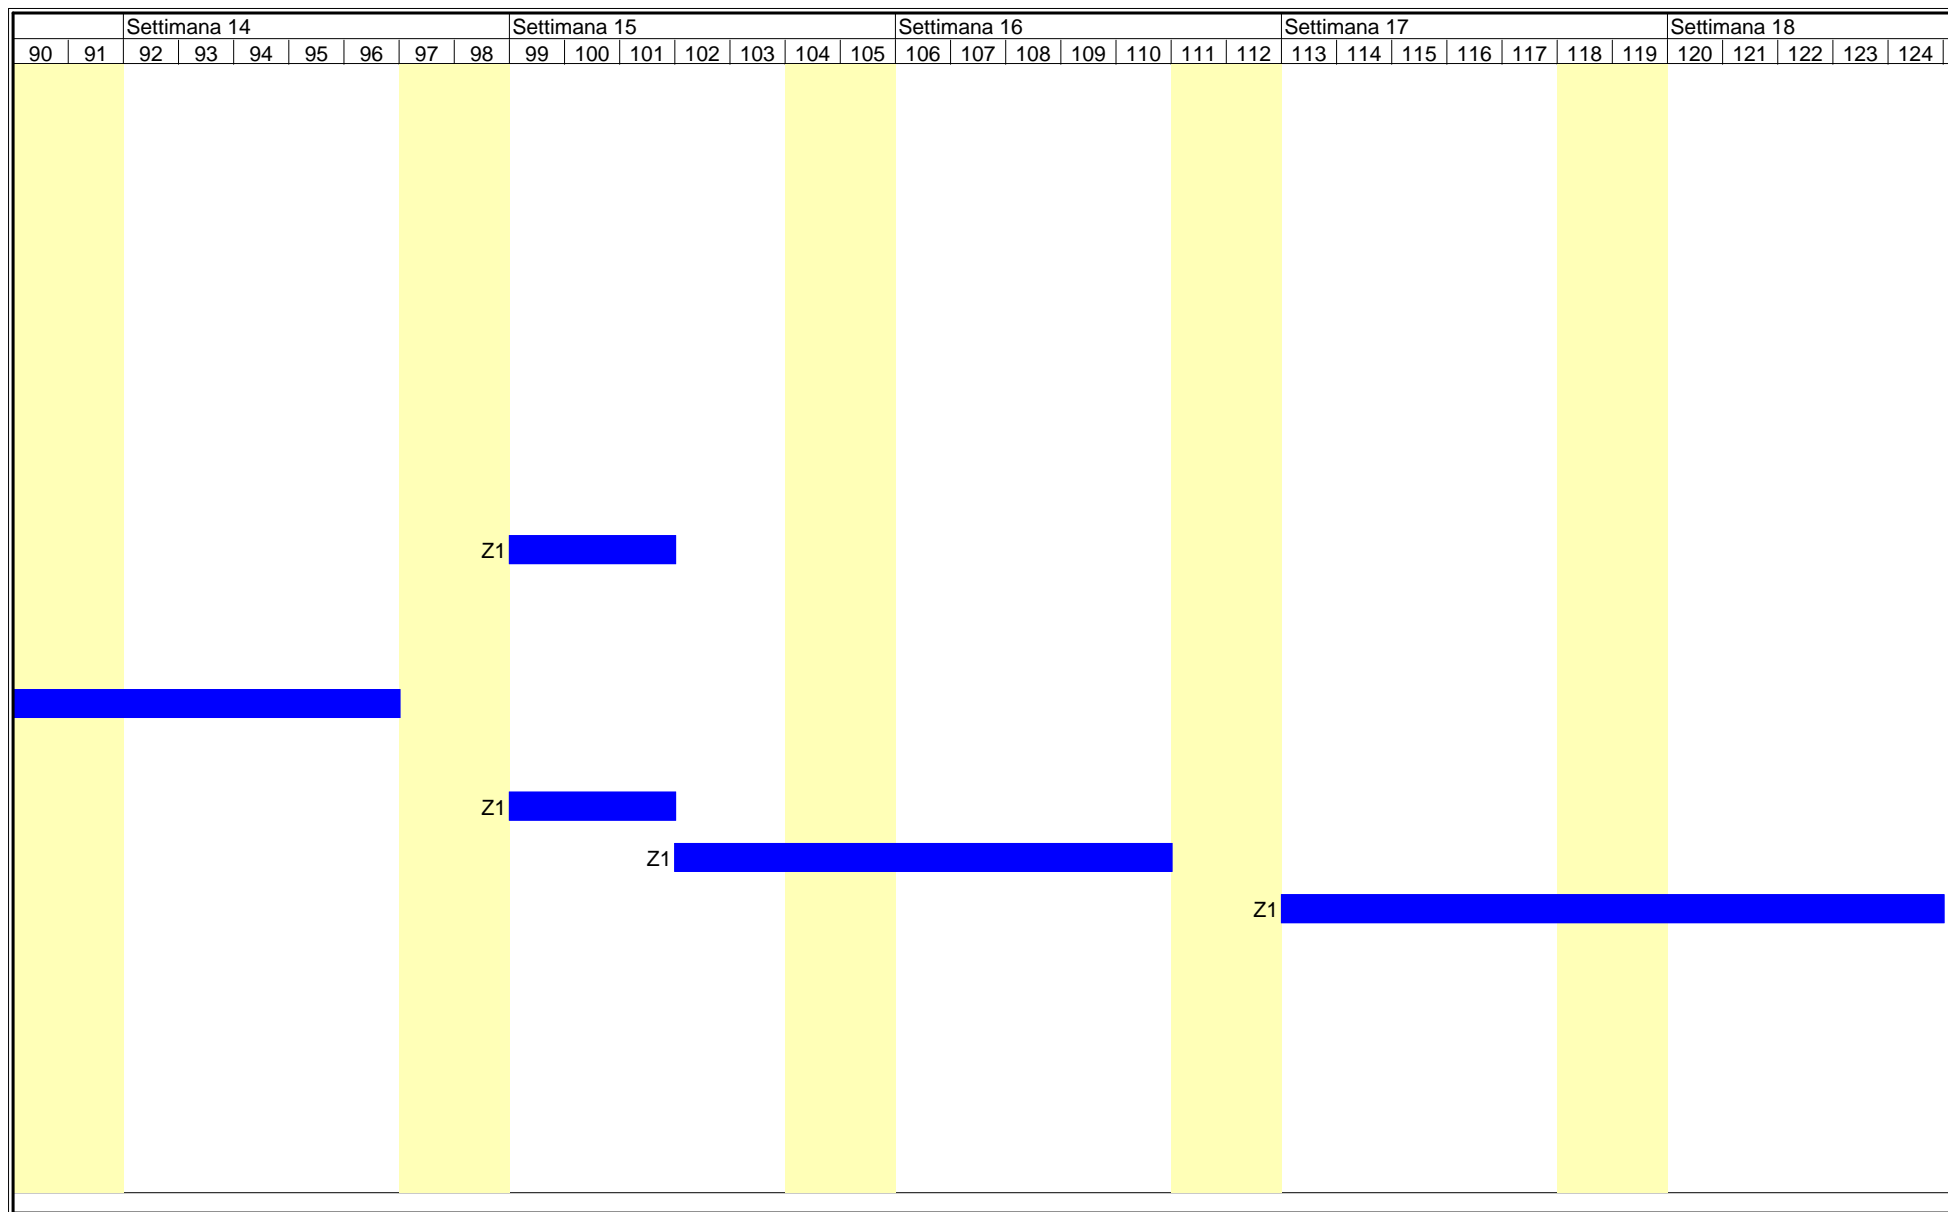

Settimana 19						Settimana 20						Settimana 21						Settimana 22						Settimana 23										
125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159

[illegible]
