



**DIREZIONE REGIONALE TOSCANA
AREA TECNICO EDILIZIA
Via del Proconsolo 10 – FIRENZE**

**INSTALLAZIONE CENTRALE TERMOFRIGORIFERA
PRESSO LA SEDE PROVINCIALE I.N.P.S. DI LIVORNO
Via P. TACCA, 1**

**SEDE PROVINCIALE I.N.P.S. DI LIVORNO
Via P. TACCA, 1 - LIVORNO**


DIAGRAMMA DI GANTT

**IL PROGETTISTA
(Geom. Giuseppe Cosenza)**

**IL COORDINATORE TECNICO REG.LE
(Dott. Arch. Tommaso Iuliani)**

**L'APPALTATORE
FIRMA**

N. ord.	Cod.	Attività	Inizio	Fine	Durata gg.
1	A	Consegna dei lavori	02/01/2012	03/01/2012	1
2	B	Preparazione cantiere	04/01/2012	07/01/2012	3
3	I.1	Fornitura in opera di moduli a pompa di calore (tipo ROBUR RTAR 290-600)	08/01/2012	14/01/2012	6
4	I.2	Fornitura in opera di moduli refrigeratori (tipo ROBUR RTCF 300)	15/01/2012	21/01/2012	6
5	I.3	Fornitura in opera di moduli misti a pompa di calore e refrigeratori (tipo ROBUR RTCR 294-360)	22/01/2012	25/01/2012	3
6	I.4	Tubazione gas	26/01/2012	31/01/2012	5
7	I.5	Tubazione per mandataritorno circuiti primario da moduli termici a collettori dell'impianto di distribuzione	01/02/2012	19/02/2012	18
8	I.6	Sezione idronica circuiti secondari : da collettore a serbatoio	20/02/2012	05/03/2012	14
9	I.7	Sezione idronica circuiti secondari : circuito caldo/freddo	06/03/2012	19/04/2012	44
10	I.8	Sezione idronica circuiti secondari : circuito solo caldo	20/04/2012	08/05/2012	18
11	I.9	Alimentazione idrica dell'impianto	09/05/2012	13/05/2012	4
12	I.10	Sistema di regolazione, controllo e supervisione	14/05/2012	23/05/2012	9
13	E.1	Realizzazione di impianto elettrico di alimentazione 380V-50Hz, 3F+N+T,	24/05/2012	27/05/2012	3
14	E.2	Quadro elettrico di comando, protezione e regolazione circuiti	28/05/2012	04/06/2012	7
15	E.3	Sgancio elettrico d'emergenza	05/06/2012	06/06/2012	1
16	E.4	Circuiti elettrici di collegamento da Q.E. a macchine	07/06/2012	11/06/2012	4
17	E.5	Linea dati realizzato con cavo schermato FTP cat. 6 multicoppia	12/06/2012	13/06/2012	1
19	E	Pulizie e smobilizzo	14/06/2012	17/06/2012	3
20	F	Fine lavori	18/06/2012	19/06/2012	1

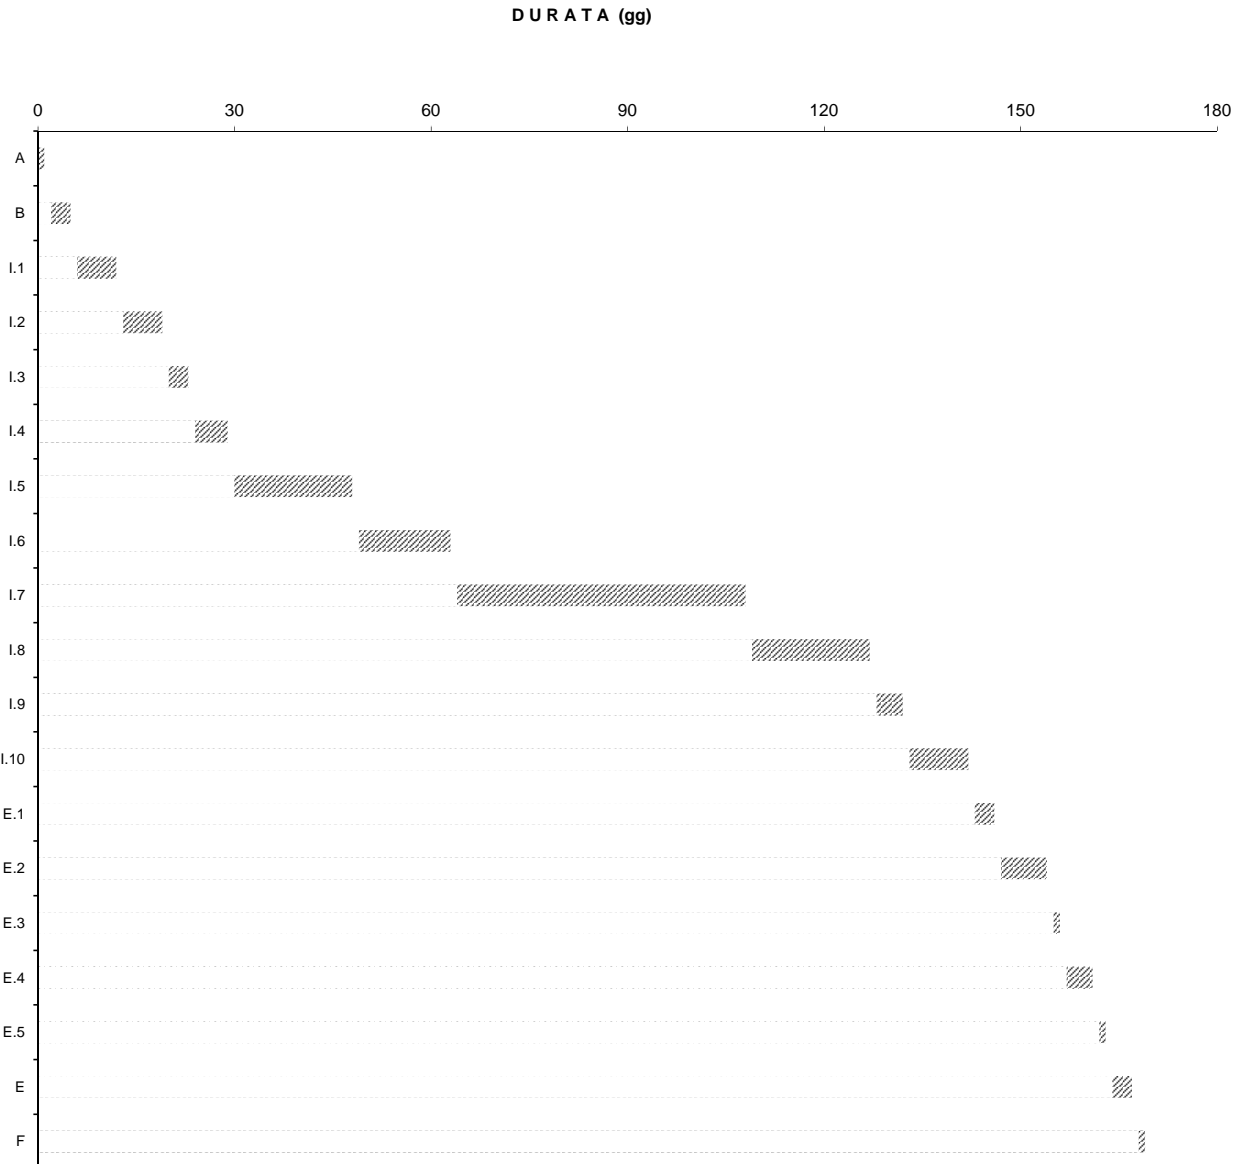

Inizio dei lavori

Fine lavori

0 gg

169 gg

TC

169 gg.
naturali consecutivi
