Direzione Provinciale Inps di Verona

Lavori di adeguamento antincendio piano interrato primo stralcio

Cantiere: Direzione Provinciale Inps - Verona
piano interrato

Indirizzo: Via Cesare Battisti 19 del Comune di Verona

Piano di sicurezza e di coordinamento

Dati Generali

Nome: Direzione Provinciale Inps - Verona

Comune: Verona, Via Cesare Battisti 19

Provincia: Verona

Tipologia dell'opera: Lavori di adeguamento antincendio locali posti al piano interrato della sede.

Dati presunti

Inizio lavori: 02/03/15

Fine lavori: 01/06/15

Durata in giorni di calendario: 91,00

Numero massimo di lavoratori in cantiere: 5

Enrico Orlandi

Qualifica: Architetto progettista

Recapito: S. Croce 929,30135 - Venezia (Ve)

Telefono e Fax: 0415217232 e

Enrico Orlandi

Qualifica: Direttore dei Lavori

Recapito: S. Croce 929,30135 - Venezia (Ve)

Telefono e Fax: 0415217232 e

Enrico Orlandi

Qualifica: Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione

Recapito: S. Croce 929,30135 - Venezia (Ve)

Telefono e Fax: 0415217232 e

Enrico Orlandi

Qualifica: Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione

Recapito: S. Croce 2045,30135 - Venezia (VE)

Telefono e Fax: 0415217232 e

A seguito di gara

Qualifica: Impresa aggiudicataria dei lavori

Qualifica: Direttore tecnico

Indirizzi e Numeri Telefonici

Pronto Soccorso SUEM Verona

Telefono 118

Indirizzo

Polizia di Stato

Telefono 113

Indirizzo

Vigili del Fuoco

Telefono 115

Indirizzo

Numero unico emergenze

Telefono 112

Indirizzo

AREA DI CANTIERE

Modalità da seguire per la recinzione del cantiere, gli accessi e le segnalazioni

Il cantiere si trova nel piano seminterrato della Sede.
Non si ritiene possibile recintarlo.
Gli accessi al cantiere avverranno dai vani scale della Sede oppure dagli accessi sull'esterno del fabbricato.

Elenco rischi	Presente	Non presente
Non si ritiene esistano rischi per questo capitolo, tranne le normali procedure in caso di evacuazione dello stabile in caso di pericolo.		

Il cantiere si struttura in punti localizzati del piano interrato.

L'area di deposito materiale e di produzione si troverà nel salone primo archivio ed in parte in area esterna alla sede.

Lavorazioni

Le lavorazioni più importanti da analizzare per valutare i rischi che potrebbero generare in particolari condizioni, per il cantiere di che trattasi sono:
- la demolizione delle murature
- la demolizione dell'impianto elettrico
- la realizzazione del nuovo impianto elettrico
- il taglio delle murature in c.a.

TUTTE QUESTE LAVORAZIONI DEVONO COMUNQUE ESSERE MESSE IN RELAZIONE AL CONTESTO DEGLI AMBIENTI CARATTERIZZATI DA UN ELEVATISSIMO QUANTITATIVO DI CARTA STIVATO NELL'INTERRATO DELLA SEDE.
TALE SI RITIENE IL RISCHIO PIU' RILEVANTE E DA TENERE IN CONSIDERAZIONE

Le azioni da intraprendere per abbassare il livello di rischio per le lavorazioni sopra citate sono:
- per il taglio delle murature in c.a. una adeguata protezione durante la lavorazione per evitare possibili rischi di innesco incendio con scintille o simili.
- l'operatore della lavorazione di demolizione impianto elettrico dovrà dotarsi di guanti anti elettrolocuzione, scarpe antinfortunistica.

Si ribadisce che il RISCHIO più evidente risulta il GRANDE quantitativo di carta nel piano interrato.
Tutte le lavorazioni dovranno essere svolte evitando qualsiasi possibile INNESCO DI INCENDIO !!!

Coordinamento

Sono state valutate le seguenti zone di coordinamento lavori:

Periodo interferenza: dal 04/03/15 al 05/03/15

Area di riferimento: Zona di Coordinamento area Centrale termica

Fasi interferenti :

Codice	Descrizione				
1 . 2	MURATURA FINO A 60 cm Demolizione di opere muratura in laterizio spessore fino a 60 cm., compreso l'abbassamento dei materiali al piano di carico dell'automezzo, comprese opere provvisionali, carico e trasporto alle discariche (RIS 55 - 10 - 30 - 20)				
Durata	7,00	Data Inizio	14/03/15	Data Fine	22/03/15
4 . 1	Rifacimento impianto elettrico e parzialmente antincendio				
Durata	6,50	Data Inizio	23/03/15	Data Fine	30/03/15

Prescrizioni di coordinamento:

Adozione di adeguati DPI (protezione occhi e guanti) durante le fasi di demolizione murature e impianti elettrici

Rischi aggiuntivi:

Costi Sicurezza

L'importo complessivo degli oneri per la sicurezza ammonta a € 400,00 di Oneri Aggiuntivi.

L'importo è calcolato analiticamente, come segue, secondo le prescrizioni dell'art. 100 comma 1 e allegato XV° punto 4 del D.Lgs. 81/2008.

Codice	Descrizione	U.M.	Prezzo (€)	Quantità	Importo (€)
	Oneri Diretti				
1	Sicurezza	a corpo	400,00		
	Totale Oneri Diretti				
	RIEPILOGO				
	Totale Oneri Diretti		0		
	Totale Oneri Aggiuntivi		400		
	TOTALE ONERI DELLA SICUREZZA		400		

Il Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione

Arch. E. Orlandi
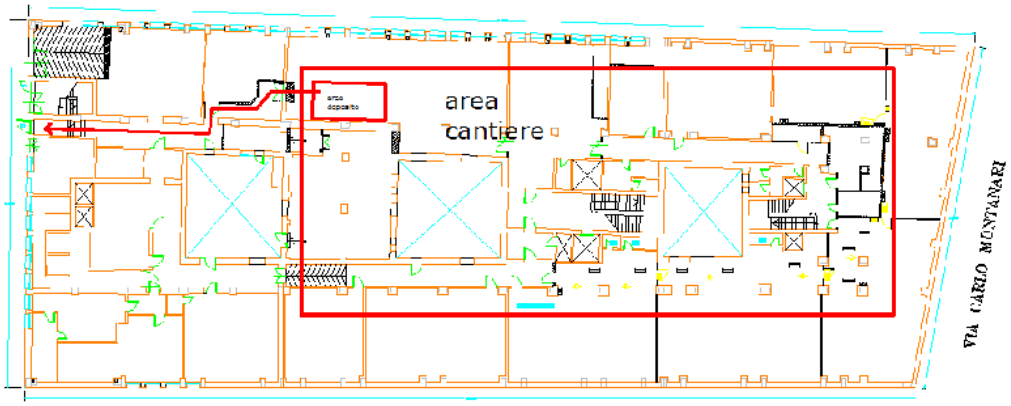
Allegati e Documenti
