

Comune di Nuoro

Provincia di Nuoro

CRONOPROGRAMMA


OGGETTO: Interventi nella DP di Nuoro per la realizzazione dello sportello TBC e il CED al piano seminterrato, il completamento dell' URP al piano terra e la messa a norma dei QQ.EE.

COMMITTENTE: ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE

CAGLIARI, 23/11/2017

Il Tecnico
(Per. Ind. Giampaolo Meloni - Geom. Giorgio Corona)



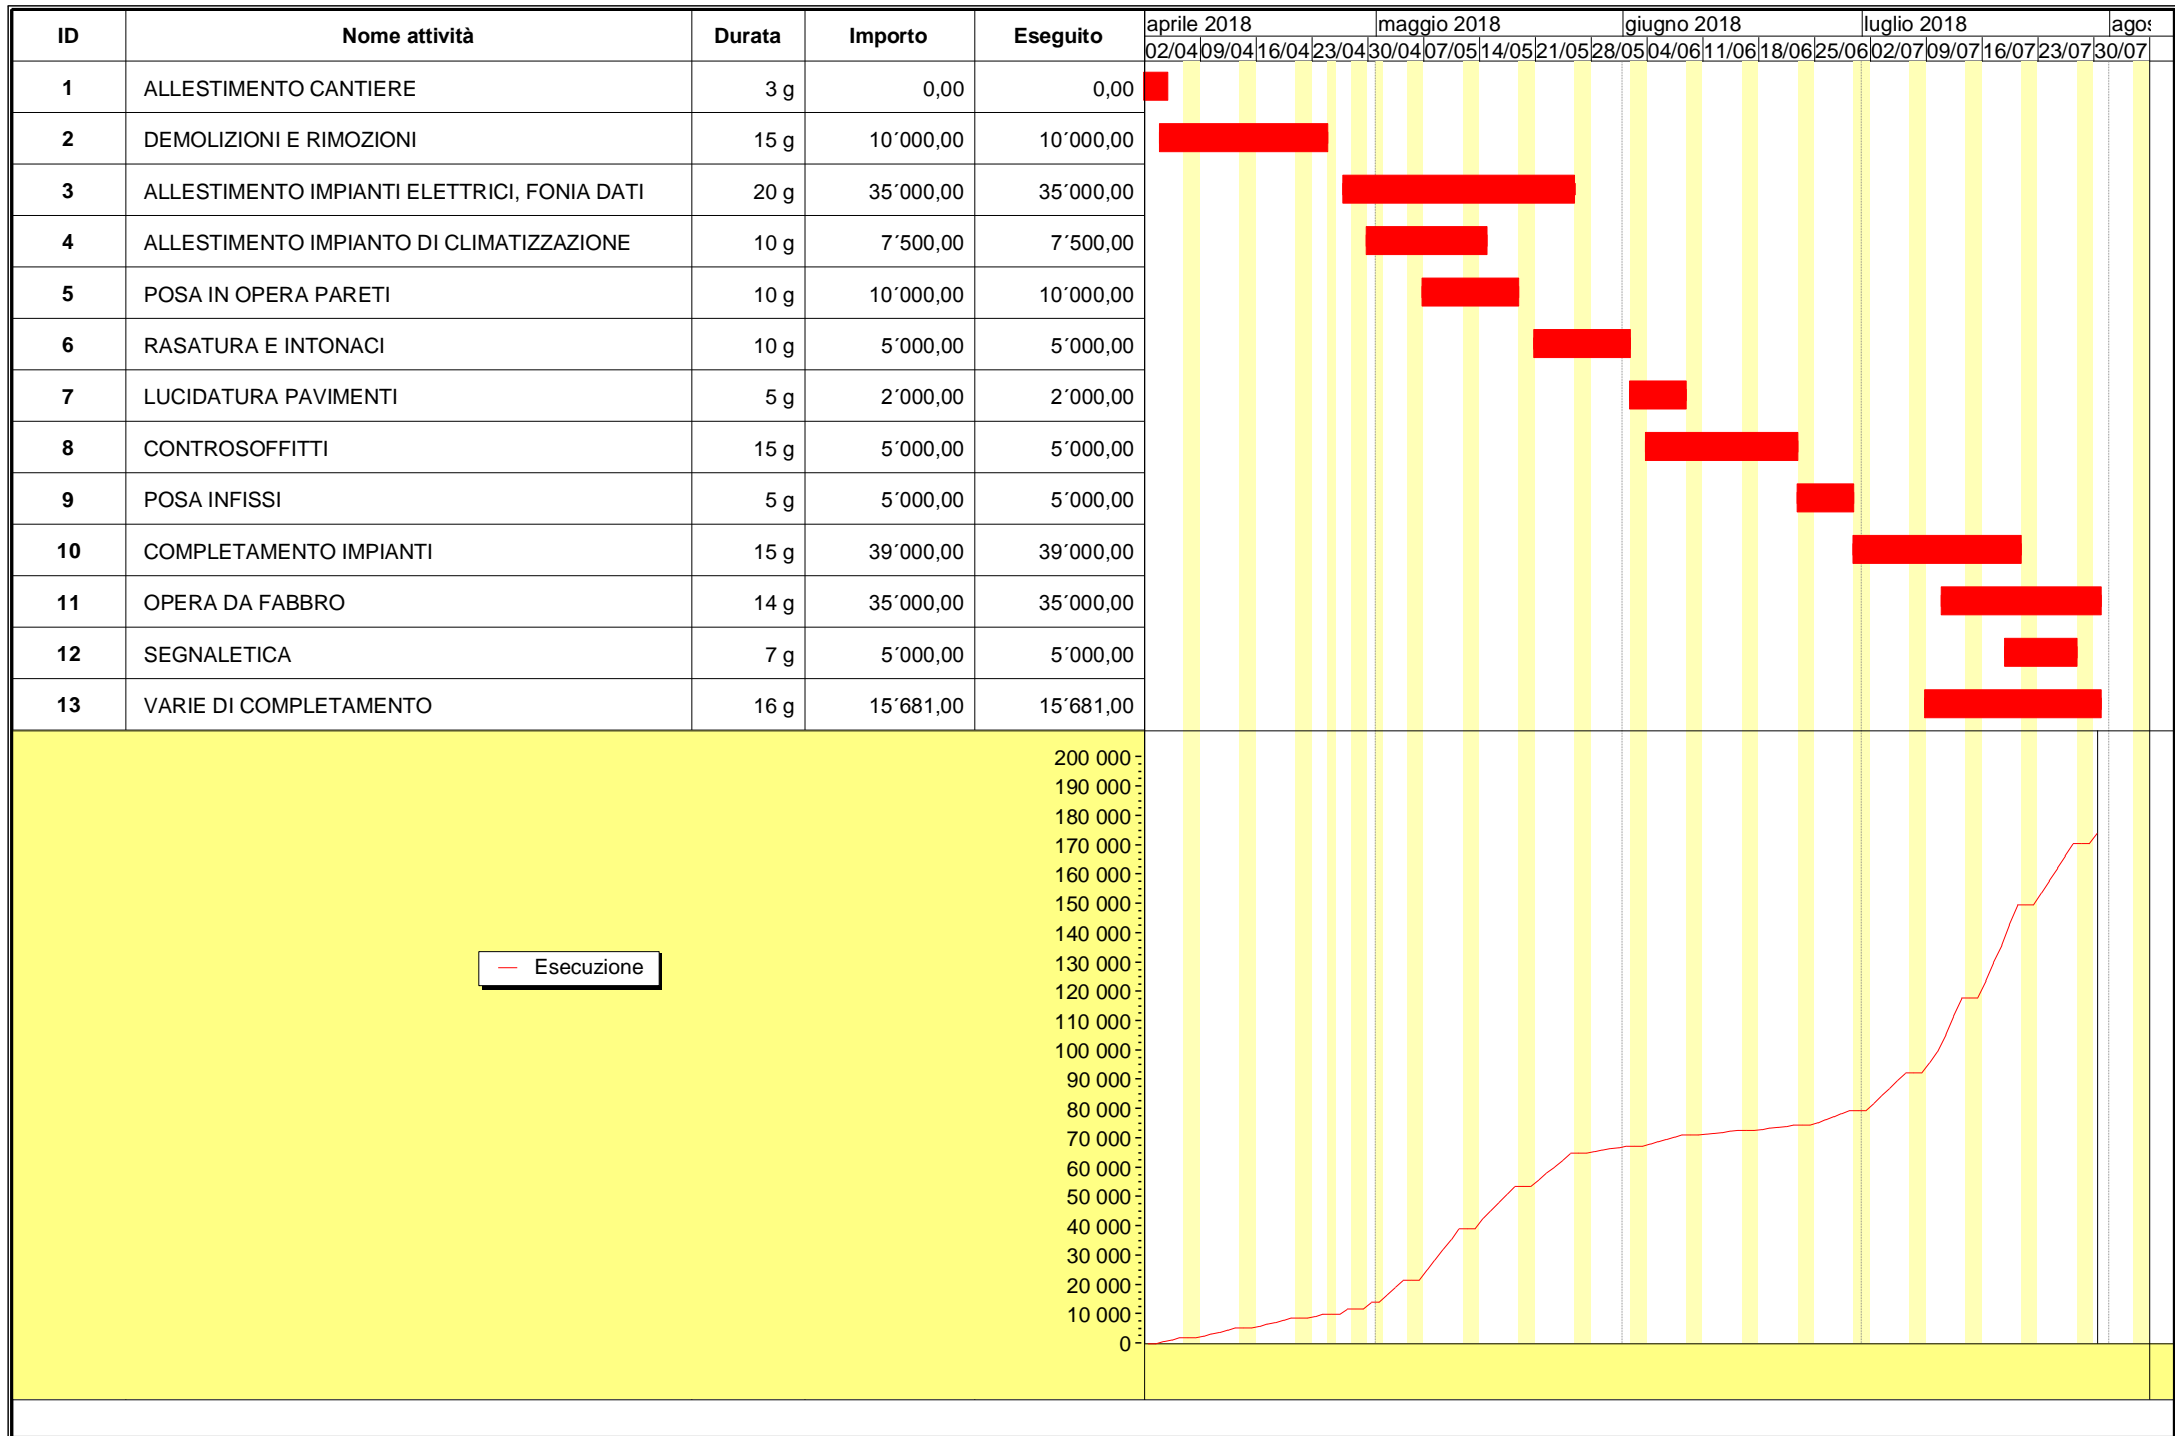

Comune di Nuoro

Provincia di Nuoro

Tabella Attività

OGGETTO: Interventi nella DP di Nuoro per la realizzazione dello sportello TBC e il CED al piano seminterrato, il completamento dell' URP al piano terra e la messa a norma dei QQ.EE.

COMMITTENTE: ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE

CAGLIARI, 23/11/2017

Il Tecnico
(Per. Ind. Giampaolo Meloni - Geom. Giorgio Corona)

ATTIVITA'	PREVISTO		ESEGUITO		Inizio	Fine	GIORNI	
	euro	(%)	euro	(%)			Lav.	Tot.
ALLESTIMENTO CANTIERE	0,00	0,00	0,00	0,00	02/04/2018	04/04/2018	3	3
DEMOLIZIONI E RIMOZIONI	10'000,00	5,74	10'000,00	5,74	04/04/2018	24/04/2018	15	21
ALLESTIMENTO IMPIANTI ELETTRICI, FONIA DATI	35'000,00	20,09	35'000,00	20,09	27/04/2018	25/05/2018	20	29
ALLESTIMENTO IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE	7'500,00	4,31	7'500,00	4,31	30/04/2018	14/05/2018	10	15
POSA IN OPERA PARETI	10'000,00	5,74	10'000,00	5,74	07/05/2018	18/05/2018	10	12
RASATURA E INTONACI	5'000,00	2,87	5'000,00	2,87	21/05/2018	01/06/2018	10	12
LUCIDATURA PAVIMENTI	2'000,00	1,15	2'000,00	1,15	02/06/2018	08/06/2018	5	7
CONTROSOFFITTI	5'000,00	2,87	5'000,00	2,87	04/06/2018	22/06/2018	15	19
POSA INFISSI	5'000,00	2,87	5'000,00	2,87	23/06/2018	29/06/2018	5	7
COMPLETAMENTO IMPIANTI	39'000,00	22,39	39'000,00	22,39	30/06/2018	20/07/2018	15	21
OPERA DA FABBRO	35'000,00	20,09	35'000,00	20,09	11/07/2018	30/07/2018	14	20
SEGNALETICA	5'000,00	2,87	5'000,00	2,87	19/07/2018	27/07/2018	7	9
VARIE DI COMPLETAMENTO	15'681,00	9,00	15'681,00	9,00	09/07/2018	30/07/2018	16	22
CAGLIARI, 23/11/2017								
il Tecnico								
Per. Ind. Giampaolo Meloni - Geom. Giorgio Corona								

Comune di Nuoro

Provincia di Nuoro

Tabella Date e Importi

OGGETTO: Interventi nella DP di Nuoro per la realizzazione dello sportello TBC e il CED al piano seminterrato, il completamento dell' URP al piano terra e la messa a norma dei QQ.EE.

COMMITTENTE: ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE

CAGLIARI, 23/11/2017

Il Tecnico
(Per. Ind. Giampaolo Meloni - Geom. Giorgio Corona)

DATA	IMPORTI PREVISTI			IMPORTI ESEGUITI		
	Parziale euro	Progressivo euro	(%)	Parziale euro	Progressivo euro	(%)
04/04/2018	666,67	666,67	0,38	666,67	666,67	0,38
05/04/2018	666,67	1'333,33	0,77	666,67	1'333,33	0,77
06/04/2018	666,67	2'000,00	1,15	666,67	2'000,00	1,15
09/04/2018	666,67	2'666,67	1,53	666,67	2'666,67	1,53
10/04/2018	666,67	3'333,33	1,91	666,67	3'333,33	1,91
11/04/2018	666,67	4'000,00	2,30	666,67	4'000,00	2,30
12/04/2018	666,67	4'666,67	2,68	666,67	4'666,67	2,68
13/04/2018	666,67	5'333,33	3,06	666,67	5'333,33	3,06
16/04/2018	666,67	6'000,00	3,44	666,67	6'000,00	3,44
17/04/2018	666,67	6'666,67	3,83	666,67	6'666,67	3,83
18/04/2018	666,67	7'333,33	4,21	666,67	7'333,33	4,21
19/04/2018	666,67	8'000,00	4,59	666,67	8'000,00	4,59
20/04/2018	666,67	8'666,67	4,98	666,67	8'666,67	4,98
23/04/2018	666,67	9'333,33	5,36	666,67	9'333,33	5,36
24/04/2018	666,67	10'000,00	5,74	666,67	10'000,00	5,74
27/04/2018	1'750,00	11'750,00	6,75	1'750,00	11'750,00	6,75
30/04/2018	2'500,00	14'250,00	8,18	2'500,00	14'250,00	8,18
02/05/2018	2'500,00	16'750,00	9,62	2'500,00	16'750,00	9,62
03/05/2018	2'500,00	19'250,00	11,05	2'500,00	19'250,00	11,05
04/05/2018	2'500,00	21'750,00	12,49	2'500,00	21'750,00	12,49
07/05/2018	3'500,00	25'250,00	14,50	3'500,00	25'250,00	14,50
08/05/2018	3'500,00	28'750,00	16,51	3'500,00	28'750,00	16,51
09/05/2018	3'500,00	32'250,00	18,52	3'500,00	32'250,00	18,52
10/05/2018	3'500,00	35'750,00	20,52	3'500,00	35'750,00	20,52
11/05/2018	3'500,00	39'250,00	22,53	3'500,00	39'250,00	22,53
14/05/2018	3'500,00	42'750,00	24,54	3'500,00	42'750,00	24,54
15/05/2018	2'750,00	45'500,00	26,12	2'750,00	45'500,00	26,12
16/05/2018	2'750,00	48'250,00	27,70	2'750,00	48'250,00	27,70
17/05/2018	2'750,00	51'000,00	29,28	2'750,00	51'000,00	29,28
18/05/2018	2'750,00	53'750,00	30,86	2'750,00	53'750,00	30,86
21/05/2018	2'250,00	56'000,00	32,15	2'250,00	56'000,00	32,15
22/05/2018	2'250,00	58'250,00	33,44	2'250,00	58'250,00	33,44
23/05/2018	2'250,00	60'500,00	34,73	2'250,00	60'500,00	34,73
24/05/2018	2'250,00	62'750,00	36,03	2'250,00	62'750,00	36,03
25/05/2018	2'250,00	65'000,00	37,32	2'250,00	65'000,00	37,32
28/05/2018	500,00	65'500,00	37,60	500,00	65'500,00	37,60
29/05/2018	500,00	66'000,00	37,89	500,00	66'000,00	37,89
30/05/2018	500,00	66'500,00	38,18	500,00	66'500,00	38,18
31/05/2018	500,00	67'000,00	38,47	500,00	67'000,00	38,47
01/06/2018	500,00	67'500,00	38,75	500,00	67'500,00	38,75
04/06/2018	733,33	68'233,33	39,17	733,33	68'233,33	39,17
05/06/2018	733,33	68'966,67	39,59	733,33	68'966,67	39,59
06/06/2018	733,33	69'700,00	40,02	733,33	69'700,00	40,02
07/06/2018	733,33	70'433,33	40,44	733,33	70'433,33	40,44
08/06/2018	733,33	71'166,67	40,86	733,33	71'166,67	40,86
11/06/2018	333,33	71'500,00	41,05	333,33	71'500,00	41,05
12/06/2018	333,33	71'833,33	41,24	333,33	71'833,33	41,24
13/06/2018	333,33	72'166,67	41,43	333,33	72'166,67	41,43
14/06/2018	333,33	72'500,00	41,62	333,33	72'500,00	41,62

DATA	IMPORTI PREVISTI			IMPORTI ESEGUITI		
	Parziale euro	Progressivo euro	(%)	Parziale euro	Progressivo euro	(%)
15/06/2018	333,33	72'833,33	41,81	333,33	72'833,33	41,81
18/06/2018	333,33	73'166,67	42,01	333,33	73'166,67	42,01
19/06/2018	333,33	73'500,00	42,20	333,33	73'500,00	42,20
20/06/2018	333,33	73'833,33	42,39	333,33	73'833,33	42,39
21/06/2018	333,33	74'166,67	42,58	333,33	74'166,67	42,58
22/06/2018	333,33	74'500,00	42,77	333,33	74'500,00	42,77
25/06/2018	1'000,00	75'500,00	43,35	1'000,00	75'500,00	43,35
26/06/2018	1'000,00	76'500,00	43,92	1'000,00	76'500,00	43,92
27/06/2018	1'000,00	77'500,00	44,49	1'000,00	77'500,00	44,49
28/06/2018	1'000,00	78'500,00	45,07	1'000,00	78'500,00	45,07
29/06/2018	1'000,00	79'500,00	45,64	1'000,00	79'500,00	45,64
02/07/2018	2'600,00	82'100,00	47,13	2'600,00	82'100,00	47,13
03/07/2018	2'600,00	84'700,00	48,63	2'600,00	84'700,00	48,63
04/07/2018	2'600,00	87'300,00	50,12	2'600,00	87'300,00	50,12
05/07/2018	2'600,00	89'900,00	51,61	2'600,00	89'900,00	51,61
06/07/2018	2'600,00	92'500,00	53,11	2'600,00	92'500,00	53,11
09/07/2018	3'580,06	96'080,06	55,16	3'580,06	96'080,06	55,16
10/07/2018	3'580,06	99'660,12	57,22	3'580,06	99'660,12	57,22
11/07/2018	6'080,06	105'740,19	60,71	6'080,06	105'740,19	60,71
12/07/2018	6'080,06	111'820,25	64,20	6'080,06	111'820,25	64,20
13/07/2018	6'080,06	117'900,31	67,69	6'080,06	117'900,31	67,69
16/07/2018	6'080,06	123'980,37	71,18	6'080,06	123'980,37	71,18
17/07/2018	6'080,06	130'060,44	74,67	6'080,06	130'060,44	74,67
18/07/2018	6'080,06	136'140,50	78,16	6'080,06	136'140,50	78,16
19/07/2018	6'794,35	142'934,85	82,06	6'794,35	142'934,85	82,06
20/07/2018	6'794,35	149'729,20	85,96	6'794,35	149'729,20	85,96
23/07/2018	4'194,35	153'923,54	88,37	4'194,35	153'923,54	88,37
24/07/2018	4'194,35	158'117,89	90,78	4'194,35	158'117,89	90,78
25/07/2018	4'194,35	162'312,24	93,19	4'194,35	162'312,24	93,19
26/07/2018	4'194,35	166'506,59	95,59	4'194,35	166'506,59	95,59
27/07/2018	4'194,35	170'700,94	98,00	4'194,35	170'700,94	98,00
30/07/2018	3'480,06	174'181,00	100,00	3'480,06	174'181,00	100,00
CAGLIARI, 23/11/2017						
il Tecnico						
Per. Ind. Giampaolo Meloni - Geom. Giorgio Corona						
